SVENSKT NÄRINGSLIV

ANALYSRAPPORT · OKTOBER 2026

Miljötillståndsrisker

Kostnader, processer och åtgärder för en mer förutsägbar prövning

En analys för Svenskt Näringsliv av tillståndsprocessens kostnader, återkommande störningar och möjliga förbättringar, med riskbedömningar, processkartor och intervjuer som underlag.

342 risker · 378 föreslagna motåtgärder · fem intervjukällor

17 kapitel och åtta bilagor om riskbild, åtgärder, genomförande och metod.

2026-10-22

Innehåll

01 Sammanfattning	3
02 Tillståndsprövningens betydelse för företagens investeringar	6
03 Den nya myndigheten och ansvaret för hela prövningskedjan	8
04 Riskernas kostnader och betydelse för prioriteringen	10
05 Var i processen riskerna får betydelse	13
06 Myndighetsrelaterade risker och möjligheten att påverka dem	16
07 Från oklart underlagsbehov till en användbar fullständighetsgranskning	19
08 Kompetens och kontinuitet genom handläggningen	21
09 Parallella beslut och den faktiska möjligheten att starta	22
10 Beslut, överklagande och vägen tillbaka efter återförvisning	24
11 Motåtgärdernas potential och vad en investering behöver pröva	26
12 Åtgärdspaket inom myndighetens rådighet	30
13 Hur resultaten bör vägas samman	33
14 Inriktning för prioritering och beredning	34
15 Uppföljning av genomförande, kostnader och resultat	36
16 Slutsatser	38
17 Referenser och källförteckning	39
A Metod och måttens betydelse	41
B Värdegranskning och återvunna beskrivningsuppgifter	42
C Intervjumetod och analysmatris	44
D Beräkning av kontrollernas bidrag	46
E Underlag, avgränsning och möjlighet till granskning	47
F Kostnadstopp 50	49
G Myndighetsåtgärder och ekonomiskt jämförelseunderlag	53
H Risker med odefinierad årskostnad	56

Om rapporten

Rapporten förenar risk- och processkartläggning, modellskattningar och intervjuer. Mätunderlag och intervjukällor är låsta till denna utgåva. Bilagorna redovisar metod, källkedja, granskningsregler och registerutdrag.

ÖVERBLICK

01 Sammanfattning

Tillståndsprocessens betydelse för investeringar behöver bedömas från de första utredningarna till den tidpunkt då verksamheten faktiskt kan starta.

Miljöprövningen ska ge ett tillräckligt underlag för att bedöma en verksamhets påverkan och fastställa de villkor som behövs. För företaget är prövningen samtidigt en del av en större investeringsprocess, där finansiering, markåtkomst, elanslutning, teknisk projektering och leveransavtal behöver planeras. När ett avgörande besked förskjuts kan följden därför bli större än den direkta kostnaden för ytterligare en utredning. Kapital förblir bundet, planerad produktion skjuts fram och andra beslut kan behöva tas om. Möjligheten att förstå vilka krav som återstår och när de kan vara uppfyllda har på detta sätt ett ekonomiskt värde även när tillståndets slutliga utfall fortfarande är öppet. [REG, RES, MYN]

Den här rapporten ger Svenskt Näringsliv ett underlag för att prioritera förbättringar av prövningen och bedöma vilka motåtgärder som förtjänar närmare beredning. Analysen omfattar 342 risker i sju delprocesser, 378 föreslagna motåtgärder och erfarenheter från fem intervjudokument med sex medverkande personer. Riskbeskrivningarna visar var ett problem uppstår, vad som kan utlösa det och vilka följder som kan uppstå. Mätningen ger bedömningar av händelsefrekvens, kostnad och möjliga åtgärdseffekter. Intervjuerna bidrar med förklaringar till hur förloppen kan utvecklas i praktiken och vilka arbetsformer som upplevs fungera väl. [REG, RES, MYN]

Ett återkommande mönster är att osäkerhet byggs upp mellan olika steg i handläggningen. En sökande kan ha lagt ned ett omfattande arbete utan att ännu veta om myndigheten bedömer underlaget som fullständigt. Ett behov av en inventering kan upptäckas efter att rätt årstid passerat. En ny handläggare kan behöva rekonstruera tidigare avgränsningar, medan ett projekt med miljötillstånd fortfarande väntar på ett sektorsbeslut eller ett förstartsgodkännande. Dessa förlopp binder samman frågor om underlag, kompetens, kontinuitet och samordning. De bör därför följas genom hela ärendet och, där det är relevant, fram till möjlig byggstart. [REG, RES, MYN]

Riskmätningen omfattar 341 av registrets risker. Med utgångspunkt i ett läge utan införda motåtgärder kan förväntad årskostnad redovisas för 307 risker. För 34 uppmätta risker återstår konkreta brister i kostnads- eller frekvensunderlaget, medan en registerrisk saknar mätning. Samtliga 342 finns kvar i analysen och på webbplatsen. Genomgången av beskrivningarna har dessutom identifierat 40 användbara intervall för 32 risker. Dessa redovisas som beskrivningarnas egna uppskattningar, med deras omfattning och begränsningar, så att även en

risk utan fullständig kostnadsberäkning kan bedömas utifrån det underlag som faktiskt finns. [REG, RES, MYN]

De 50 högst kostnadsrankade riskerna är spridda över hela beslutskedjan. Sektorsspåren innehåller 15, förutsättningarna inför start 12 och prövning och överprövning 11. Vattenverksamhet innehåller fem, miljöbedömning och miljöfarlig verksamhet tre vardera samt inledande klassificering en. Fördelningen riktar uppmärksamheten mot beslutens inbördes beroenden och mot sena hinder, då betydande resurser redan kan vara bundna i projektet. Den visar samtidigt varför ett förbättringsarbete som enbart följer en myndighets egen handläggningstid får en begränsad bild av företagets väntan. [REG, RES, MYN]

Figur 1. Kostnadstopp 50 genom beslutskedjan



Antal risker hänförda till sin direkta delprocess. En process med fler registerposter har också fler möjliga risker att ingå i listan. Figuren visar rangordningens sammansättning, inte sannolikheten att en process störs. · Källa: REG, RES

Myndighetsrelaterade förlopp har en tydlig plats i riskregistret. Av 342 risker har 118 klassificerats med ursprung i myndighet och prövning, och 17 av dessa återfinns i kostnadstopp 50. De 20 särskilt framtagna myndighetsåtgärderna når tillsammans 90 risker. Sjutton förslag hör till underlagets huvudscenario för myndighetens uppdrag och når 78 risker, däribland tio i kostnadstopp 50. Det finns därmed ett konkret handlingsutrymme, men också viktiga risker som beror på andra aktörers beslut, företagens förberedelser eller ändrade yttre förutsättningar. [REG, RES, MYN]

Samtliga kontroller behandlas som ännu inte införda. För de 17 myndighetsåtgärderna i huvudscenariot finns jämförbara kostnads- och effektunderlag för 72 av de 78 berörda riskerna. När dessa åtgärder kombineras minskar summan av de 72 riskposternas modellerade årskostnad med cirka 23 procent. Det är ett mått på potential inom modellens antaganden och

urval. Genomförandekostnader saknas, och samma ekonomiska förlust kan ingå i flera riskposter, vilket innebär att resultatet inte kan redovisas som en säker nettobesparing för samhället. Beräkningen är användbar för att välja vad som bör undersökas och kostnadsberäknas närmare. [REG, RES, MYN]

Den ekonomiska jämförelsen ger särskild anledning att undersöka riktad hantering efter återförvisning samt kvalitet i kungörelse, delgivning och överklagandeinformation. Intervjuerna och processanalysen ger samtidigt starka sakliga skäl att utveckla samlad fullständighetsgranskning, tidig identifiering av säsongsbundna underlag och en spårbar ärendeakt. Dessa insatser verkar på olika delar av förloppet och behöver därför bedömas både var för sig och tillsammans. För några åtgärder innehåller modellen negativa bidrag; de behöver granskas innan ett ekonomiskt investeringsbeslut grundas på resultatet. [REG, RES, MYN]

Rapportens rekommendation är att gå vidare med avgränsade åtgärdspaket där ansvar, tillämpning, kostnad och uppföljning kan anges. Den nya myndighetens förberedelser erbjuder ett tillfälle att etablera gemensamma rutiner, men övergången behöver också säkra kunskapen i pågående ärenden. Svenskt Näringsliv kan bidra genom att samla företagens erfarenheter, precisera vilka kostnader som uppstår i olika förseningsförlopp och följa om förändrade arbetssätt leder till bättre framförhållning och färre omtag. Metod, antaganden och kvalitetsgranskning redovisas i bilagorna. [REG, RES, MYN]

BAKGRUND OCH UPPDRAG

02 Tillståndsprövningens betydelse för företagens investeringar

Företagets planering berör flera beslut och aktörer. Förutsebarhet handlar om hur dessa delar fungerar tillsammans över tid.

Ett investeringsbeslut fattas ofta långt innan alla villkor för genomförandet är uppfyllda. Verksamhetsutövaren behöver bedöma om projektets framtida intäkter och andra nyttor motiverar de resurser som ska bindas, samtidigt som den tekniska utformningen och lokaliseringen kan behöva anpassas till prövningen. Miljökrav och motstående intressen behöver utredas med tillräcklig omsorg. För företaget blir det därför väsentligt att kunna skilja frågor som är avgjorda från frågor som fortfarande kan påverka projektet och att förstå vilket ytterligare arbete som behövs för ett beslut. [REG, I03, I04, I05]

När kraven kan preciseras tidigt går det att planera utredningar, beställa specialistinsatser och ordna arbetet i en rimlig följd. Om motsvarande behov framkommer sent kan redan framtaget material behöva revideras och andra delar av projektet avvakta. Skillnaden är särskilt betydelsefull när en undersökning endast kan göras under en viss säsong eller när ett beslut är en förutsättning för att söka ett annat. Då kan en begränsad förskjutning i ett enskilt steg ge en lång väntan för projektet som helhet. Det är denna typ av följder som riskkartläggningen försöker göra möjliga att undersöka systematiskt. [REG, I03, I04, I05]

Intervjumaterialet beskriver hur osäkerheten kan bestå även efter omfattande förberedelser. Företagsrepresentanter återkommer till behovet av tydliga besked om fullständighet, tillgång till handläggare med rätt kompetens och kontinuitet mellan samråd och fortsatt prövning. De beskriver också erfarenheter av fungerande dialog och kunniga handläggare, vilket ger viktiga jämförelsepunkter. Rapporten använder berättelserna för att förstå mekanismer och formulera frågor för förbättringsarbetet. Deras omfattning medger däremot ingen uppskattning av hur stor andel av Sveriges ärenden som följer ett visst förlopp. [REG, I03, I04, I05]

Riskerna påverkar företag olika. En större organisation kan ha egen juridisk och teknisk kompetens, erfarenhet av tidigare prövningar och möjlighet att arbeta vidare med andra delar av projektet under väntetiden. Ett företag med begränsade resurser kan behöva köpa motsvarande kompetens och få svårare att hantera upprepade omtag. Även kapitalbindningen varierar mellan projekt som befinner sig i tidig utveckling och projekt där kontrakt, utrustning eller byggorganisation redan finns på plats. Kostnadsbedömningarna behöver därför följas tillbaka till den händelse och den projektsituation som de avser. [REG, I03, I04, I05]

> En viktig framgångsfaktor är enligt intervjupersonen att etablera goda relationer med berörda remissinstanser och handläggande myndigheter. Erfarenheten är att tydlighet från företagets sida bidrar till ett mer konstruktivt samarbete och att myndigheterna då också anstränger sig mer för att driva processen framåt. Väl genomarbetade ansökningar och tydlig kommunikation kan därmed minska risken för missförstånd och onödiga kompletteringar.

Intervjukälla I04 · Intervjuanteckning, stycke 32 [I04-32]

Rapportens uppgift är att ge Svenskt Näringsliv en samlad grund för att diskutera vilka förbättringar som kan göra störst nytta och vilka belägg som behövs innan resurser binds i en viss åtgärd. Den behandlar fyra frågor: var ekonomiskt betydelsefulla risker uppstår, hur de hänger samman med processernas utformning, vilka föreslagna motåtgärder som kan påverka dem och hur genomförandet bör följas upp. Förväntad kostnad används för ekonomisk prioritering, medan riskbeskrivningar, processkartor och intervjuer används för att förstå vad en åtgärd faktiskt behöver förändra. [REG, I03, I04, I05]

En händelse avser att en risk inträffar i ett enskilt prövningsärende eller projekt. Frekvensen beskriver antal sådana händelser per år i Sverige, och konsekvensen beskriver kostnaden i det berörda projektet. En nationell frekvens kan därför inte läsas som sannolikheten för en viss sökande. Bedömningsramen omfattar bland annat försening, kapitalbindning, utredning och processarbete. Beloppen behöver granskas med avseende på vad som redan räknas i närliggande risker, eftersom flera beskrivningar kan fånga olika led i samma ekonomiska förlust. [REG, I03, I04, I05]

Den digitala delen gör det möjligt att gå från rapportens slutsatser till enskilda risker, deras orsaker och konsekvenser samt föreslagna kontroller. En läsare kan där undersöka en viss process, filtrera fram myndighetsdrivna åtgärder eller jämföra ett åtgärdsurval. Rapporten ger den löpande analysen och motiverar prioriteringarna, medan registret ger möjlighet att pröva dem mot detaljerna. Underlaget omfattar även risker som ligger utanför den nya myndighetens direkta rådighet, vilket är nödvändigt för att beskriva företagets hela beslutskedja. [REG, I03, I04, I05]

BAKGRUND OCH UPPDRAG

03 Den nya myndigheten och ansvaret för hela prövningskedjan

En organisatorisk förändring skapar möjligheter till gemensamma arbetssätt, men ansvarsfördelningen mellan prövningens aktörer behöver vara tydlig.

Miljöprövningsmyndigheten planeras starta den 1 juli 2027 och överta uppgifter från miljöprövningsdelegationerna. Kontoren ska finnas i Stockholm, Göteborg och Umeå. Reformen ger en organisatorisk bakgrund till analysen av likvärdig handläggning, tillgång till kompetens och gemensamma rutiner. Registret omfattar samtidigt fler beslut än dem som den nya myndigheten själv kommer att fatta. Företagens projekt kan även bero på domstolsprövning, vattenfrågor, plan- och byggbeslut och andra sektorsbeslut. Ett myndighetsövertagande ger därför inte i sig ett samlat ansvar för varje steg fram till byggstart. [RIX, LST]

För den praktiska utformningen blir det viktigt att skilja mellan vad organisationen kan besluta om, vad den kan samordna och vad den behöver informera om. Myndigheten kan exempelvis utveckla mottagning, egen handläggning, dokumentation och kvalitetssäkring inom sitt uppdrag. När ett annat beslutsorgan ansvarar för en fråga kan värdet i stället ligga i att identifiera beroendet, klargöra vilken information som behöver delas och skapa fungerande kontaktvägar. En överenskommelse om sådana gränssnitt behöver respektera respektive organs uppgifter och möjligheter att göra en självständig prövning. [MYN]

Intervjuerna ger stöd för att skilja likvärdiga arbetssätt från likadana utfall. Lokala miljöförhållanden, verksamhetens utformning och berörda intressen kan motivera olika krav i olika ärenden. Gemensamma rutiner kan ändå göra det tydligare hur behov identifieras, hur avgränsningar dokumenteras och hur en sökande får information om ärendets fortsättning. Om regional variation ska följas upp behöver jämförelsen därför ta hänsyn till ärendenas innehåll och till skälen för olika bedömningar. En enkel jämförelse av genomsnittliga handläggningstider kan annars ge en felaktig bild av variationens orsaker. [MYN, I01, I02]

Införandet innebär dessutom att kunskap behöver föras över mellan organisationer. Ett pågående ärende kan innehålla tidigare projektversioner, överenskomna kompletteringar, öppna sakfrågor och tidskritiska åtaganden som inte framgår av den senaste ansökningshandlingen. Om den mottagande organisationen får svårt att återskapa dessa förutsättningar kan både myndighet och sökande behöva göra om arbete. Överföringen bör

därför behandlas som en egen risk och följas med en kontroll av att dokumentation och ansvar faktiskt går att använda i fortsatt handläggning. [MYN, I01, I02]

Åtgärdsunderlaget delar in myndighetsförslagen i 17 åtgärder inom huvudscenariot, en särskild övergångsåtgärd och två förslag som förutsätter ett vidare framtida mandat. Rapporten följer denna indelning i både ekonomiska jämförelser och rekommendationer. Det gör det möjligt att arbeta vidare med det som ryms inom det beskrivna uppdraget, samtidigt som behov av bredare samordning kan beredas på rätt nivå. Klassningen innebär varken att förslagen redan är införda eller att varje tillämpningsfråga är rättsligt avgjord. [MYN, I01, I02]

RISKBILD

04 Riskernas kostnader och betydelse för prioriteringen

Kostnadsrangordningen visar vilka riskposter som ger störst modellerat ekonomiskt utslag. Beskrivningarna behövs för att bedöma varför och vad som går att påverka.

Den ekonomiska rangordningen bygger på ett utgångsläge utan införda motåtgärder. Det överensstämmer med att samtliga kontroller i denna analys är föreslagna investeringar. För varje risk som har jämförbara underlag kombineras bedömd årlig händelsefrekvens med bedömd kostnad per händelse. De 307 risker som kan kostnadsberäknas utgör därför en betydligt bredare grund för prioritering än ett urval som också utesluter värden enbart på grund av stor skillnad mellan median och medelvärde. Sådana skillnader behålls här som information om fördelningen. [REG, RES]

Högt i kostnadslistan finns långa överprövningsförlopp, tidsförskjutningar i vattenmål och risker nära byggstart. De förenas av att projekten kan ha betydande ekonomiska åtaganden när störningen inträffar. En förlängd väntan kan då påverka kapitalbindning och planerad verksamhet samtidigt som nya processkostnader tillkommer. Det innebär att en risk kan vara ekonomiskt viktig även om den berör färre ärenden än ett vanligt kompletteringsproblem. Förbättringar behöver därför bedömas både efter hur många ärenden de når och efter vad som står på spel i de ärenden som påverkas. [REG, RES]

Årsmedelvärdena är på flera håll mycket höga. För risken att överprövningens handläggningstid påverkar projektet är modellens årsmedelvärde omkring 602 miljarder kronor. Det beloppet följer av kombinationen av frekvens- och kostnadsfördelningarna och ska inte uppfattas som en uppmätt nationell kostnad. Fördelningarnas höga utfall kan påverka medelvärdet starkt, samtidigt som underlaget inte fastställer att alla berörda kostnader är ekonomiskt åtskilda. Risken är därför ett tydligt prioriteringsobjekt för fortsatt sakgranskning, medan den exakta beloppsnivån kräver större försiktighet än rangordningens presentation kan ge intryck av. [REG, RES]

Figur 2. De tio högsta modellerade årsmedelvärdena



Miljoner kronor per risk och år, utan införda kontroller. Beloppen påverkas av fördelningarnas höga utfall och kan innehålla överlappande kostnader. De ska inte summeras till en nationell förlust. · Källa: REG, RES


Medianerna på riskkorten hjälper läsaren att se fördelningarnas mittpunkter utan att de höga utfallen får samma genomslag. För samma överprövningsrisk är frekvensmedianen cirka 43 händelser per år och medianen för bedömd kostnad vid händelse cirka 191 miljoner kronor. Dessa två medianer ska inte multipliceras och benämnas medianårsförlust. De beskriver olika delar av bedömningen, medan årsmedelvärdet beräknas från deras medelvärden. Rapporten redovisar därför måtten med skilda benämningar och använder ingen konstruerad median för den samlade årsförlusten. [REG, RES]

Det finns också fall där underlaget ger ett konkret skäl att avstå från ett årsbelopp. Ett prejudikat som förändrar rättsläget kan beskrivas både som en rättslig händelse och som ett antal berörda projekt. Om antalet prejudikat kombineras med kostnaden per projekt, eller omvänt, förändras beräkningens innebörd. I en annan risk överstiger den modellerade frekvensen för försenade delegationsärenden den totala ärendevolym som anges i

beskrivningen. Dessa skillnader behöver klarläggas innan beloppen används. Riskerna finns kvar i analysen med en förklaring till vad som saknas. [REG, RES]

Genomgången av riskbeskrivningarna ger ett kompletterande sätt att bedöma storleksordningar. Fyrtio intervall för 32 risker kan föras tillbaka till uttryckliga uppgifter om exempelvis antal händelser per år eller typisk kostnad i ett ärende. Ett intervall för väntan på ett besked om prövningstillstånd är något annat än kostnaden för hela överprövningen, vilket framgår av källtextens avgränsning. Denna precision är värdefull även när intervallet inte kan ersätta ett medelvärde. Intervallen visas därför som egna uppskattningar, med källtext och förklaring, och påverkar inte rangordningen genom en godtyckligt vald mittpunkt. [REG, RES]

Figur 3. Kostnadsramar som återfinns i riskbeskrivningarna

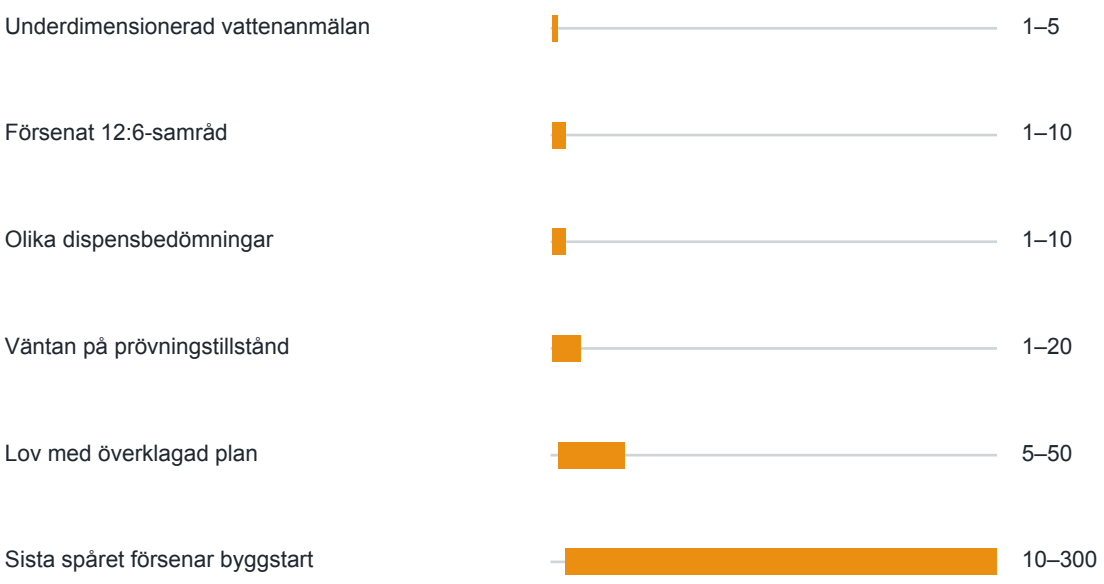

mnkr per händelse. Linjär skala 0–300.

Exempel på typiska kostnadsintervall per händelse, i miljoner kronor. Uppgifterna är beskrivningarnas egna uppskattningar och har ingen angiven statistisk konfidensnivå. · Källa: REG, RES

Kostnad och relativ sannolikhet svarar slutligen på olika frågor. Sannolikhetsrangordningen visar vilka risker som modellen placerar högre än andra i fråga om förekomst. Kostnadsrangordningen tar även hänsyn till konsekvensen och kan därför föra fram mindre vanliga men ekonomiskt betydande händelser. För en organisation som ska prioritera insatser bör båda perspektiven användas: vanliga problem kan motivera breda förbättringar av arbetssätt, medan stora konsekvenser kan motivera en mer riktad kvalitetssäkring. Processkopplingarna visar sedan var dessa insatser kan sättas in. [REG, RES]

RISKBILD


05 Var i processen riskerna får betydelse

Processkartorna gör det möjligt att följa hur ett tidigt vägval påverkar senare underlag, beslut och förutsättningar för start.

De sju delprocesserna beskriver olika delar av ett projekts väg genom prövningen. De ska läsas som en struktur för analysen och behöver anpassas till det enskilda projektets rättsliga väg. Alla verksamheter passerar inte samtliga noder, och vissa spår löper parallellt. Varje risk har därför en direkt processkoppling som används när antalen redovisas. Uttryckliga följdrelationer kan också undersökas i processvyn, men de har inte gjorts om till en beräknad sannolikhet för att en störning sprids. [REG, RES, MYN]

Figur 4. Myndighetsåtgärdernas täckning per delprocess

Grå: Alla risker i delprocessen. Orange: Åtgärd inom underlagets huvudscenario.

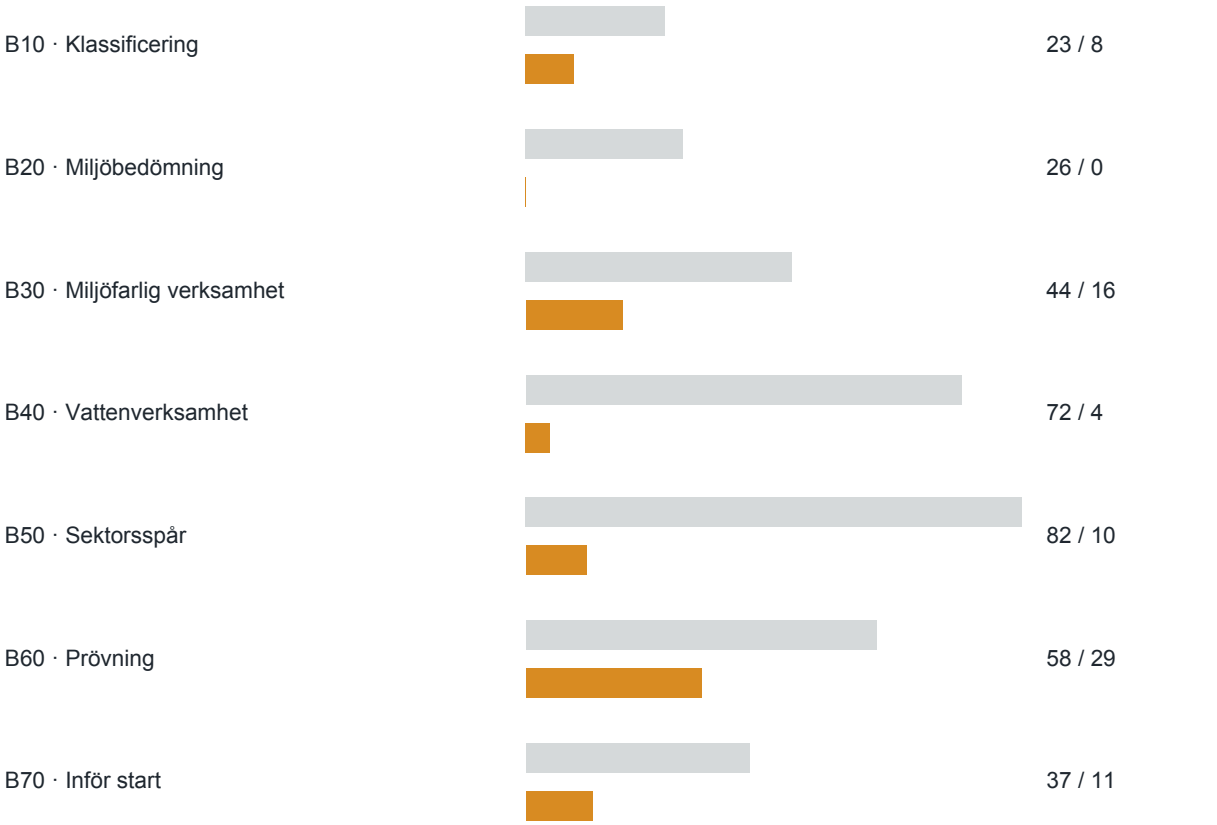

Grå stapel visar alla risker i processen. Orange stapel visar risker med minst en koppling till de 17 åtgärderna i huvudscenariot. Antalen anger dokumenterade samband och säger inget om hur stor effekten blir. · Källa: REG, RES

Den inledande klassificeringen, B10, påverkar vilka prövningar som behöver göras och vilket underlag som ska tas fram. Ett felaktigt vägval kan få följder långt senare, när tid och resurser redan lagts på en ansökan. De föreslagna myndighetsåtgärderna om dokumenterad processvägledning och tidig kontroll av behörighet och prövningsram, MPM-01 och MPM-02, är relevanta i denna del. Deras värde ligger i att frågor om ansvar och avgränsning kan behandlas innan de får konsekvenser för flera andra arbetsmoment. Vägledningen behöver samtidigt ange vilka bedömningar som är preliminära och vilka förutsättningar de bygger på. [REG, RES, MYN]

Miljöbedömningen, B20, innehåller bland annat frågor om avgränsning och underlag. Här kan projektets tekniska utveckling och behovet av naturvetenskapliga undersökningar ha olika tidplaner. Om en inventering förutsätter en viss årstid får tidpunkten för besked om behovet särskild betydelse. Tre av processens risker finns i kostnadstopp 50, men ingen av dess risker har en direkt koppling till de 17 myndighetsåtgärderna i huvudscenariot. Det betyder att ansvar och tillämpliga åtgärder i denna del behöver undersökas särskilt; de bredare förslagen om

framtida mandat bör hållas åtskilda från vad som kan göras inom huvudscenariot. [REG, RES, MYN]

Prövningen av miljöfarlig verksamhet, B30, har tydliga samband med frågor om fullständighet, handläggning och beslut. Sexton av processens 44 risker nås av myndighetsåtgärderna i huvudscenariot. Det ger en konkret grund för att arbeta med samlad granskning, planering och en spårbar ärendeakt, men täckningen innebär inte att alla bakomliggande problem därmed är lösta. Företagets underlag, projektändringar och behov av teknisk kompetens påverkar fortfarande förloppet. Uppföljningen behöver därför visa både vilka arbetssätt myndigheten använder och vilka förutsättningar som råder i ärendet. [REG, RES, MYN]

Vattenverksamhet, B40, omfattar 72 risker och är den näst största delen av registret. Fem risker finns i kostnadstopp 50, medan fyra har en koppling till myndighetsåtgärderna i huvudscenariot. Skillnaden mellan omfattande riskbild och begränsad åtgärdstäckning är relevant för Svenskt Näringslivs fortsatta arbete. Den talar för att förbättringsfrågorna också behöver tas till andra berörda aktörer och att åtgärderna bör avgränsas efter ärendetyp. När kostnaden beror på en tidsförskjutning behöver analysen skilja den nödvändiga utredningens omfattning från merkostnaden av att behovet eller ansvaret klargörs sent. [REG, RES, MYN]

Sektorsspåren, B50, innehåller 82 risker och 15 av de 50 högst kostnadsrankade. De omfattar flera slags beslut och rättigheter som kan ha betydelse för ett och samma projekt. Den stora mängden riskposter speglar delvis processens bredd och ska därför inte tolkas som en observerad andel misslyckade ärenden. För prioriteringen är däremot de dokumenterade beroendena centrala. Om ett nödvändigt sektorsbeslut blir klart senare än miljöprövningen kan projektets genomförande ändå behöva vänta. En tillståndsmatris och överenskomna gränssnitt kan ge bättre framförhållning om de används för att följa faktiska beslut, ansvariga och återstående frågor. [REG, RES, MYN]

Prövning och överprövning, B60, har 58 risker, varav 36 klassificerats med ursprung i myndighet och prövning. Här finns 11 av riskerna i kostnadstopp 50 och 29 risker som nås av myndighetsåtgärderna i huvudscenariot. Det är därmed en central del för analysen av beslutens kvalitet och av vad som händer efter ett överklagande eller en återförvisning. En formell brist kan få en omfattande ekonomisk följd om den innebär att handläggning måste tas om. Åtgärder för kungörelse, delgivning och riktad hantering efter återförvisning får därför en tydlig roll i den fortsatta investeringsbedömningen. [REG, RES, MYN]

Inför start, B70, samlas beroenden som återstår när projektet kommit långt. Tolv av processens 37 risker ligger i kostnadstopp 50. Det kan handla om beslut som ännu inte fått laga kraft, ekonomisk säkerhet eller andra godkännanden som krävs innan verksamheten kan börja. En uppföljning som stannar vid dagen för miljötillståndet kan missa dessa förlopp. För företaget behöver planeringen därför även visa vilket villkor som sist håller tillbaka start och vilka andra aktiviteter som påverkas av väntan. Myndighetens rådighet kan vara begränsad till vissa delar,

men tydlig information om återstående beroenden kan ändå förbättra planeringen. [REG, RES, MYN]

Tabell 1. Riskbild genom de sju delprocesserna

Delprocess	Risker	Årskostnad finns	I kostnadstopp 50
B10	23	18	1
B20	26	26	3
B30	44	40	3
B40	72	69	5
B50	82	70	15
B60	58	47	11
B70	37	37	12

RISKBILD

06 Myndighetsrelaterade risker och möjligheten att påverka dem

Riskens ursprung och åtgärdens ansvar behöver hållas isär när ett förbättringsarbete avgränsas.

Av registrets 342 risker har 118 sitt angivna ursprung i myndighet och prövning, 145 i sökande och ansökan samt 79 i externa förhållanden. Klassningen anger var det beskrivna problemet huvudsakligen uppstår. Den är inte en bedömning av juridiskt ansvar och behöver heller inte sammanfalla med vem som bäst kan förebygga följderna. En brist i ansökan kan exempelvis fångas upp genom en tydlig myndighetsgranskning, medan företaget kan begränsa följderna av en lång handläggning genom bättre planering av beroende aktiviteter. [REG, MYN]

Bland de 118 myndighetsrelaterade riskerna avser 45 kapacitet och handläggning, 26 rättslig osäkerhet och 16 överklagande. Dessa kategorier ger en inriktning för fortsatt analys.

Kapacitetsfrågorna berör tillgång till tid och kompetens, medan rättslig osäkerhet kan kräva klargöranden, dokumenterade bedömningar och fungerande former för att hantera förändringar. Överklaganderiskerna behöver i sin tur delas upp mellan sådant som kan förebyggas genom ett väl berett beslut och sådant som hör till en självständig överprövning. Alla dessa frågor kan påverka tidsåtgång, men de kräver olika typer av åtgärder. [REG, MYN]

Figur 5. Riskernas ursprung och myndighetsåtgärdernas räckvidd

Grå: Alla risker. Orange: Med myndighetsåtgärd.



Alla 20 myndighetsåtgärder ingår i den orange stapeln, inklusive organisationsövergång och framtida mandat. Riskernas ursprung beskriver förloppet och innebär ingen ansvarsprövning. · Källa: REG, RES

De 20 myndighetsåtgärderna har kopplingar till 57 av de 118 myndighetsrelaterade riskerna. De når också 23 risker med ursprung hos sökanden och tio externa risker. Det visar hur arbetssätt på myndighetssidan kan minska sårbarheten i ett förlopp även när myndigheten inte orsakar den ursprungliga störningen. En spårbar ärendeakt kan exempelvis underlätta hanteringen av en projektändring, och en tydlig prövningsram kan göra det lättare för sökanden att ta fram rätt material. För att bedöma nyttan behöver analysen därför följa den konkreta orsaken och den föreslagna kontrollens placering i riskförloppet. [REG, MYN]

Drygt hälften av de myndighetsrelaterade riskerna saknar samtidigt koppling till någon av de särskilt framtagna myndighetsåtgärderna. Detta är en lucka i åtgärdsunderlaget som bör granskas, men den visar inte automatiskt att en ny rutin behövs för varje risk. Vissa frågor kan ligga utanför myndighetens mandat, andra kan hanteras genom kontroller som ännu inte klassificerats som myndighetsdrivna. Ett lämpligt nästa steg är att gå igenom de oadresserade riskerna utifrån deras kostnad, processläge och återkommande orsaker, så att fler risker kan hanteras med ett genomtänkt arbetssätt där det är möjligt. [REG, MYN]

De 17 åtgärderna i huvudscenariot har 133 riktade kopplingar till orsaker och åtta till konsekvenser i riskernas bow ties. Tyngdpunkten ligger därmed på att förebygga problem genom vägledning, beredning, planering och beslutsarbete. Sambandskartan kan användas för att se när flera risker delar en orsak eller berörs av samma kontroll. En gemensam orsak är dock

inte samma sak som ett uppmätt statistiskt beroende. För att använda sambandet i en ekonomisk totalberäkning behövs en tydligare beskrivning av vilka händelser och kostnader som faktiskt sammanfaller. [REG, MYN]

ANALYS AV RISKFÖRLOPPEN

07 Från oklart underlagsbehov till en användbar fullständighetsgranskning

Tydliga besked om underlaget påverkar både handläggningen och företagets möjligheter att planera arbetet.

Intervjukälla I03 beskriver ett ärende där företaget länge saknade besked om ansökan var komplett. Företaget hade fått en tidsuppgift som förutsatte fullständigt underlag, men uppfattade att tiden fram till denna bedömning låg utanför den praktiska prognosen. Berättelsen visar varför en tidsangivelse behöver ha en tydlig startpunkt och kompletteras med information om vad som återstår före denna punkt. Den angivna ärendehistoriken har inte kontrollerats mot en myndighetsakt i detta arbete. [I03]

> Myndigheten har satt upp en KPI för en del av sin process men det säger inte mig någonting om slutprodukten som kund.

Intervjukälla I03 · Intervjuanteckning, stycke 13 [I03-13]

I04 lägger större vikt vid kompletteringskravens relevans och omfattning än vid den formella tidsfristens start. Intervjuanteckningen beskriver hur bristande sakkunskap kan leda till fler frågor och hur företagets egen kompetens påverkar möjligheten att bedöma kraven. Detta ger en möjlig förklaring till att likartade processsteg kan upplevas mycket olika av olika företag. Det ger däremot inget mått på hur stor del av alla kompletteringar som är omotiverade. [I04]

I05 beskriver sent tillkommande inventeringar som behöver genomföras under en viss årstid. När tidsfönstret har passerat kan nästa möjliga undersökning ligga långt fram i tiden. Kostnaden ökar då i ett steg och kan omfatta både fortsatt kapitalbindning och omplanering av andra aktiviteter. En kontroll som identifierar ett säsongsberoende behov tidigt kan därför vara relevant även när själva undersökningskostnaden är begränsad. [I05]

Dessa mekanismer talar för att fullständighetsgranskning bör vara samlad, preciserad och spårbar. MPM-05 avser en sådan granskning och MPM-06 avser tidig identifiering av säsongsberoende underlag. Åtgärderna behöver samordnas med sökandens underlagskontroll, C-SHARED-underlagskontroll. En gemensam redovisning av fråga, rättslig relevans, ansvarig

och tidpunkt kan göra det lättare att skilja nya sakförhållanden från frågor som redan har behandlats. [MYN, REG]

Det finns samtidigt legitima skäl att komplettera ett underlag när ny information kommer fram eller projektet ändras. Uppföljningen bör därför skilja kompletteringar efter orsak. Ett mål om färre kompletteringar utan denna uppdelning kan ge fel drivkrafter, till exempel att ofullständiga underlag godtas för tidigt. Ett bättre underlag visar hur ofta tidigare kända behov identifieras sent och vilken merkostnad just detta medför.

För att arbetssättet ska fungera behöver granskningen resultera i ett besked som går att använda. Det bör framgå vilka frågor som återstår, hur de anknyter till prövningen, vilken precision som behövs och när underlaget kan tas fram. Ett sådant besked kan även göra det möjligt att planera vad myndigheten kan fortsätta med under tiden. Vid senare kompletteringskrav bör orsaken dokumenteras, exempelvis om projektet ändrats, nya förhållanden framkommit eller ett tidigare identifierbart behov missats. Då går det att följa om åtgärden faktiskt begränsar omarbete eller främst flyttar arbete mellan skeden. [MYN]

Den modellerade effekten av samlad fullständighetsgranskning, MPM-05, är positiv sammantaget för de sju av åtta kopplade risker som har användbara årsbelopp. Minskningen är omkring elva procent av dessa riskposters sammanlagda kostnadsunderlag när åtgärden införs ensam. En av de åtta riskerna får samtidigt ett negativt modellbidrag och en saknar jämförbar årskostnad. Den ekonomiska analysen ger därmed en anledning att undersöka åtgärden vidare, medan innehållet behöver utformas med hänsyn till hur kompletteringsarbetet faktiskt förändras. Denna avgränsning är särskilt viktig om myndigheten och sökanden har olika uppfattning om vad som redan är utrett. [RES, MYN]

ANALYS AV RISKFÖRLOPPEN

08 Kompetens och kontinuitet genom handläggningen

Tillgänglig kapacitet, sakkunskap och dokumentation påverkar olika delar av samma ärendeförlopp.

I02, I03 och I04 beskriver skillnader mellan regioner och handläggare. Skillnaderna gäller både tidsåtgång, framdrift och vilka frågor som ställs. I03 återger samtidigt ett annat ärende med tydligare återkoppling och en upplevelse av god kompetens. Det positiva exemplet är relevant eftersom det visar att respondenten skiljer mellan arbetssätt inom samma breda system. Underlaget ger anledning att undersöka variationens orsaker, men medger ingen fördelning av ansvar mellan bemanning, ärendekomplexitet och organisation. [I02, I03, I04]

I04 beskriver ett fall där handläggningen enligt intervjupersonen inte påbörjades förrän efter ett år på grund av personalbrist. En väl förberedd ansökan kan begränsa vissa omtag, medan väntan på tillgänglig handläggare kräver andra åtgärder. Det är därför viktigt att skilja kötid från aktiv handläggning och att ge båda delarna en tydlig plats i uppföljningen. [I04]

Vid byte av handläggare behöver tidigare ställningstaganden kunna förstås och prövas i sitt sammanhang. I05 beskriver hur frågor som verksamhetsutövaren uppfattat som avklarade kan aktualiseras igen efter ett ansvarsbyte. En dokumenterad överlämning bör därför omfatta avgränsningar, identifierade osäkerheter, underlagets version och skälen till tidigare bedömningar. Den bör också ange vilka frågor som fortfarande är öppna. [I05]

> Problematiken förstärks av att flera handläggare kan vara involverade i olika skeden av processen. När ansvaret övergår från en person till en annan finns en risk att tidigare diskussioner och bedömningar inte får fullt genomslag i den fortsatta prövningen. Frågor som verksamhetsutövaren uppfattat som avklarade kan därmed aktualiseras på nytt, samtidigt som nya utredningskrav tillkommer.

Intervjukälla I05 · Intervjuanteckning, stycke 24 [I05-24]

Intervjukälla I01 pekar på behovet att förena enhetlig handläggning med sakligt motiverade lokala skillnader. I02 understryker värdet av lokalkännedom. Dessa synpunkter ger ett viktigt villkor för nationell specialisering: den behöver ge handläggaren tillgång till både generell ämneskunskap och relevant platsinformation. Ett standardiserat underlag kan stödja denna kombination om det lämnar utrymme för att dokumentera de lokala förhållandena. [I01, I02]

Åtgärden för gemensam kapacitets- och specialistfördelning, MPM-08, bör bedömas tillsammans med aktiv planering och en spårbar ärendeakt. Kapacitetsfördelning kan göra det lättare att sätta in rätt kompetens när ett ärende behöver den, medan dokumentationen gör det möjligt för fler att bidra utan att förlora tidigare bedömningar. MPM-10 omfattar versionskontroll och spårbarhet i den egna ärendeakten. MPM-14 avser däremot överlämnandet efter överklagande och myndighetens roll i den fortsatta domstolsprocessen. Dessa olika uppgifter bör få egna tillämpningskrav och uppföljningsmått. [MYN]

Ett lämpligt uppföljningsunderlag skulle kunna visa hur länge ett ärende väntar på arbete, vilken kompetens som efterfrågas och hur ofta ett byte av ansvarig leder till att tidigare frågor behöver rekonstrueras. Med denna uppdelning blir det lättare att se om problemet främst gäller tillgängliga resurser, prioritering mellan ärenden eller dokumentationens användbarhet. Även positiva erfarenheter bör följas, så att organisationen kan identifiera vilka rutiner och former av dialog som bidrar till framdrift. Målet bör vara att göra det fungerande arbetssättet möjligt att använda i fler ärenden, med utrymme för deras olika sakförhållanden. [I02, I03, I04, I05]

ANALYS AV RISKFÖRLOPPEN

09 Parallella beslut och den faktiska möjligheten att starta

När flera beslut behövs avgör deras inbördes beroenden hur en försening påverkar projektet.

Processkartorna visar flera förlopp där miljöprövningen löper parallellt med planläggning, sektorsbeslut eller rättighetsfrågor. Om ett nödvändigt spår blir klart senare än de andra kan förberedda resurser och beslut få begränsat värde under väntetiden. Riskerna behöver därför följas genom hela beslutskedjan, med särskild uppmärksamhet på de steg som hindrar genomförande även när andra ärenden är avslutade. [REG]

I ett projekt där flera nödvändiga villkor ska vara uppfyllda blir det sist färdiga villkoret avgörande för den tidigaste möjliga starten. Denna enkla iakttagelse förklarar varför en förkortning av ett enskilt ärende ibland ger begränsad tidsvinst för projektet, medan en mindre

förändring i ett annat spår kan få stor betydelse. Det behövs därför en bild av vilka frågor som kan hanteras parallellt och vilka som förutsätter ett tidigare beslut. En sådan projektbild kan också visa när ett försenat beslut riskerar att påverka avtal, tilldelade resurser eller andra förutsättningar som gäller under en begränsad tid. [REG]

I03 beskriver kopplingar mellan tillståndens rättsliga status, tilldelning av eleffekt och villkor för investeringsstöd. Om processerna har olika tidslogik kan en försening i prövningen påverka förutsättningarna för finansiering eller anslutning. Rapporten behandlar detta som en beskriven riskmekanism i ett företags erfarenhet. Den fastställer varken ett visst stödutfall eller en generell regel om hur nätkapacitet fördelas. [I03]

I05 beskriver större projekt där flera prövningar och överklaganden behöver hanteras innan genomförandet kan fortsätta. En kostnadsbedömning bör här skilja mellan en gemensam försening och flera separata förseningar. Om två hinder löper samtidigt kan deras fulla tidskostnader överlappa. Om det ena hindret gör att ett säsongsfönster missas kan följden i stället bli större än summan av de ursprungliga handläggningstiderna. [I05, REG]

C-SHARED-tillstandsmatris avser att samordna en tillståndsmatris per åtgärd. MPM-04 avser överenskomna gränssnitt med andra beslutsorgan. Dessa kontroller kan ge en gemensam bild av vilka beslut som återstår, vilka underlag som delas och när olika ansvariga behöver agera. Deras nytta behöver bedömas mot konkreta projektförlopp, eftersom en dokumenterad matris ensam inte förkortar en rättsligt nödvändig prövning. [REG, MYN]

En fortsatt ekonomisk analys bör knyta kostnader till identifierade förseningsperioder och kostnadsslag. Därigenom kan kapitalbindning, omarbete och utebliven produktion redovisas utan att samma belopp kopieras mellan flera riskposter. Detta är en förutsättning för en meningsfull totalberäkning och för att senare kontrollscenarier ska kunna jämföras på samma grund.

I investeringsbedömningen bör gränssnittsåtgärder därför granskas tillsammans med den risk de avser att begränsa. MPM-04 ger i modellen en minskning på omkring 31 procent inom de tre kopplade riskernas kostnadsunderlag när åtgärden införs ensam. Det är ett starkare utslag än vad enbart antalet tre riskkopplingar skulle antyda. Samtidigt bygger nyttan på att informationen leder till faktiska förbättringar i planering eller hantering. En kontaktväg eller en tillståndsmatris behöver ha en ansvarig, hållas aktuell och användas när förutsättningarna förändras för att kunna påverka förloppet. [RES, MYN]

ANALYS AV RISKFÖRLOPPEN

10 Beslut, överklagande och vägen tillbaka efter återförvisning

Kvalitet i beslutets beredning och formella hantering kan få stor betydelse när projektet annars behöver genomgå ytterligare en prövningsomgång.

Överprövning hör till de förlopp som ger stora ekonomiska utslag i riskmätningen. En del av tidsåtgången följer av att beslut behöver kunna prövas självständigt och att motstående intressen ska kunna komma till tals. För förbättringsarbetet är det därför viktigt att precisera vilka delar av förloppet en åtgärd ska påverka. Brister i beredning, otydliga villkor eller fel i kungörelse och delgivning kan ge andra åtgärdsbehov än den tid som krävs för en materiell domstolsprövning. En kontroll bör kopplas till det förstnämnda när det är där myndigheten har möjlighet att förebygga ett onödigt omtag. [REG, RES, MYN]

Kontrollerad kungörelse, delgivning och överklagandeinformation, MPM-13, har åtta riskkopplingar och ett positivt modellbidrag för samtliga. När åtgärden införs ensam minskar summan av dessa åtta riskposters årskostnad med omkring 44 procent. Det är ett av de större ekonomiska bidragen bland de myndighetsdrivna förslagen. För att bedöma investeringen närmare behöver arbetssättet dock preciseras: vilka moment som ska kontrolleras, vem som gör kontrollen, vilken dokumentation som sparas och hur avvikelser rättas innan de får följder för beslutets fortsatta hantering. [REG, RES, MYN]

Riktad hantering efter återförvisning, MPM-16, når två risker men ger det största beräknade fristående bidraget bland huvudscenariots myndighetsåtgärder. Resultatet visar att en åtgärd med få kopplingar kan vara ekonomiskt viktig när de berörda riskerna har stora konsekvenser. Åtgärdens inriktning är att klarlägga vad som återstår efter återförvisningen, samla nödvändiga insatser och föra ärendet vidare med hänsyn till avgörandets innehåll. En praktisk tillämpning bör dokumentera vilka frågor som ska hanteras på nytt och vilka tidigare underlag som fortfarande går att använda, så att omtaget blir begripligt för alla berörda. [REG, RES, MYN]

Juridisk och teknisk kvalitetssäkring av egna beslut, MPM-11, och entydiga tillståndsvillkor, MPM-12, verkar tidigare i samma kedja. De kan bidra till att beslutets förutsättningar, skäl och krav blir tydligare, vilket även har betydelse för verksamhetsutövarens planering och efterlevnad. Modellresultaten skiljer sig dock mellan åtgärderna och mellan risker. För MPM-12 är det samlade kostnadsutslaget litet i förhållande till de kopplade riskernas underlag, och två

risker får ökade värden. Detta bör utredas som en fråga om bedömningens innehåll och åtgärdens avgränsning innan resultatet används som investeringsgrund. [REG, RES, MYN]

Denna del av prövningen motiverar också uppföljning som går längre än antalet överklaganden. Ett överklagande kan vara välgrundat och är inte i sig ett tecken på bristande kvalitet. Mer användbara uppgifter är vilka frågor som leder till ändring eller återförvisning, vilka formella brister som återkommer och hur mycket ytterligare arbete som uppstår. Genom att följa orsaker och följder kan kvalitetssäkringen riktas mot problem som faktiskt går att påverka, samtidigt som prövningens självständighet och de berördas rättigheter beaktas. [REG, RES, MYN]

ÅTGÄRDER OCH GENOMFÖRANDE

11 Motåtgärdernas potential och vad en investering behöver pröva

Mätningen gör det möjligt att jämföra föreslagna åtgärders bidrag. Ett investeringsbeslut behöver dessutom ta hänsyn till genomförandekostnad, täckning och osäkerhet.

Kontrollregistret omfattar 378 föreslagna motåtgärder. De har olika räckvidd och kan vara riktade mot en bakomliggande orsak, mot själva riskhändelsen eller mot dess konsekvenser. En kontroll kan beröra flera risker, och samma risk kan ha flera kontroller. Detta gör det möjligt att undersöka gemensamma arbetssätt som påverkar flera delar av processen, men innebär också att en ekonomisk bedömning behöver hantera kombinationer. Två åtgärder som berör samma risk kan inte jämföras genom att deras fristående besparingar utan vidare läggs samman. [RES, REG, MYN]


I mätningen finns 998 effektposter för 377 av kontrollerna. De beskriver bidrag till förändring av frekvens respektive kostnad per händelse, med utgångspunkt i bedömningar utan och med kontroller. Rapportens och webbplatsens jämförelser börjar utan införda åtgärder, i enlighet med underlagets aktuella genomförandestatus. För varje valt kontrollurval kombineras de berörda effekterna per risk, varefter kostnadsförändringen beräknas. Beräkningen återanvänder mätningen och innebär ingen ny mätning eller simulering. Den håller osäkerhetens bredd konstant och förutsätter att kontrollernas särskilda samspel inte ger ytterligare effekter utöver modellens kombination. [RES, REG, MYN]

Den fristående jämförelsen av myndighetsåtgärder ger störst kostnadsbidrag för riktad hantering efter återförvisning, MPM-16, följt av kontrollerad kungörelse, delgivning och överklagandeinformation, MPM-13. Den första omfattar två risker och ger en modellerad minskning på omkring 32 procent inom deras kostnadsunderlag; den andra omfattar åtta och ger omkring 44 procent. Att MPM-16 ger det större beloppet trots färre kopplingar illustrerar betydelsen av vilka risker som nås. Antalet kopplingar är därför ett mått på räckvidd som behöver läsas tillsammans med konsekvenser och effektbedömning. [RES, REG, MYN]

För fullständighetsgranskning, gränssnitt mellan beslutsorgan och ärendets dokumentation ger resultaten en mer sammansatt bild. Dessa åtgärder har stöd i de riskmekanismer som intervjuerna beskriver, men deras ekonomiska bidrag varierar och underlaget täcker inte alltid alla kopplade risker. Det är särskilt viktigt vid jämförelser där en åtgärd når risker utan årsbelopp. Ett lågt redovisat bidrag kan då bero på att en betydelsefull del av nyttan ännu inte

kan kostnadsberäknas. Tabellen och den digitala analysen visar därför både antal berörda risker och hur många som faktiskt ingår i beloppsjämförelsen. [RES, REG, MYN]

Figur 6. Fristående åtgärdseffekt inom respektive kostnadsunderlag

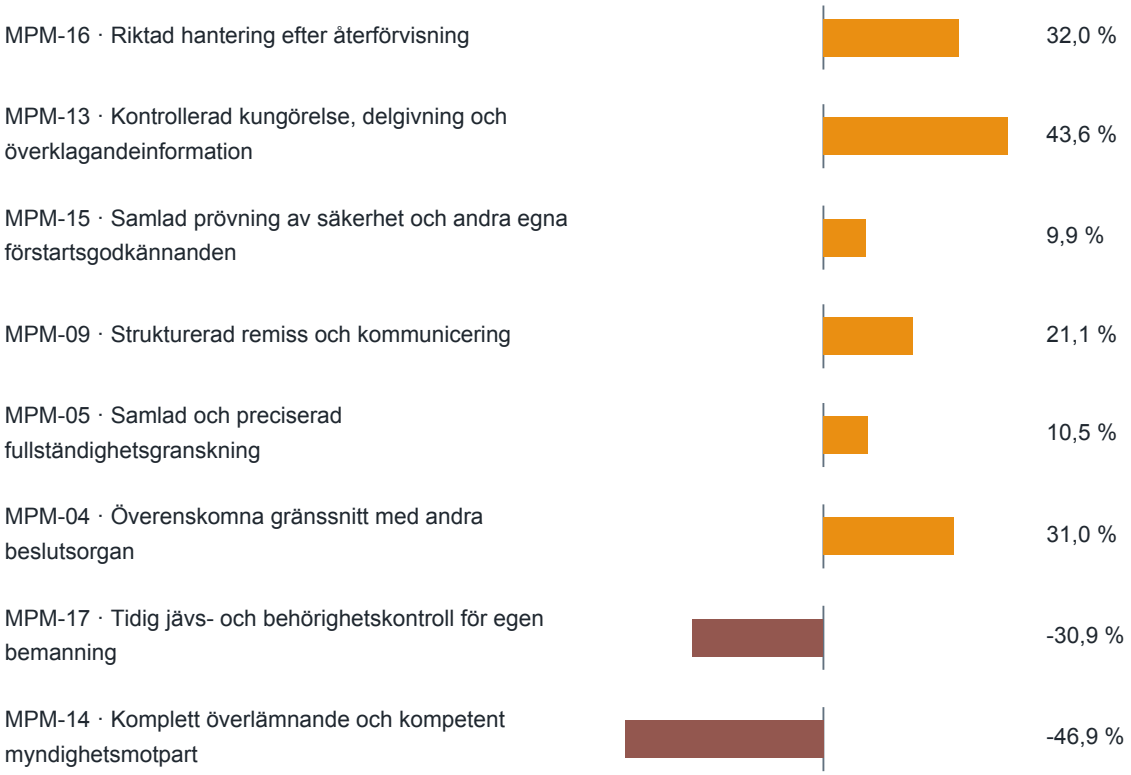

Noll i mitten. Höger: minskning. Vänster: ökning i modellen. Gemensam linjär skala.

Procentuell minskning när åtgärden införs ensam. Varje rad gäller sina egna kopplade risker med kostnadsunderlag. Negativa värden innebär en ökning i modellen. Urvalet visar de sex största positiva beloppsbidragen och två negativa huvudscenarioresultat. · Källa: REG, RES

När de 17 åtgärderna i huvudscenariot kombineras omfattar det dokumenterade urvalet 78 risker, varav 72 har jämförbara kostnadsunderlag. Summan av dessa riskposters årsmedelvärden minskar från omkring 433 till 331 miljarder kronor, motsvarande cirka 23 procent. Beloppen är stora och bygger på samma osäkra riskvärden som kostnadsrangordningen. De ska användas som en jämförelse inom den angivna modellen, med tydlig uppmärksamhet på ekonomiska överlapp. En samhällsekonomisk nettobesparing kan fastställas först när samma förlust inte längre räknas i flera poster och när åtgärdernas kostnader ingår. [RES, REG, MYN]

Modellen ger inte genomgående positiva effekter. Två myndighetsåtgärder har ett negativt samlat fristående bidrag i den aktuella beräkningen: MPM-14, som gäller överlämnande och myndighetens roll vid fortsatt prövning, samt MPM-17, som gäller jävs- och behörighetskontroll för bemanningen. Även flera andra åtgärder innehåller enstaka negativa riskbidrag. Det är inte

tillräckligt stöd för att säga att kontrollen i verkligheten ökar risken. Däremot är det ett skäl att granska bedömningarnas riktning, kontrollens avgränsning och jämförbarheten mellan lägena utan och med åtgärder. Att behålla dessa resultat synliga gör granskningen möjlig. [RES, REG, MYN]

Figur 7. Huvudscenariots 17 myndighetsåtgärder tillsammans



Jämförelsen omfattar samma 72 kostnadsbedömda riskposter i båda lägena. Index 100 är utgångsläget utan åtgärder. Sex ytterligare kopplade risker saknar jämförbar kostnad. Åtgärdskostnader och ekonomiska överlapp ingår inte. · Källa: REG, RES

För en konkret investering bör jämförelsen därför föras vidare till genomförandet. Det behöver anges vilket arbetssätt som ska förändras, i vilka ärenden det ska användas, vem som ansvarar och vilka resurser som krävs. Kostnaden bör omfatta utveckling, utbildning, löpande arbete och eventuell ökad belastning hos sökanden. En åtgärd med mindre beräknad bruttonytta kan vara mer attraktiv om den är enklare att införa, har lägre kostnad eller ger ett mer robust resultat. Omvänt kan en omfattande systemförändring behöva prövas i mindre skala innan den modellerade nyttan används för att motivera en större investering. [RES, REG, MYN]

Den separata analysfliken för motåtgärder är utformad för denna jämförelse. Besökaren kan välja kontroller, se förändringen per risk och undersöka vad varje kontroll tillför när de andra i urvalet behålls. Valen ändrar endast analysen på skärmen. Genomförandestatus och källdata ligger fast. På så sätt kan underlaget användas för att diskutera alternativa insatser utan att ett utforskat scenario förväxlas med ett fattat beslut eller en redan genomförd förbättring. [RES, REG, MYN]

Tabell 2. Exempel på underlag för fortsatt investeringsbedömning

Åtgärd	Kostnadsunderlag	Fristående minskning	Vad som behöver prövas
MPM-16 · Riktad hantering efter återförvisning	2 av 2 risker	32,0 %	Rutiner, ansvar och arbetstid efter återförvisning.
MPM-13 · Kontrollerad kungörelse, delgivning och överklagandeinformation	8 av 8 risker	43,6 %	Kontrollpunkter och ansvar före expediering.
MPM-05 · Samlad och preciserad fullständighetsgranskning	7 av 8 risker	10,5 %	Samlad granskning, sena behov och förändrad arbetsinsats.
MPM-04 · Överenskomna gränssnitt med andra beslutsorgan	3 av 3 risker	31,0 %	Faktisk användning av gränssnitt och gemensam information.
MPM-14 · Komplett överlämnande och kompetent myndighetsmotpart	2 av 2 risker	-46,9 %	Negativt modellbidrag behöver sakgranskas innan ekonomisk prioritering.

ÅTGÄRDER OCH GENOMFÖRANDE


12 Åtgärdspaket inom myndighetens rådighet

Förslagen behöver föras över till arbetssätt som går att använda, bemanna och följa upp i konkreta ärenden.

Åtgärderna i huvudscenariot kan samlas i fem arbetsområden: vägledning och mottagning, underlag och ärendeakt, planering och samordning, beslut och delgivning samt fortsatt prövning och förutsättningar inför start. Indelningen följer kontrollernas innehåll och gör det lättare att se vilka funktioner som behöver samarbeta. Den ersätter inte bedömningen av varje åtgärd. Ett arbetsområde kan innehålla förslag med olika rättsliga förutsättningar, resursbehov och styrka i effektunderlaget, vilket behöver framgå när ett paket bereds. [MYN, REG, RES]

Figur 8. Vilka risker de fem arbetsområdena når

Grå: Kopplade risker. Orange: Därav i kostnadstopp 50.

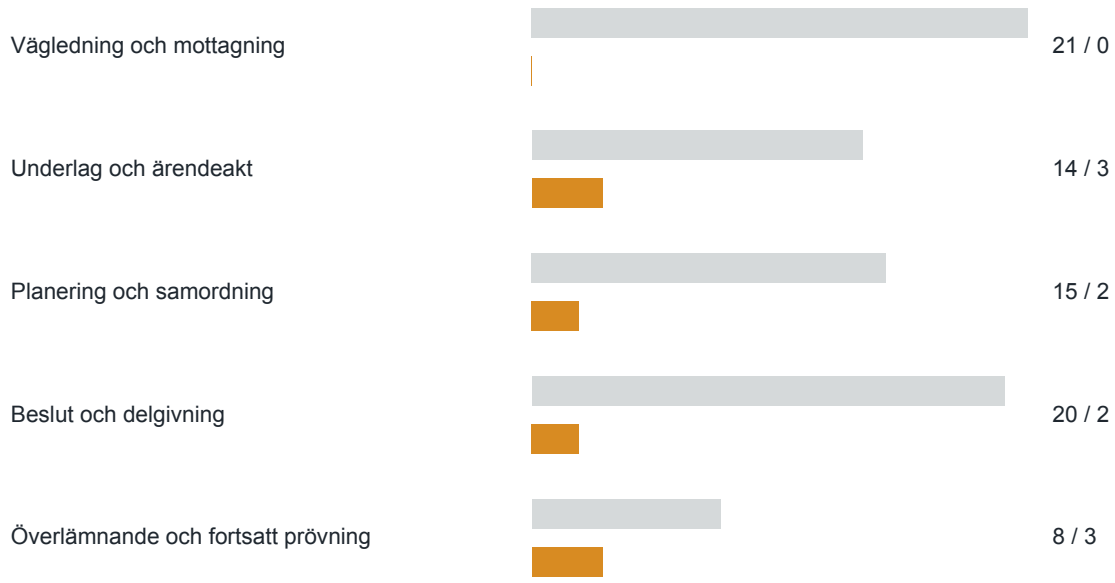

De 17 åtgärderna i huvudscenariot. En risk kan förekomma i fler än ett arbetsområde. Orange visar risker i kostnadstopp 50, grått samtliga kopplade risker. · Källa: REG, RES

Vägledning och mottagning omfattar framför allt MPM-01 och MPM-02. Här bör ett gemensamt arbetssätt göra det lättare att identifiera behörig prövning, hålla reda på vilken projektversion som diskuteras och dokumentera vilka besked som lämnats. En tydlig

avgränsning är särskilt viktig när den sökande ännu inte har bestämt alla tekniska detaljer. Arbetssättet behöver kunna hantera ändringar utan att tidigare information går förlorad eller uppfattas som mer bindande än den är. Nyttan bör följas genom färre sena omtag i vägval och en bättre förståelse för vad som återstår. [MYN, REG, RES]

Underlag och ärendeakt omfattar samlad fullständighetsgranskning, säsongsberoende behov och versionskontroll. MPM-05, MPM-06 och MPM-10 berör tillsammans 14 unika risker. Ett gemensamt genomförande bör göra det möjligt att följa en fråga från det första beskedet till det underlag som besvarar den, med uppgift om ansvarig, datum och eventuell förändring av kravet. Detta kan förbättra förutsättningarna både för handläggning och överlämning. Det bör dock följas om dokumentationsarbetet blir proportionerligt och om det faktiskt används, så att en ny rutin inte främst blir ytterligare en administrativ uppgift. [MYN, REG, RES]

Planering och samordning förenar MPM-03, MPM-04 och MPM-07–09. Förslagen berör dels sambandet mellan ärenden och beslutsorgan, dels planeringen av den egna handläggningen, tillgång till specialiststöd och remissarbetet. Tillsammans når de 15 unika risker. Genomförandet bör börja med en tydlig skillnad mellan det myndigheten själv kan planera och beroenden där andra behöver agera. En tidplan blir mer användbar om den visar varför en tidpunkt är osäker, vilka besked som kan ändra den och när planeringen ska uppdateras. Samma information kan hjälpa sökanden att samordna sina egna aktiviteter. [MYN, REG, RES]

Beslut och delgivning omfattar MPM-11–13 och når 20 unika risker. Här finns både möjligheter till sakkunnig granskning av beslutets innehåll och kontroll av den formella hanteringen. Ett lämpligt arbetssätt bör precisera när granskningen ska ske och hur upptäckta brister rättas. Om kontrollen läggs för sent kan den i sig skapa försening, medan en tydlig kontrollpunkt före expediering kan begränsa senare omtag. Den ekonomiska analysen ger särskild anledning att kostnadsberäkna MPM-13, men valet av insats bör också ta hänsyn till vilka fel som faktiskt återkommer i organisationens ärenden. [MYN, REG, RES]

Det sista arbetsområdet omfattar MPM-14–17 och når åtta unika risker. Det rör överlämnande, egna förstartsgodkännanden, återförvisning samt jävs- och behörighetskontroll. Förslagen delar inte samma effektprofil och bör därför inte genomföras som ett odifferentierat paket. MPM-16 har ett stort positivt modellbidrag, medan MPM-14 och MPM-17 behöver en särskild granskning av de negativa resultaten. Genomförandet bör utgå från varje kontrolls avsedda funktion och från vilka uppgifter myndigheten behöver säkra för att nästa del av processen ska fungera. [MYN, REG, RES]

Organisationsövergången, MPM-T01, bör hållas åtskild från den löpande verksamhetens förbättringsarbete. Åtgärden når nio risker, men endast två har användbara årsbelopp i den aktuella jämförelsen. Dess låga beloppsbidrag ger därför ett ofullständigt mått på betydelsen av att överföra pågående ärenden korrekt. En praktisk beredning bör kontrollera ärendeakter, frister, ansvar, åtkomst och öppna frågor samt ordna en hantering av avvikelser. Förslagen om ett framtida bredare mandat, MPM-F01 och MPM-F02, behöver i sin tur behandlas som

särskilda utvecklingsfrågor och inte räknas in i ett genomförande inom huvudscenariot. [MYN, REG, RES]

Figur 9. Arbetsområdenas kopplingar till delprocesserna

Åtgärdsområde	B10	B20	B30	B40	B50	B60	B70
Vägledning och mottagning	4	0	11	0	3	2	1
Underlag och ärendeakt	1	0	4	1	1	6	1
Planering och samordning	3	0	1	3	1	7	0
Beslut och delgivning	0	0	0	0	5	10	5
Överlämnande och fortsatt prövning	0	0	0	0	0	4	4

Antal unika risker inom varje kombination av arbetsområde och delprocess. Tabellen visar var den föreslagna verksamhetsutvecklingen möter processernas risker. · Källa: REG, RES

BEDÖMNING OCH REKOMMENDATIONER

13 Hur resultaten bör vägas samman

Prioriteringen blir mer användbar när belopp, riskförlopp, genomförbarhet och erfarenheter prövas tillsammans.

Riskmätningen och intervjuerna ger olika slags kunskap. Mätningen gör det möjligt att ordna risker och jämföra möjliga åtgärdseffekter på ett enhetligt sätt. Intervjuerna beskriver hur företag och andra berörda uppfattar konkreta förlopp, vilka frågor som blir svåra att planera och hur olika arbetssätt fungerar. När båda pekar mot samma mekanism finns ett bättre underlag för att formulera en förbättringsinsats. Samstämmigheten ska dock bedömas med hänsyn till att intervjuerna i vissa fall tog upp tidigare prioriterade risker och därför inte utgör en helt oberoende prövning av rangordningen. [REG, RES, MYN, I03, I04, I05]

Det mest genomgående sambandet gäller hur underlag och tidigare bedömningar följer med mellan processens steg. Otydliga besked kan ge merarbete hos sökanden, medan bristande dokumentation kan göra det svårt för en ny handläggare att förstå vad som redan har utretts. En åtgärd som förbättrar dokumentationen kan därför bidra till flera risker samtidigt. För att detta ska bli en faktisk förbättring behöver arbetssättet även ge utrymme för saklig omprövning när projektet eller omständigheterna ändras. Kontinuitet bör innebära att tidigare arbete kan förstås och användas, med tydliga skäl när en ny bedömning behövs. [REG, RES, MYN, I03, I04, I05]

En andra fråga gäller förhållandet mellan en myndighets prestation och företagets möjlighet att genomföra projektet. En kortare handläggningstid kan ha stort värde, men effekten beror på vilka andra beslut som återstår och när resurser behöver bindas. Intervjuerna beskriver hur tidsfrister som börjar efter en fullständighetsbedömning kan vara svåra att använda för den som inte vet när denna bedömning blir klar. Uppföljningen behöver därför omfatta både den egna handläggningen och relevanta väntetider före och efter den. Det ger en bättre grund för att förstå om en förbättring faktiskt förändrar projektets förutsättningar. [REG, RES, MYN, I03, I04, I05]

De stora modellerade kostnadsbeloppen kräver en särskild tolkning. En hög placering kan bero på hög bedömd frekvens, stor konsekvens, stor osäkerhet eller en kombination av dessa. Den här utgåvan behåller kalibrerade värden även när fördelningarna är skeva, men lämnar specificerade skalfel och populationsproblem odefinierade. Denna ordning ger en bredare ekonomisk analys samtidigt som det framgår var beloppen behöver granskas närmare. Det innebär inte att varje publicerat belopp är empiriskt verifierat. Särskilt de risker som dominerar

kostnadsrangordningen bör följas tillbaka till ärendevolym, kostnadsslag och tidsperiod. [REG, RES, MYN, I03, I04, I05]

För kontrollerna tillkommer frågan om överlapp. Två åtgärder kan påverka samma risk, och två risker kan beskriva delar av samma ekonomiska förlust. Modellens kombination av kontrolleffekter hanterar det första på den valda logaritmiska skalan, men innehåller ingen skattning av alla praktiska samspel. Den ekonomiska överlappningen mellan riskposter är ännu inte avstämd. Resultaten lämpar sig därför för att jämföra alternativ och välja fördjupningar, medan en budget eller ett investeringsbeslut behöver ett mer avgränsat kostnadsunderlag. En stor modellerad bruttonytta bör leda till en noggrann prövning av antagandena och genomförandekostnaden. [REG, RES, MYN, I03, I04, I05]

Rapportens rekommendationer bygger på denna samlade läsning. Åtgärder som berör kostsamma omtag och sena formella brister bör ges plats i den ekonomiska beredningen. Arbetssätt för fullständighet, säsongsbehov, planering och dokumentation bör utvecklas med stöd av de återkommande erfarenheterna i intervjuerna. Förslag med svagt eller motsägelsefullt effektunderlag bör preciseras och granskas innan deras beräknade nytta används. På så sätt kan förbättringsarbetet komma vidare samtidigt som de viktigaste osäkerheterna får en konkret behandling. [REG, RES, MYN, I03, I04, I05]

BEDÖMNING OCH REKOMMENDATIONER

14 Inriktning för prioritering och beredning

Svenskt Näringsliv kan använda riskunderlaget för att driva avgränsade förbättringar och ställa tydligare frågor om deras kostnader och resultat.

Den första rekommendationen är att bereda åtgärder mot omtag i beslutskedjan som ett särskilt investeringsområde. Den ekonomiska analysen pekar på riktad hantering efter återförvisning och kvalitet i kungörelse, delgivning och överklagandeinformation. För båda bör ett konkret arbetssätt tas fram med ansvar, kontrollpunkter och beräknad resursåtgång. Beredningen bör använda ett urval av verkliga ärenden för att pröva om de riskmekanismer som ger stora modellbidrag också motsvarar återkommande och påverkbara problem. Därmed kan den stora beräknade potentialen ställas mot en mer avgränsad investeringskalkyl. [RES, MYN, REG]

Den andra rekommendationen är att utveckla fullständighetsgranskning och hantering av säsongsberoende underlag tillsammans med sökandens förberedelser. Ett gemensamt besked om återstående frågor bör kunna följas till svar, underlagsversion och ansvarig. Vid nya krav bör

det framgå varför de tillkommit och vilken påverkan de har på planeringen. Insatsen bör prövas i ärenden där tidsfönster och kompletteringar har tydlig ekonomisk betydelse. Utvärderingen behöver även fånga om mer arbete läggs tidigt i processen, så att en kortare senare handläggning inte automatiskt räknas som en minskning av den totala belastningen. [RES, MYN, REG]

Den tredje rekommendationen gäller planering, kompetens och kontinuitet. En användbar ärendeakt, tydliga prioriteringar och tillgång till rätt specialiststöd bör behandlas som delar av det praktiska arbetet. Det bör gå att se vilka frågor som väntar på bedömning, vilken kompetens som behövs och vilka tidigare ställningstaganden nästa handläggare kan utgå från. Svenskt Näringsliv kan bidra med företagens erfarenheter av när besked blir användbara för planeringen och vilka väntetider som är svåra att förstå. Uppföljningen bör samtidigt ge utrymme för myndighetens förklaring av ärendets komplexitet och av varför ett underlag behöver kompletteras. [RES, MYN, REG]

Den fjärde rekommendationen är att följa projektens viktigaste beroenden fram till möjlig start. För ett avgränsat ärendeurval bör det dokumenteras vilka beslut och godkännanden som återstår, vilket organ som ansvarar och vad som hindrar nästa steg. Åtgärder för gränssnitt och tillståndsmatriser kan då bedömas utifrån om de förbättrar information, planering och faktisk hantering. Detta arbete bör även uppmärksamma risker utanför den nya myndighetens mandat, så att en förbättring inom ett spår inte döljer att projektet fortfarande väntar på ett annat. [RES, MYN, REG]

Den femte rekommendationen är att skilja den nya organisationens övergångsrisker från den långsiktiga effektbedömningen. Pågående ärenden behöver en mottagande ansvarig och en verifierad överföring av dokument, frister och öppna frågor. Den modellerade kostnadstäckningen är begränsad för denna åtgärd, men processanalysen ger konkreta skäl att hantera den. Ett genomförande bör därför motiveras med den verksamhetsrisk som behöver förebyggas och följas genom stickprov på faktisk användbarhet, utan att ett ofullständigt beloppsunderlag får ge intryck av att övergången saknar betydelse. [RES, MYN, REG]

Slutligen bör en särskild sakgranskning genomföras för de stora kostnadsdrivarna och för negativa kontrolleffekter. Granskningen bör börja med händelseenhet och population, fortsätta med kostnadens innehåll och därefter pröva hur fördelningens höga utfall påverkar medelvärdet. För en kontroll bör det även kontrolleras att lägena utan och med åtgärden avser samma risk och jämförbara förutsättningar. Resultatet bör dokumenteras så att ändringar går att förklara och följa över tid. Detta ger ett mer hållbart underlag för resursbeslut än att låta en exakt rangplats ensam avgöra prioriteringen. [RES, MYN, REG]

BEDÖMNING OCH REKOMMENDATIONER

15 Uppföljning av genomförande, kostnader och resultat

Faktisk användning av åtgärderna behöver följas tillsammans med hur ärendena utvecklas.

För att bedöma en kontrolls effekt behövs först information om faktisk användning. Det bör framgå i vilka ärenden åtgärden tillämpas, när den börjar gälla och vad tillämpningen konkret innebär. En kontroll som endast finns i en rutinbeskrivning kan annars jämföras med ett referensläge utan att någon faktisk förändring har skett. Genomförandet behöver därför mätas tillsammans med utfallet.

Tabell 4. Föreslagna uppföljningsmått

Mått	Definition	Tolkning och kontroll
Tid till första samlade besked	Dagar från mottagen ansökan till dokumenterat besked om samlade underlagsbehov	Redovisa median och spridning per ärendetyp; kontrollera ändrad ärendemix
Sena tidigare kända behov	Kompletteringskrav efter första beskedet där behovet kunde identifieras vid granskningen	Skilj nya sakförhållanden och projektändringar från missade behov
Kontinuitet vid överlämning	Ärenden med verifierad överlämning av version, avgränsningar, frister och öppna frågor	Följ faktisk användbarhet genom stickprov
Kö och aktiv handläggning	Tid utan aktiv handläggning respektive tid i dokumenterat arbete	Redovisa definition och registreringsgrad
Tid till möjlig projektstart	Tid tills samtliga identifierade förstartsvillkor är uppfyllda	Håll isär tillståndsbeslut, laga kraft och andra nödvändiga villkor
Merkostnad	Dokumenterad omarbetning och förseningskostnad med orsak och period	Undvik samma kostnad i flera riskposter

Om ärenden före och efter införandet jämförs behöver grupperna vara tillräckligt lika. Bransch, ärendets omfattning, tidigare tillstånd, projektändringar och belastning hos handläggande organisation kan påverka utfallet. Där jämförelsen är möjlig bör dessa faktorer dokumenteras. Där jämförelsen är svag bör resultatet redovisas som en beskrivande förändring, med en tydlig begränsning av slutsatsen om orsak.

Kostnaden för en åtgärd bör delas upp i införande, löpande drift och eventuell kostnad hos sökanden. Ett gemensamt handläggarstöd kan exempelvis kräva tid för utveckling och utbildning men spara tid i senare ärenden. En bedömning av nettonytta behöver en uttrycklig tidsperiod och samma kostnadsbegrepp i referens- och åtgärdsscenario. Okända kostnader ska ligga kvar som okända tills ett användbart underlag finns.

När riskbedömningen uppdateras bör förändringar i underlag, antaganden och genomförandestatus redovisas var för sig. En risk kan byta plats därför att dess kostnad blivit bättre belagd, därför att ett problem blivit vanligare eller därför att andra risker har omvärderats. Rapportens text och figurer behöver därför avse samma bedömningstidpunkt. Med denna ordning kan uppföljningen visa vad som förändrats och varför, samtidigt som tidigare bedömningar finns kvar för jämförelse. [RES]

En gemensam monetär Monte Carlo-analys bör övervägas först när en konkret fråga om till exempel budgetrisk eller kostnadsspridning behöver besvaras och underlaget kan bära antagandena. Den kräver en konsekvent händelsemodell, hantering av gemensamma orsaker och överlapp samt kostnadsfördelningar med tydlig betydelse. Tills dess ger de enklare måtten ett mer granskbart beslutsunderlag.

BEDÖMNING OCH REKOMMENDATIONER

16 Slutsatser

Riskbilden ger skäl att prioritera både kvaliteten i enskilda beslut och kontinuiteten genom hela tillståndsprocessen.

Analysen visar att betydande kostnadsrisker finns i flera delar av tillståndsprocessen, med en tydlig koncentration till sektorsberoenden, prövning och överprövning samt återstående villkor inför start. Företagets ekonomiska förutsättningar påverkas av hur dessa delar fungerar tillsammans. En uppföljning som enbart behandlar en myndighets tid från komplett ansökan till beslut ger därför en begränsad bild. Förutsebarheten behöver bedömas även utifrån vilka krav som är kända, hur ändringar hanteras och när projektets samlade förutsättningar för genomförande kan vara uppfyllda. [REG, RES, MYN]

Myndighetsåtgärderna ger ett konkret underlag för fortsatt arbete. De 17 förslagen i huvudscenariot når 78 risker och har en positiv samlad modellpotential i den del som kan kostnadsberäknas. Åtgärder mot återförvisningsförlopp och brister i den formella beslutshanteringen framträder i den ekonomiska jämförelsen. Fullständighetsgranskning, tidig hantering av säsongsbehov, planering och dokumentation har samtidigt tydliga samband med de problem som beskrivs i intervjuerna. Dessa resultat motiverar att förslagen förs vidare till preciserade arbetssätt och kostnadsbedömningar. [REG, RES, MYN]

Alla risker och kontroller har behållits i underlaget, även där en årskostnad eller effekt inte kan fastställas. De odefinierade värdena och de negativa modellbidragen anger var fortsatt granskning behövs. De stora beloppen i kostnadsrangordningen bör också följas tillbaka till antaganden och avgränsningar innan de används i en investeringskalkyl. Genom att kombinera denna granskning med praktisk prövning av åtgärderna kan Svenskt Näringsliv bidra till ett förbättringsarbete där både genomförbarhet och resultat blir möjliga att följa. Den nya myndighetens etablering ger ett tillfälle att ordna detta arbete tidigt, med tydlig ansvarsfördelning och bevarad kunskap från pågående ärenden. [REG, RES, MYN]

KÄLLOR

17 Referenser och källförteckning

Rapportens analys bygger på process- och riskunderlag, mätresultat, åtgärdsförslag och intervjuer.

Källorna nedan har olika funktion. Process- och riskregistret beskriver möjliga förlopp och deras kopplingar, medan mätningen ger modellbedömningar inom en angiven omfattning. Intervjukällorna används för att förstå erfarenheter och mekanismer och har inte behandlats som ett representativt statistiskt urval. Hänvisningar till offentliga dokument stödjer beskrivningen av den institutionella bakgrunden. Uppgifter som endast återfinns som uppskattningar i en riskbeskrivning redovisas som sådana och har inte uppgraderats till verifierad offentlig statistik.

[REG] Riskregister, processkartor och kontrollregister

Versionslåst underlag för denna utgåva: 342 risker, 378 motåtgärder, 500 unika risk–kontrollpar och 633 riktade kontrollkopplingar. Grundmaterialets rättsliga referenser finns kvar på varje risk och processnod. Baslinjen S0 är daterad 20 augusti 2026; reformscenarier redovisas separat.

[RES] Risk- och åtgärdsbedömning, oktober 2026

Avslutad bedömning av 341 registerrisker. Analysen använder läget utan införda kontroller och bevarar de separata bedömningarna med kontroller som jämförelseunderlag. Källresultat och omfattning är daterade och låsta till denna rapportutgåva.

[CODE] Beräkningsprinciper och reproducerbart analysunderlag

Dokumentation av riskmått, kontrolleffekter, källkontroller och rapportens beräkningar. Tekniska identiteter och kontrollsummor finns i webbplatsens dataunderlag.

https://nic-esp.github.io/miljotillstandsrisker/data/measurement.json

[MYN] Prioriterade myndighetsåtgärder, version 0.10

Tillhandahållna tabeller myndighetskontroller_riskkopplingar.csv och atgardsforslag_bedomning.csv med läsanvisning. Bedömningsdatum 30 september 2026. Innehåller 17 åtgärder i S1, en införandeåtgärd och två förslag som förutsätter framtida mandat. Klassningen beskriver förslagens tillämpning och ska inte likställas med verifierat genomförande.

[RIX] Riksdagen: Ny myndighet för miljöprövning, betänkande 2025/26:MJU24

Miljö- och jordbruksutskottets behandling av proposition 2025/26:238. Underlag för beskrivningen av reformens inriktning och avgränsning. Kontrollerad 22 oktober 2026.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/betankande/ny-myndighet-for-miljoprovning_hd01mju24/html/

[LST] Länsstyrelsen Västra Götaland: Ny myndighet för miljöprövning får kontor i Göteborg

Publicerad 19 augusti 2026. Bekräftar planerad myndighetsstart den 1 juli 2027 och kontor i Stockholm, Göteborg och Umeå. Kontrollerad 22 oktober 2026.

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---vastra-gotaland/2026-08-19-ny-myndighet-for-miljoprovning-far-kontor-i-goteborg.html

Intervjukällor

[I01] Intervjukälla I01 · Offentlig förvaltning och organisationsförändring

[I02] Intervjukälla I02 · Erfarenhet från näringsliv och förvaltning

[I03] Intervjukälla I03 · Industriell projektutveckling

[I04] Intervjukälla I04 · Industri och logistik

[I05] Intervjukälla I05 · Infrastruktur och anläggning

BILAGOR

A Metod och måttens betydelse

Bilagan beskriver hur riskunderlaget har strukturerats, hur bedömningarna har omräknats och vilka slutsatser måtten medger.

Analysen börjar i ett register där varje risk har ett identifierat händelseförlopp och en direkt koppling till en processnod. Orsaker, händelse och konsekvenser redovisas som en bow tie. Kontrollerna kopplas till riskerna och, där underlaget anger detta, till särskilda orsaker eller konsekvenser. Strukturen används för att undersöka likheter, gemensamma åtgärder och processberoenden. En sådan koppling är ett dokumenterat samband i analysunderlaget och innebär inte i sig att ett orsakssamband är statistiskt verifierat. [REG, RES, CODE]

Mätningen bygger på jämförande bedömningar av riskerna och kalibrering mot absoluta referensnivåer. Bradley–Terry–Luce-modellen används för att anpassa en relativ skala till jämförelserna. Den relativa rangordningen anger hur risker förhåller sig till varandra inom bedömningen. För att kunna uttrycka resultaten som händelser per år eller kronor behövs dessutom jämförelser mot angivna frekvens- och kostnadsankare. Endast resultat som har en godkänd absolut kalibrering och en användbar skattning förs vidare till beloppsberäkningen. Kalibrering beskriver hur skalan kopplas till enheterna; den visar inte ensam att bedömningarna stämmer med observerade utfall. [REG, RES, CODE]

Den använda omfattningen avser händelser i svenska prövningsärenden och projekt under ett år. Konsekvensen gäller den enskilda händelsen i ett projekt. Analysen skiljer på bedömningar utan och med kontroller och använder läget utan kontroller som utgångspunkt, eftersom ingen av de föreslagna åtgärderna ännu är införd. Frekvens- och kostnadsbedömningarna är lognormala parameterfördelningar. Median och medelvärde har beräknats analytiskt från de sparade läges- och spridningsparametrarna för detta utgångsläge, vilket bevarar mätningens fördelningsantagande utan en ny simulering. [REG, RES, CODE]

I en lognormal fördelning är medianen $\exp(\mu)$ och medelvärdet $\exp(\mu + \sigma^2/2)$, där μ är läget och σ spridningen på den logaritmiska skalan. Sambandet förklarar varför ett stort medelvärde kan uppkomma även när medianen är betydligt lägre. Medianerna visas som standard för frekvens och kostnad per händelse. De är sammanfattningar av bedömningen av respektive parameter och ska inte förväxlas med medianen av årets faktiska ekonomiska utfall. Årsmedelvärdet beräknas från frekvensmedlet och kostnadsmedlet under ett uttryckligt antagande om oberoende mellan dessa två bedömningar. [REG, RES, CODE]

Förväntad årskostnad = förväntat antal händelser per år × förväntad kostnad per händelse. Beräkningen kräver jämförbar händelseenhet, period och ekonomisk avgränsning. Om hög

frekvens samvarierar med större eller mindre händelsekostnad kan produkten av separata medelvärden avvika från den gemensamma förväntan. Detta beroende är inte skattat ur empiriska projektdata. Två medianer multipliceras aldrig och benämns medianårsförlust, eftersom den faktiska årsförlusten dessutom beror på antalet inträffade händelser och deras variation. [REG, RES, CODE]

Det tillgängliga underlaget innehåller även Monte Carlo-resultat för parameterosäkerhet. Dessa behålls som källresultat och kan användas för att kontrollera och fördjupa tolkningen av bedömningarna. Det finns däremot ingen användbar gemensam monetär årsförlustfördelning som motiverar en redovisning av portföljmedian eller övre förlustkvantiler. Rapporten visar därför inte något sådant diagram. Fler simulerade utfall skulle i sig inte lösa frågor om händelseenhet, ekonomisk dubbelräkning eller osäkerhet i grundbedömningarna. [REG, RES, CODE]

Riskernas årsmedelvärden kan summeras matematiskt, men en ekonomiskt meningsfull totalsumma kräver att samma förlust inte ingår i flera riskposter. Två processhinder kan exempelvis löpa samtidigt och båda beskriva kostnaden för samma förseningsperiod. Ett statistiskt beroende mellan händelserna är en annan fråga än denna dubbelräkning. Rapportens summeringar benämns därför summor av riskposter och används för jämförelser inom samma urval. En nationell nettokostnad kräver ett projektbaserat underlag där kostnaderna fördelas mellan händelser och perioder. [REG, RES, CODE]

BILAGOR

B Värdegranskning och återvunna beskrivningsuppgifter

Kalibrerade värden används som huvudregel. Ett utelämnat årsbelopp ska kunna förklaras med ett konkret problem i underlaget.

Granskningen omfattar källornas identitet, mätningens omfattning, enheter, kalibrering och kopplingar mellan risker och kontroller. En stor skillnad mellan medelvärde och median medför ingen uteslutning, och det finns inget generellt tak för en beräknad årskostnad. Skillnaden mellan centralvärde och höga utfall behöver i stället vara synlig i analysen. På så sätt kan en läsare bedöma hur stor del av prioriteringen som beror på fördelningens form utan att en skev fördelning automatiskt behandlas som felaktig. [RES, REG]

Två gränser används för att identifiera storleksordningar som kräver särskilt stöd: mer än 10 000 händelser per år eller mer än 10 miljarder kronor i medelkostnad per händelse. De är

granskningsgränser och innebär inte att ett värde strax under gränsen är verifierat eller att ett värde över den är omöjligt. Sexton risker berörs av frekvensgränsen och 14 av händelsekostnadsgränsen; reglerna överlappar för en risk. Ytterligare två risker saknar användbar absolut skattning och tre har individuellt dokumenterade problem med population eller exponering. Sammantaget saknar 34 uppmätta risker ett publicerat årsbelopp. En ytterligare registerrisk ingår inte i mätningen. [RES, REG]

De individuella problemen gäller en beskrivning där omprövning av vattenkraft används som numerisk referens för en annan riskpopulation, en beskrivning som blandar prejudikat med antalet berörda projekt samt en modellerad frekvens för försenade delegationsärenden som överstiger beskrivningens totala ärendevolym. I dessa fall behövs ett klargörande av vad som räknas som en händelse och vilken population beräkningen avser. Ett intervall från en annan population har inte använts för att fylla luckan. Även dessa risker finns kvar i registret och i processanalysen. [RES, REG]

De 196 tidigare granskningsmarkerade riskerna har gåtts igenom och kompletterats med två som aktualiserades när utgångsläget ändrades till utan införda kontroller. För 57 av de 198 innehöll mätningens sparade beskrivning ett mer utförligt numeriskt referensavsnitt än webbplatsens grundtext. Genomgången identifierade 40 jämförbara intervall för 32 risker och sju ytterligare intervall som endast ger kontext. Sjutton av de 34 risker som fortfarande saknar årsbelopp har någon sådan jämförbar beskrivningsuppgift. Ingen beskrivning har gett ett tillräckligt definierat ersättningsmedel för att ett nytt årsbelopp ska kunna beräknas från den. [RES, REG]

Figur B1. Resultat av genomgången av 198 riskbeskrivningar



32 risker innehåller jämförbara numeriska intervall. För 166 finns ingen sådan uppgift. Modellvärden kan fortfarande användas där de är kalibrerade och saknar ett särskilt granskningshinder. · Källa: REG, RES

För varje återvunnet intervall dokumenteras den exakta källtexten, enheten, den berörda populationen och en bedömning av hur uppgiften kan användas. Orden typisk kostnad och storleksordning innebär inte att intervallets mittpunkt är ett medelvärde eller en median. Tidsuppgifter, investeringsbelopp och exempel från ett särskilt projekt har heller inte gjorts om till en generell förseningskostnad. Uppgifterna visas som beskrivningsskattningar och deras källreferenser har inte verifierats på nytt som del av denna intervallgenomgång. [RES, REG]

Granskningen återför användbara modellvärden för 164 av de 198 granskade riskerna, samtidigt som den lämnar de övriga bristerna synliga. Alla ursprungliga värden finns kvar i

källunderlaget. Om ett värde senare ändras bör skälet, den nya källan och påverkan på rangordningen dokumenteras tillsammans. Denna ordning gör det möjligt att förbättra analysen utan att en sakgranskad beskrivningsuppgift förväxlas med en ny mätning eller med ett observerat utfall. [RES, REG]

BILAGOR

C Intervjumetod och analysmatris

Intervjuerna används för att förstå förlopp och pröva förbättringsförslag, med öppna begränsningar i urval och återgivning.

Underlaget består av fem dokument och omfattar sex medverkande personer. De representerar offentlig förvaltning, erfarenhet från bransch och förvaltning, industriell projektutveckling, industri och logistik samt infrastruktur och anläggning. Ett dokument sammanfattar ett samtal med två personer. Rapporten räknar därför inte varje dokument som en statistiskt oberoende observation av samma fenomen. [I01, I02, I03, I04, I05]

Dokumenten har lästs i sin helhet och delats in med stabila styckehänvisningar. Analysen har först identifierat beskrivna händelser och förlopp, därefter kopplat dem till teman och slutligen jämfört dem med risk- och kontrollregistret. Skillnaden mellan respondentens uppgift och rapportens tolkning har bevarats. Företagsspecifika uppgifter om tid och handläggning har inte gjorts om till absoluta frekvenser eller kostnader.

Tabell C1. Tematisk analysmatris

Tema	Källstöd	Praktisk tolkning och begränsning
Fullständighet och återkoppling	I03 stycke 8 och 13; I04 stycke 14–15	Tidsprognos behöver omfatta vägen till komplett ansökan. Ärendehistorikerna är inte aktgranskade.
Sena krav och säsongsfönster	I05 stycke 16–17	Tidpunkt för identifiering kan få stor betydelse. Omfattning i hela populationen är okänd.
Kompetens och variation	I02 stycke 9–11; I03 stycke 10; I04 stycke 19–23	Möjligt gemensamt förbättringsområde. Ärendekomplexitet och bemanning kan inte separeras kvantitativt.
Överlämning och kontinuitet	I05 stycke 24 och 62; I01 stycke 9–11	Dokumenterad avgränsning och projektversion bör följa ärendet. Implementerad effekt har inte uppmätts.
Företagets egen förmåga	I04 stycke 21 och 32; I05 stycke 37–40	Förberedelser kan minska omtag men löser inte alla myndighetsberoenden.
Samband med finansiering och start	I03 stycke 35–36; I05 stycke 44–51	Projektets samlade tidplan behövs. Uppgifterna ger ingen generell nät- eller stödregel.
Motexempel och variation	I03 stycke 10 och 22; I04 stycke 13 och 49	Positiva erfarenheter och begränsad förekomst ska påverka tolkningen.

C.1 Frågeställningens påverkan

I04 och I05 presenterar tre tidigare högt rankade risker innan intervjupersonerna kommenterar dem. Detta skapar en risk för styrning av uppmärksamheten. Analysen har därför inte räknat instämmande som en oberoende validering av rangordningen. Särskild vikt har lagts vid nyanseringar, ytterligare förlopp och exempel som avviker från den presenterade listan. [I04, I05]

C.2 Återgivning och citat

De publicerade utdragen är kontrollerade mot dokumentens text och försedda med styckehänvisning. Den redaktionella granskningen innebär inte att anteckningarnas alla sakuppgifter är externt verifierade eller att intervjupersonerna har godkänt rapportens samlade slutsatser. Där en anteckning beskriver ett konkret ärende anges uppgiften som en erfarenhet i materialet. Den används för att förklara ett möjligt förlopp och inte för att tillskriva en namngiven handläggare ansvar.

C.3 Fortsatt datainsamling

Ett nästa steg är att komplettera med ett avgränsat urval av ärendeakter och intervjuer från fler perspektiv, inklusive handläggare och verksamhetsutövare med olika storlek och erfarenhet. Samma händelseförlopp bör då följas från båda sidor och tidsuppgifterna stämmas av mot dokument. Detta skulle göra det möjligt att pröva om beskrivna mönster återkommer och vilka delar som beror på särskilda ärendeförhållanden.

BILAGOR

D Beräkning av kontrollernas bidrag

Kontrolljämförelsen använder samma risker och kostnadsunderlag före och efter ett valt åtgärdsurval.

Kontrollernas effektposter bygger på skillnaden mellan bedömda lägen utan och med kontroller, fördelad mellan de kontroller som är kopplade till risken. Fördelningen görs separat för frekvens och kostnad per händelse. Endast identifierade effekter med rätt risk- och kontrollkoppling används. En saknad effektpost är odefinierad och behandlas inte som noll. Även negativa bidrag bevaras, eftersom de är relevanta för granskning av bedömningens riktning och innehåll. [REG, RES, CODE]

Effekterna är angivna på logaritmisk skala. För ett valt kontrollurval summeras skiftet inom varje risk och dimension, varefter frekvens och händelsekostnad multipliceras med exp(−skiftet). Osäkerhetens bredd hålls konstant. Den beräknade årskostnaden jämförs sedan med samma risks årsmedelvärde utan kontroller. Modellen antar därmed additiva skift på logaritmisk skala och multiplicativa förändringar på ursprunglig skala. Enskilda procenttal eller fristående kronbidrag adderas aldrig direkt. [REG, RES, CODE]

Den kombinerade beräkningen förutsätter att särskilda samspel mellan åtgärder inte tillför ytterligare effekter. I praktiken kan en åtgärd göra en annan möjlig eller minska dess betydelse.

Modellen ska därför läsas som en jämförelse under detta antagande, inte som en empiriskt skattad funktion för varje tänkbar kombination. På webbplatsen går det även att se vad en åtgärd tillför när övriga valda åtgärder behålls. Det är skillnaden mellan kombinationen med och utan just den åtgärden, och sådana bidrag ska inte summeras till en total. [REG, RES, CODE]

Kronjämförelsen omfattar endast risker med ett användbart årsbelopp och ett fullständigt effektunderlag för det valda urvalet. Samma riskmängd används i referens och åtgärdsläge, och täckningen visas bredvid resultatet. En positiv förändring kan beskrivas som modellerad bruttominskning inom detta underlag. Genomförandekostnader saknas för samtliga föreslagna åtgärder, vilket innebär att nettonytta och avkastning lämnas odefinierade. Modellvärden på noll har inte använts som belägg för att en kontroll är kostnadsfri. [REG, RES, CODE]

De 500 unika risk–kontrollparen och de 342 direkta processnodkopplingarna har stämts av mellan webbplatsens register och mätunderlaget. Kopplingarna till enskilda bow tie-element är inte helt identiska mellan källorna. Därför används webbplatsens ursprungliga målrelationer för den visuella beskrivningen och mätningens effekter på risk- och kontrollnivå för beräkningen. Resultatet fördelas inte på enskilda orsaker eller konsekvenser som om en sådan detaljeffekt vore uppmätt. En senare analys på den nivån behöver först stämma av målrelationerna. [REG, RES, CODE]

BILAGOR

E Underlag, avgränsning och möjlighet till granskning

Rapport, tabeller och figurer bygger på samma daterade underlag.

Risk- och processmaterialet omfattar 342 risker, sju delprocesser och 378 kontroller. Mätningen slutfördes den 22 oktober 2026 och omfattar 341 risker i ett fastställt urval. De fullständiga källresultaten har bevarats tillsammans med omfattning, indatareferenser och kopplingstabeller. Vid framställningen kontrolleras att varje värde och kontrolleffekt hör till rätt risk och bedömningsomfattning. Ingen ny mätning har startats för denna rapport. [REG, RES, CODE]

Webbplatsens publicerade data ger möjlighet att följa riskernas medelvärden och medianer, huvudrangordningen, beskrivningsuppgifterna och kontrollernas beräknade bidrag. I underlaget finns även de granskade värden som inte används för årsbelopp. Tekniska identiteter och kontrollsummor hålls i datafilerna för reproducerbarhet, medan rapporten

använder läsbara källhänvisningar. Mätresultaten från lägena utan och med kontroller hålls åtskilda, så att ett föreslaget scenario inte kan förväxlas med faktiskt genomförande. [REG, RES, CODE]

Intervjumaterialets publicerade utdrag är kopplade till dokument och styckepositioner. De privata originalen och personuppgifter som inte ingår i den godkända publiceringen finns inte i rapportens data. Webbversionen och PDF-utgåvan framställs från samma manus och samma låsta mätunderlag. När någon av dessa delar ändras behöver rapporten byggas och granskas på nytt, så att en senare mätning inte tyst ändrar innebörden av en redan skriven slutsats. [REG, RES, CODE]

REGISTERBILAGOR

F Kostnadstopp 50

Rangordningen utgår från förväntad årskostnad utan införda kontroller.

Beloppen nedan anges i miljoner kronor per år i Sverige och bygger på mätningens kalibrerade frekvens- och kostnadsbedömningar. De är modellvärden och kan påverkas starkt av fördelningarnas höga utfall. En risk utan årsbelopp kan vara betydande även om den inte ingår i tabellen. Hela registret, medianer för de underliggande måtten och orsaker till odefinierade värden finns på webbplatsen. Beloppen ska inte summeras till en nationell kostnad utan att ekonomiska överlapp först har granskats. [REG, RES]

Tabell F1. Rangordning efter förväntad årskostnad

Rang och risk	Riskhändelse	Mnkr per år
1. R-B60-250-02	Överprövningens handläggningstid påverkar projektet	601 948,2
2. R-B40-P120-01	Handläggningstiden i vattenmål påverkar projektets tidplan	270 256,7
3. R-B70-130-01	Felbedömd byggberedskap trots kvarstående rättsliga hinder	186 973,0
4. R-B70-G090-03	Sektorsbeslutet har ännu inte fått laga kraft eller kan inte tas i anspråk	170 548,5
5. R-B40-GN150-03	BMP-begreppet är omdiskuterat och påverkas av pågående reform	148 444,2
6. R-B20-010-02	Säsongsberoende basdata hinner inte samlas in	143 735,3
7. R-B70-G020-03	Återförvisning från överinstans river upp hela beslutspaketet	110 132,8
8. R-B50-G900-01	AND-gatens sista spår blir projektets kritiska linje	82 897,3
9. R-B60-260-01	Uteblivet prövningstillstånd lämnar MMD:s avgörande stående utan sakprövning i MÖD	81 212,7
10. R-B60-160-02	Regeringen når ett annat resultat än prövningsinstansens yttrande	76 777,3
11. R-B10-060-03	Sektorsspelregler identifieras inte i klassificeringen	75 984,7
12. R-B70-060-01	Kompletteringsloopen mellan inlämning och avslag drar ut förstarten	75 097,4
13. R-B50-P030-01	Antagen detaljplan överklagas och laga kraft skjuts upp	63 001,4
14. R-B60-200-02	Helger, semester och postlogistik rubbar fristberäkningen	61 947,5
15. R-B60-280-02	HD-prejudikat kan upphäva åratal av handläggning i efterhand	54 202,3
16. R-B50-E010-02	Anslutningskö och osäker framkomlighet underminerar nätutredningens antaganden	47 238,8

Rang och risk	Riskhändelse	Mnkr per år
17. R-B50-E020-01	Ansökan bedöms som ofullständig och måste kompletteras innan sakprövningen går vidare	47 222,6
18. R-B50-T020-02	Planöverklagande och separat byggstartsbeslut skapar två regeringsanknutna steg	42 970,8
19. R-B50-S010-02	Ingen äger uppföljningen – sektorsbeslut förverkar tyst	41 868,8
20. R-B70-010-03	Olika projektgränser i olika beslut omöjliggör konsistent matris	41 452,9
21. R-B60-G040-01	Kompletteringskraven blir en ändlös pingisrunda	28 587,4
22. R-B50-X040-02	Inkonsekvent dispenspraxis mellan kommuner och län skapar oförutsägbarhet	27 614,2
23. R-B20-020-02	Lokal opinion mobiliserar och hårdnar under samrådet	26 091,8
24. R-B60-090-01	Motstridiga myndighetsyttranden låser beredningen	23 128,5
25. R-B50-E050-01	Ledningsrätt eller markupplåtelseavtal blir inte klart i tid – byggstart blockeras trots koncession	23 044,9
26. R-B70-G110-01	Geografisk eller kapacitetsmässig konflikt mellan tillstånd, plan och koncession	19 876,2
27. R-B50-T030-01	Vatten-, Natura- och artskyddsbeslut ligger efter planen och blockerar etapper	19 834,2
28. R-B50-P040-01	Lovansökan krockar med icke lagakraftvunnen plan eller kvarstående överklaganderisker	18 550,4
29. R-B50-E010-01	Korridorvalet kolliderar med riksintressen, rennäring eller Natura 2000	16 831,2
30. R-B30-070-01	MKB:n täcker inte den prövning som faktiskt krävs	15 339,6
31. R-B70-G110-02	Igångsättningstid eller arbetstid löper ut innan de övriga gates är klara	14 878,1
32. R-B60-180-01	Natura 2000- eller artskyddskraven kan inte uppfyllas	12 071,8

Rang och risk	Riskhändelse	Mnkr per år
33. R-B70-130-02	Readiness-beslutet fattas utan dokumenterad spårbarhet per gate	11 153,4
34. R-B70-100-02	Förändrade förutsättningar i parallellspåret gör att beslutet inte längre matchar projektet	10 933,9
35. R-B70-G050-03	Tillståndshavarens ekonomiska svikt underminerar säkerhets- och garantistrukturen	10 259,5
36. R-B60-G290-01	Ett nytt avgörande efter återförvisning kan överklagas på nytt	10 151,9
37. R-B60-G020-02	Utesluten sambandsprövning splittrar målet i parallella processer	10 142,5
38. R-B30-100-01	Oprecisa yrkanden stjälper handläggningen	9 879,9
39. R-B70-080-02	Omprojektering för att kringgå markmotstånd skapar nya tillståndsbehov	9 635,1
40. R-B20-G010-02	Sektorsspår och Natura-kollisioner fångas inte i vägvalet	9 351,7
41. R-B50-P030-03	Planens laga kraft avvaktar inte miljöprövningens – beroendekrock mellan spåren	9 345,0
42. R-B40-G070-01	Fel spår väljs: undantag trots att tillståndsplikt föreligger	9 267,4
43. R-B40-010-02	Tillfälliga arbeten och grundvattenbortledning faller utanför avgränsningen	9 252,9
44. R-B30-O100-01	Miljökvalitetsnormsöverträdelse tvingar fram omprövning	9 233,6
45. R-B50-T020-03	Överklaganden av planbeslutet från samebyar, markägare och organisationer	9 176,7
46. R-B60-270-03	EU-rättslig osäkerhet tvingar fram förhandsavgörande eller avvaktan	9 083,3
47. R-B40-P110-03	Kollision med pågående vattenkraftsomprövning i samma vattensystem	9 069,8
48. R-B50-M030-03	Rikskonflikt enligt MB 3–4 kap. fäller avvägningen mot projektet	8 832,2

Rang och risk	Riskhändelse	Mnkr per år
49. R-B50-X030-02	Omprojektering för att undvika förbudet urholkar projektets funktion eller ekonomi	8 672,2
50. R-B70-010-01	Beslutsmatrisen bygger på inaktuella versioner av beslut och villkor	8 051,9

REGISTERBILAGOR

G Myndighetsåtgärder och ekonomiskt jämförelseunderlag

Alla åtgärder är förslag. Täckning och beräknat bidrag behöver läsas tillsammans med mandat och genomförandekostnad.

Tabellen visar den fristående minskningen i procent inom respektive åtgärds kostnadsbedömda riskunderlag. Olika rader avser olika risker och kan därför inte jämföras som om de hade samma ekonomiska bas. Huvudscenario, organisationsövergång och framtida mandat redovisas separat i kontrollregistret. Genomförandekostnader saknas och ingen nettonytta har beräknats. Åtgärdernas detaljsidor innehåller tillämpning, ansvar och de risker som ligger bakom resultatet. [MYN, RES]

Tabell G1. Myndighetsåtgärder, täckning och fristående effekt

Åtgärd	Risker med kostnad / alla	Minskning	I topp 50
MPM-01 · Dokumenterad och avgränsad processvägledning	11 / 11	6,8 %	0
MPM-02 · Tidig kontroll av behörighet och prövningsram	10 / 10	25,3 %	0
MPM-03 · Samordnad handläggning när sambandsregeln medger det	1 / 2	44,7 %	0
MPM-04 · Överenskomna gränssnitt med andra beslutsorgan	3 / 3	31,0 %	1
MPM-05 · Samlad och preciserad fullständighetsgranskning	7 / 8	10,5 %	2
MPM-06 · Tidig identifiering av säsongsberoende underlagsbehov	1 / 1	33,1 %	0
MPM-07 · Aktiv tidsplanering och bevakning av egen handläggning	3 / 3	27,7 %	0
MPM-08 · Gemensam kapacitets- och specialistfördelning	2 / 3	3,9 %	0
MPM-09 · Strukturerad remiss och kommunicering	4 / 5	21,1 %	1

Åtgärd	Risker med kostnad / alla	Minskning	I topp 50
MPM-10 · Spårbar ärendeakt och versionskontroll	6 / 6	5,5 %	2
MPM-11 · Juridisk och teknisk kvalitetssäkring av egna beslut	4 / 6	22,1 %	0
MPM-12 · Entydiga och inbördes förenliga tillståndsvillkor	6 / 6	0,9 %	1
MPM-13 · Kontrollerad kungörelse, delgivning och överklagandeinformation	8 / 8	43,6 %	1
MPM-14 · Komplett överlämnande och kompetent myndighetsmotpart	2 / 2	-46,9 %	0
MPM-15 · Samlad prövning av säkerhet och andra egna förstartsgodkännanden	3 / 3	9,9 %	1
MPM-16 · Riktad hantering efter återförvisning	2 / 2	32,0 %	2
MPM-17 · Tidig jävs- och behörighetskontroll för egen bemanning	1 / 1	-30,9 %	0
MPM-F01 · Samlad myndighetsledning av BMP och MKB-avgränsning	4 / 4	2,0 %	0
MPM-F02 · Gemensam kontaktpunkt för flera tillståndsspår	2 / 2	0,8 %	0

Åtgärd	Risker med kostnad / alla	Minskning	I topp 50
MPM-T01 · Verifierad överföring vid myndighetsstart	2 / 9	0,5 %	0

REGISTERBILAGOR

H Risker med odefinierad årskostnad

Listan visar vad som återstår för att ett jämförbart årsbelopp ska kunna redovisas.

De 34 uppmätta riskerna nedan saknar ett användbart årsbelopp av de angivna skälen. En ytterligare risk ingår inte i mätningen. Tillgängliga medianer och uttryckliga intervall från beskrivningarna kan fortfarande ge relevant information och finns på riskkorten. Inga saknade belopp har ersatts med noll. Den fullständiga beskrivningsgranskningen omfattar 198 risker och finns i webbplatsens dataunderlag, inklusive de risker vars modellvärden kunnat användas. [REG, RES]

Tabell H1. Risker utan jämförbar årskostnad

Risk	Händelse	Vad som saknas
R-B10-020-03	Försvars- och totalförsvarsintressen stoppar lokaliseringen på politisk nivå	Medelkostnaden överstiger 10 miljarder kronor per händelse och saknar särskild beläggning i riskbeskrivningen. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.
R-B10-040-01	Säsongsberoende inventeringar missar sitt fältfönster	Frekvensens medelvärde överstiger 10 000 händelser per år; stöd för ärendevolymen behöver granskas.
R-B10-070-03	Instanskartan föråldras av myndighetsreformen mitt i projektlöpet	Frekvensens medelvärde överstiger 10 000 händelser per år; stöd för ärendevolymen behöver granskas.
R-B10-080-01	Samordningsmöjligheten missas och prövningarna körs isolerat med motstridiga utfall	Medelkostnaden överstiger 10 miljarder kronor per händelse och saknar särskild beläggning i riskbeskrivningen. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.
R-B10-090-02	Företagsspecifik data smyger in i det generiska typfallet	Kalibrerad kostnadsfördelning saknas eller har endast ett gränsvärde.
R-B30-G110-02	Övergången till Miljöprövningsmyndigheten kräver uppdaterad ärendeplanering	Frekvensens medelvärde överstiger 10 000 händelser per år; stöd för ärendevolymen behöver granskas.
R-B30-G110-03	Miljöprövningsdelegationens handläggningstid överskrider projektplanen	Modellens över 1 300 försenade MPD-ärenden per år överstiger beskrivningens totala ärendevolym på cirka 260–330. Jämförbar population och skillnaden mellan inflöde, avgjorda och pågående ärenden behöver klargöras.
R-B30-GO130-02	Omprövningar behöver hanteras enligt övergången till Miljöprövningsmyndigheten	Frekvensens medelvärde överstiger 10 000 händelser per år; stöd för ärendevolymen behöver granskas. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.

Risk	Händelse	Vad som saknas
R-B30-O100-02	Reformdriven omprövningsplikt träffar äldre tillstånd	Beskrivningens numeriska underlag avser vattenkraftens omprövning. Risken gäller reformdriven omprövningsplikt för miljöfarlig verksamhet, för vilken beskrivningen inte anger en tillämplig bindande ordning. Jämförbar händelsefrekvens saknas för denna riskpopulation. Frekvensens medelvärde överstiger 10 000 händelser per år; stöd för ärendevolymen behöver granskas.
R-B40-GE120-02	12:6-samrådet kan pågå längre än sexveckorsspärren	Frekvensens medelvärde överstiger 10 000 händelser per år; stöd för ärendevolymen behöver granskas. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.
R-B40-GN170-02	Underrättelse om 'ingen åtgärd' ger falsk trygghet	Risken ingår inte i körningens frysta urval. Kalibrerad kostnadsfördelning saknas eller har endast ett gränsvärde.
R-B40-N110-01	Anmälningsunderlaget underdimensioneras i tron att 'det är bara en anmälan'	Frekvensens medelvärde överstiger 10 000 händelser per år; stöd för ärendevolymen behöver granskas. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.
R-B50-E040-01	Koncessionsbeslutet överklagas – lång överprövning hos regering eller domstol	Medelkostnaden överstiger 10 miljarder kronor per händelse och saknar särskild beläggning i riskbeskrivningen.
R-B50-GN040-01	Kvarstående vetenskapligt tvivel leder till avslag	Medelkostnaden överstiger 10 miljarder kronor per händelse och saknar särskild beläggning i riskbeskrivningen. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.
R-B50-M020-01	Kungörelse och samråd med länsstyrelsen blir en konfliktarena	Medelkostnaden överstiger 10 miljarder kronor per händelse och saknar särskild beläggning i riskbeskrivningen. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.
R-B50-M020-02	Kompletteringsbehov fördröjer koncessionsärendets sakprövning	Medelkostnaden överstiger 10 miljarder kronor per händelse och saknar särskild beläggning i riskbeskrivningen.

Risk	Händelse	Vad som saknas
R-B50-M030-01	Hänskjutande till regeringen lägger till ett prövningsled med osäker tidsplan	Medelkostnaden överstiger 10 miljarder kronor per händelse och saknar särskild beläggning i riskbeskrivningen. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.
R-B50-M030-02	Koncessionsbeslut angrips genom överklagande eller rättsprövning	Medelkostnaden överstiger 10 miljarder kronor per händelse och saknar särskild beläggning i riskbeskrivningen.
R-B50-M040-01	Koncessionen räcker inte – miljötillståndet blir den verkliga flaskhalsen	Medelkostnaden överstiger 10 miljarder kronor per händelse och saknar särskild beläggning i riskbeskrivningen.
R-B50-M040-02	Natura 2000-tillståndet hänger inte ihop med koncessionens tidplan	Medelkostnaden överstiger 10 miljarder kronor per händelse och saknar särskild beläggning i riskbeskrivningen. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.
R-B50-N050-02	Undantagsvägen i 29 § är politisk och oförutsägbar	Medelkostnaden överstiger 10 miljarder kronor per händelse och saknar särskild beläggning i riskbeskrivningen. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.
R-B50-P040-02	Kompletteringsföreläggande flyttar tioveckorsfristens startpunkt	Frekvensens medelvärde överstiger 10 000 händelser per år; stöd för ärendevolymen behöver granskas.
R-B50-P050-03	Kompetens- och kapacitetsbrist i byggnadsnämnd förlänger tio-veckorsfristen	Frekvensens medelvärde överstiger 10 000 händelser per år; stöd för ärendevolymen behöver granskas. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.
R-B50-X040-01	Dispens- och skyddsbeslut överklagas och gaten skjuts upp	Frekvensens medelvärde överstiger 10 000 händelser per år; stöd för ärendevolymen behöver granskas.
R-B60-010-02	Aktörsbytet till Miljöprövningsmyndigheten skapar diarie- och behörighetsglapp	Frekvensens medelvärde överstiger 10 000 händelser per år; stöd för ärendevolymen behöver granskas. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.

Risk	Händelse	Vad som saknas
R-B60-030-01	MKB-brister stjälper fullständighetsbedömningen	Frekvensens medelvärde överstiger 10 000 händelser per år; stöd för ärendevolymen behöver granskas.
R-B60-030-02	Skiftande kravbild vid aktörsbyte skapar omprövning av underlaget	Frekvensens medelvärde överstiger 10 000 händelser per år; stöd för ärendevolymen behöver granskas. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.
R-B60-090-02	Många synpunkter kräver strukturerad kommunicering och bedömning	Frekvensens medelvärde överstiger 10 000 händelser per år; stöd för ärendevolymen behöver granskas.
R-B60-160-01	Regeringsprövningen är ett separat beslutssteg utan lagstadgad handläggningsfrist	Medelkostnaden överstiger 10 miljarder kronor per händelse och saknar särskild beläggning i riskbeskrivningen. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.
R-B60-160-03	Rättsprövning skapar fortsatt processrisk utan automatisk inhibition	Medelkostnaden överstiger 10 miljarder kronor per händelse och saknar särskild beläggning i riskbeskrivningen.
R-B60-250-03	Ny myndighetsmotpart saknar processvana i domstol	Frekvensens medelvärde överstiger 10 000 händelser per år; stöd för ärendevolymen behöver granskas.
R-B60-270-02	Prejudicerande avgörande flyttar rättsläget för hela branschen	Källtexten blandar antalet prejudicerande avgöranden med antalet berörda projekt och anger 1–10 per år utan entydig population. Modellens över 450 händelser per år kan inte förenas med denna beskrivningsram innan händelseenheten klargörs.
R-B60-G150-01	Sent förbehåll från regeringen kastar om hela beslutskedjan	Medelkostnaden överstiger 10 miljarder kronor per händelse och saknar särskild beläggning i riskbeskrivningen. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.
R-B60-G210-01	Ett överklagande startar en separat överprövningskedja	Frekvensens medelvärde överstiger 10 000 händelser per år; stöd för ärendevolymen behöver granskas. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.

Risk	Händelse	Vad som saknas
R-B60-G230-02	S1-reformen ändrar instanskartan mitt i processen	Absolut frekvens saknas eller har endast ett gränsvärde. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.
