SVENSKT NÄRINGSLIV

SVENSKT NÄRINGSLIV · ANALYSRAPPORT · OKTOBER 2026

Miljötillståndsrisker

Risker, kostnader och åtgärder för en mer förutsägbar miljöprövning

Svenskt Näringsliv analyserar miljötillståndsprocessens ekonomiska risker och föreslår en inriktning för myndigheternas förbättringsarbete. Rapporten förenar en kartläggning av 342 risker med bedömningar av åtgärders potential och erfarenheter från företagens prövningsärenden.

342 risker · 378 föreslagna motåtgärder · fem intervjukällor

17 kapitel och åtta bilagor om riskbild, åtgärder, genomförande och metod.

2026-10-22

Innehåll

01 Sammanfattning	3
02 Tillståndsprövningens betydelse för företagens investeringar	7
03 Den nya myndigheten och ansvaret för hela prövningskedjan	9
04 Riskernas kostnader och betydelse för prioriteringen	11
05 Var i processen riskerna får betydelse	19
06 Myndighetsrelaterade risker och möjligheten att påverka dem	24
07 Från oklart underlagsbehov till en användbar fullständighetsgranskning	27
08 Kompetens och kontinuitet genom handläggningen	29
09 Parallella beslut och den faktiska möjligheten att starta	31
10 Beslut, överklagande och vägen tillbaka efter återförvisning	33
11 Motåtgärdernas potential och vad en investering behöver pröva	35
12 Åtgärdspaket inom myndighetens rådighet	40
13 Hur resultaten bör vägas samman	44
14 Inriktning för prioritering och beredning	46
15 Uppföljning av genomförande, kostnader och resultat	50
16 Slutsatser	52
17 Referenser och källförteckning	54
A Metod och måttens betydelse	57
B Datakvalitet och källkritisk bedömning	59
C Intervjumetod och analysmatris	61
D Beräkning av kontrollernas bidrag	64
E Underlag, avgränsning och möjlighet till granskning	65
F Kostnadstopp 50	67
G Myndighetsåtgärder och ekonomiskt jämförelseunderlag	72
H Risker utan jämförbar årlig kostnadsindikator	75

Om rapporten

Svenskt Näringsliv analyserar risker i miljötillståndsprocessen och föreslagna åtgärder inom myndigheternas handlingsutrymme. Underlaget omfattar processkartor, riskbeskrivningar, modellskattningar och intervjuer. Bilagorna redovisar metod, källor, datakvalitet och registerutdrag.

ÖVERBLICK

01 Sammanfattning

Tillståndsprocessens betydelse för investeringar behöver bedömas från de första utredningarna till den tidpunkt då verksamheten faktiskt kan starta.

En miljöprövning behöver ge ett tillräckligt underlag för att bedöma en verksamhets påverkan och ställa de villkor som krävs. För ett företag ingår prövningen i en investeringsprocess där finansiering, markåtkomst, elanslutning, projektering och leveransavtal också behöver komma på plats. När ett avgörande besked förskjuts kan följden bli fortsatt kapitalbindning, senarelagd produktion och omarbete i flera delar av projektet. Förutsebarheten beror därför både på beslutens innehåll och på möjligheten att planera vägen fram till dem. Det är dessa samband mellan handläggning, projektförlopp och ekonomiska konsekvenser som står i centrum för rapporten. [REG, RES, MYN]

Svenskt Näringsliv redovisar här en analys av 342 risker i sju delprocesser och 378 föreslagna motåtgärder. Underlaget omfattar risk- och processbeskrivningar, modellbaserade bedömningar och fem intervjudokument med sex medverkande personer. Syftet är att identifiera ekonomiskt betydelsefulla störningar och ge en konkret inriktning för förbättringsarbetet, med särskild uppmärksamhet på myndigheternas handlingsutrymme. Analysen behandlar även risker som beror på företagens förberedelser eller andra beslutsorgan, eftersom projektets genomförande kan vara beroende av flera parallella processer. [REG, RES, MYN]

Tre återkommande förlopp framträder i materialet. Underlagsbehov kan förbli oklara långt in i ett ärende, kunskap kan gå förlorad när ansvar eller handläggare byts och ett projekt kan behöva invänta ett separat beslut trots att andra delar av prövningen är klara. Intervjuerna beskriver hur dessa situationer kan leda till kompletteringsarbete, missade undersökningssäsonger och osäkerhet om investeringens tidplan. De innehåller också erfarenheter av fungerande dialog, kunniga handläggare och tydliga besked. Förbättringsarbetet behöver därför undersöka vilka arbetssätt som gör informationen användbar genom hela ärendet och fram till möjlig start. [REG, RES, MYN, I03, I04, I05]

En årlig kostnadsindikator kan anges för 321 av riskerna. Den väger samman bedömt antal händelser per år i Sverige och bedömd kostnad per händelse i det berörda projektet. För 285 risker används modellmedianer för båda komponenterna; för 36 ingår en aritmetisk mittpunkt från ett uttryckligt bedömningsintervall i riskbeskrivningen. För 21 risker saknas en jämförbar indikator, men de ingår fortsatt i register och processanalys. Beloppen är underlag för prioritering och har inte fastställts genom observation av nationella årsförluster. Ursprunget

och måttets innebörd anges vid figurerna och utvecklas i metod- och källbilagorna. [REG, RES, MYN, SRC]

Figur 1. Kostnadsindikatorernas underlag



285 riskindikatorer bygger på modellmedianer för både frekvens och händelsekostnad; 36 kombinerar en modellmedian med en uttrycklig beskrivningsskattning. För 21 risker saknas jämförbar indikator. Historiska uppgifter ger kontext och rimlighetsstöd, men är inte direkta kostnadsobservationer i dessa indikatorer. · Källa: REG, RES, SRC

Ursprung och datum: Riskbedömning 2026-10-22 (RES) och källgranskning 2026-10-22 (SRC). Registerurval: REG.

Statistik och beräkning: Antal registerrisker efter kostnadsindikatorns ursprung: produkt av två modellmedianer, blandad produkt av modellmedian och beskrivningsmittpunkt, eller odefinierad indikator. Ingen riskindikator bygger direkt på observerad eller anpassad historisk förluststatistik.

De 50 högsta kostnadsindikatorerna är spridda genom hela beslutskedjan. Sektorsspåren omfattar 18 av dessa risker, vattenverksamhet tolv, prövning och överprövning sju, förutsättningar inför start fem, klassificering fyra, miljöbedömning tre och miljöfarlig verksamhet en. De högsta enskilda indikatorerna gäller handläggningstid i vattenmål, överprövning och markåtkomst för ledningsprojekt. Fördelningen visar betydelsen av att förstå vad som hindrar ett projekt från att gå vidare, även när hindret ligger utanför det ärende som för tillfället står i centrum. Den anger samtidigt vilka förlopp där jämförbara uppgifter om faktisk väntetid och ekonomisk förlust är särskilt värdefulla. [REG, RES, MYN, SRC]

Figur 2. Kostnadstopp 50 genom beslutskedjan



Antal risker hänförda till sin direkta delprocess. En process med fler registerposter har också fler möjliga risker att ingå i listan. Figuren visar rangordningens sammansättning, inte sannolikheten att en process störs. · Källa: REG, RES

Ursprung och datum: Registerutdrag för rapportutgåva 2026-10-22; risk- och processregister samt kontrollkopplingar (REG, MYN). Rangordning: Riskbedömning 2026-10-22 (RES) och källgranskning 2026-10-22 (SRC).

Statistik och beräkning: Antal unika risker i den källgranskade topp 50, grupperade efter direkt delprocess. Måttet är en registerräkning, inte sannolikheten att en process störs.

Myndighetsrelaterade förlopp har en tydlig plats i riskregistret. Av 342 risker har 118 klassificerats med ursprung i myndighet och prövning, och tolv av dessa återfinns i den källgranskade kostnadstoppen. De 20 särskilt framtagna myndighetsåtgärderna når tillsammans 90 risker. Sjutton förslag hör till underlagets huvudscenario för myndighetens uppdrag och når 78 risker, däribland åtta i topp 50. Det finns därmed ett konkret handlingsutrymme, men också viktiga risker som beror på andra aktörers beslut, företagens förberedelser eller ändrade yttre förutsättningar. Antalet kopplingar beskriver räckvidden och behöver läsas tillsammans med vad en åtgärd faktiskt kan förändra. [REG, RES, MYN, SRC]

Ingen av de föreslagna kontrollerna antas vara införd. Huvudscenariots 17 myndighetsåtgärder når 78 risker och kan jämföras ekonomiskt för 75 av dem. Den kombinerade beräkningen ger en minskning på 25,3 procent av dessa riskposters sammanlagda kostnadsindikatorer. Resultatet bygger på modellens relativa kontrolleffekter och förutsätter att de kan tillämpas på de angivna kostnadsgrunderna. Genomförandekostnader saknas, och flera risker kan beskriva delar av samma förlust. Den beräknade potentialen behöver därför föras vidare till avgränsade ärendekalkyler och praktisk prövning innan en samhällsekonomisk nettobesparing kan bedömas. [REG, RES, MYN, SRC]

Inom huvudscenariot ger juridisk och teknisk kvalitetssäkring av beslut, samlad fullständighetsgranskning, samordnad handläggning och aktiv tidsplanering de största fristående monetära bidragen. De motsvarar MPM-11, MPM-05, MPM-03 och MPM-07 i kontrollregistret. Bidragen är koncentrerade till ett fåtal riskförlopp, vilket ger en konkret inriktning för fortsatt beredning: prövningen behöver klarlägga hur respektive kontroll kan påverka just dessa händelser och vilka resurser arbetssättet kräver. Intervjuerna ger stöd för att samtidigt uppmärksamma säsongsberoende underlag och kontinuitet i ärendeakten, även där det redovisade kronbidraget är mindre. [REG, RES, MYN, SRC, I03, I04, I05]

Svenskt Näringsliv rekommenderar att de prioriterade åtgärderna bereds i avgränsade ärendeurval med tydligt ansvar, dokumenterade kontrollpunkter och uppföljning av både arbetsinsats och projektets fortsättning. Etableringen av Miljöprövningsmyndigheten ger ett tillfälle att utveckla gemensamma rutiner, samtidigt som kunskapen i pågående ärenden behöver säkras. Företagens erfarenheter bör bidra till att precisera när besked blir användbara, vilka sena omtag som kan förebyggas och var kostnader faktiskt uppkommer. Med ett sådant underlag kan förbättringsarbetet knyta organisatoriska förändringar till resultat som går att följa. [REG, RES, MYN, I03, I04, I05]

BAKGRUND OCH UPPDRAG

02 Tillståndsprövningens betydelse för företagens investeringar

Företagets planering berör flera beslut och aktörer. Förutsebarhet handlar om hur dessa delar fungerar tillsammans över tid.

Ett investeringsbeslut fattas ofta långt innan alla villkor för genomförandet är uppfyllda. Verksamhetsutövaren behöver bedöma om projektets framtida intäkter och andra nyttor motiverar de resurser som ska bindas, samtidigt som den tekniska utformningen och lokaliseringen kan behöva anpassas till prövningen. Miljökrav och motstående intressen behöver utredas med tillräcklig omsorg. För företaget blir det därför väsentligt att kunna skilja frågor som är avgjorda från frågor som fortfarande kan påverka projektet och att förstå vilket ytterligare arbete som behövs för ett beslut. [REG, I03, I04, I05]

När kraven kan preciseras tidigt går det att planera utredningar, beställa specialistinsatser och ordna arbetet i en rimlig följd. Om motsvarande behov framkommer sent kan redan framtaget material behöva revideras och andra delar av projektet avvakta. Skillnaden är särskilt betydelsefull när en undersökning endast kan göras under en viss säsong eller när ett beslut är en förutsättning för att söka ett annat. Då kan en begränsad förskjutning i ett enskilt steg ge en lång väntan för projektet som helhet. Det är denna typ av följder som riskkartläggningen försöker göra möjliga att undersöka systematiskt. [REG, I03, I04, I05]

Intervjumaterialet beskriver hur osäkerheten kan bestå även efter omfattande förberedelser. Företagsrepresentanter återkommer till behovet av tydliga besked om fullständighet, tillgång till handläggare med rätt kompetens och kontinuitet mellan samråd och fortsatt prövning. De beskriver också erfarenheter av fungerande dialog och kunniga handläggare, vilket ger viktiga jämförelsepunkter. Rapporten använder berättelserna för att förstå mekanismer och formulera frågor för förbättringsarbetet. Deras omfattning medger däremot ingen uppskattning av hur stor andel av Sveriges ärenden som följer ett visst förlopp. [REG, I03, I04, I05]

Riskerna påverkar företag olika. En större organisation kan ha egen juridisk och teknisk kompetens, erfarenhet av tidigare prövningar och möjlighet att arbeta vidare med andra delar av projektet under väntetiden. Ett företag med begränsade resurser kan behöva köpa motsvarande kompetens och få svårare att hantera upprepade omtag. Även kapitalbindningen varierar mellan projekt som befinner sig i tidig utveckling och projekt där kontrakt, utrustning eller byggorganisation redan finns på plats. Kostnadsbedömningarna behöver därför följas tillbaka till den händelse och den projektsituation som de avser. [REG, I03, I04, I05]

> En viktig framgångsfaktor är enligt intervjupersonen att etablera goda relationer med berörda remissinstanser och handläggande myndigheter. Erfarenheten är att tydlighet från företagets sida bidrar till ett mer konstruktivt samarbete och att myndigheterna då också anstränger sig mer för att driva processen framåt. Väl genomarbetade ansökningar och tydlig kommunikation kan därmed minska risken för missförstånd och onödiga kompletteringar.

Intervjukälla I04 · Intervjuanteckning, stycke 32 [I04-32]

Rapporten undersöker var ekonomiskt betydelsefulla störningar uppstår, hur de hänger samman med processernas utformning, vilka motåtgärder som kan påverka dem och hur genomförandet bör följas upp. Svenskt Näringslivs utgångspunkt är att en ändamålsenlig prövning behöver förena sakliga miljöbedömningar med besked och arbetssätt som går att använda i företagens planering. Kostnadsindikatorerna ger en gemensam jämförelsegrund, medan processkartor och riskbeskrivningar förklarar förloppen. Intervjuerna tillför erfarenheter av hur kraven och arbetssätten fungerar i konkreta ärenden. Tillsammans ger materialet en grund för att bereda förbättringar med tydliga frågor om effekt, ansvar och resursåtgång. [REG, I03, I04, I05, SRC]

En händelse avser att en risk inträffar i ett enskilt prövningsärende eller projekt. Frekvensen beskriver antal sådana händelser per år i Sverige, och konsekvensen beskriver kostnaden i det berörda projektet. En nationell frekvens kan därför inte läsas som sannolikheten för en viss sökande. Bedömningsramen omfattar bland annat försening, kapitalbindning, utredning och processarbete. Beloppen behöver granskas med avseende på vad som redan räknas i närliggande risker, eftersom flera beskrivningar kan fånga olika led i samma ekonomiska förlust. [REG, I03, I04, I05]

Den digitala delen gör det möjligt att gå från rapportens slutsatser till enskilda risker, deras orsaker och konsekvenser samt föreslagna kontroller. En läsare kan där undersöka en viss process, filtrera fram myndighetsdrivna åtgärder eller jämföra ett åtgärdsurval. Rapporten ger den löpande analysen och motiverar prioriteringarna, medan registret ger möjlighet att pröva dem mot detaljerna. Underlaget omfattar även risker som ligger utanför den nya myndighetens direkta rådighet, vilket är nödvändigt för att beskriva företagets hela beslutskedja. [REG, I03, I04, I05]

BAKGRUND OCH UPPDRAG

03 Den nya myndigheten och ansvaret för hela prövningskedjan

En organisatorisk förändring skapar möjligheter till gemensamma arbetssätt, men ansvarsfördelningen mellan prövningens aktörer behöver vara tydlig.

Miljöprövningsmyndigheten planeras starta den 1 juli 2027 och överta uppgifter från miljöprövningsdelegationerna. Kontoren ska finnas i Stockholm, Göteborg och Umeå. Reformen ger en organisatorisk bakgrund till analysen av likvärdig handläggning, tillgång till kompetens och gemensamma rutiner. Registret omfattar samtidigt fler beslut än dem som den nya myndigheten själv kommer att fatta. Företagens projekt kan även bero på domstolsprövning, vattenfrågor, plan- och byggbeslut och andra sektorsbeslut. Ett myndighetsövertagande ger därför inte i sig ett samlat ansvar för varje steg fram till byggstart. [RIX, LST]

För den praktiska utformningen blir det viktigt att skilja mellan vad organisationen kan besluta om, vad den kan samordna och vad den behöver informera om. Myndigheten kan exempelvis utveckla mottagning, egen handläggning, dokumentation och kvalitetssäkring inom sitt uppdrag. När ett annat beslutsorgan ansvarar för en fråga kan värdet i stället ligga i att identifiera beroendet, klargöra vilken information som behöver delas och skapa fungerande kontaktvägar. En överenskommelse om sådana gränssnitt behöver respektera respektive organs uppgifter och möjligheter att göra en självständig prövning. [MYN]

Intervjuerna ger stöd för att skilja likvärdiga arbetssätt från likadana utfall. Lokala miljöförhållanden, verksamhetens utformning och berörda intressen kan motivera olika krav i olika ärenden. Gemensamma rutiner kan ändå göra det tydligare hur behov identifieras, hur avgränsningar dokumenteras och hur en sökande får information om ärendets fortsättning. Om regional variation ska följas upp behöver jämförelsen därför ta hänsyn till ärendenas innehåll och till skälen för olika bedömningar. En enkel jämförelse av genomsnittliga handläggningstider kan annars ge en felaktig bild av variationens orsaker. [MYN, I01, I02]

Införandet innebär dessutom att kunskap behöver föras över mellan organisationer. Ett pågående ärende kan innehålla tidigare projektversioner, överenskomna kompletteringar, öppna sakfrågor och tidskritiska åtaganden som inte framgår av den senaste ansökningshandlingen. Om den mottagande organisationen får svårt att återskapa dessa förutsättningar kan både myndighet och sökande behöva göra om arbete. Överföringen bör

därför behandlas som en egen risk och följas med en kontroll av att dokumentation och ansvar faktiskt går att använda i fortsatt handläggning. [MYN, I01, I02]

Åtgärdsunderlaget delar in myndighetsförslagen i 17 åtgärder inom huvudscenariot, en särskild övergångsåtgärd och två förslag som förutsätter ett vidare framtida mandat. Rapporten följer denna indelning i både ekonomiska jämförelser och rekommendationer. Det gör det möjligt att arbeta vidare med det som ryms inom det beskrivna uppdraget, samtidigt som behov av bredare samordning kan beredas på rätt nivå. Klassningen innebär varken att förslagen redan är införda eller att varje tillämpningsfråga är rättsligt avgjord. [MYN, I01, I02]

RISKBILD

04 Riskernas kostnader och betydelse för prioriteringen

Höga kostnadsindikatorer återfinns i förlopp där väntan på ett beslut eller en rättighet begränsar projektets fortsättning.

Den ekonomiska jämförelsen avser ett läge utan införda motåtgärder. Varje risk beskrivs genom en årlig händelsefrekvens i Sverige och en kostnad för den enskilda händelsen i ett projekt. Deras produkt benämns årlig kostnadsindikator. Modellmedianer används där de ger en tillämplig bedömning av den definierade händelsen. För vissa komponenter används i stället en uttrycklig kostnads- eller frekvensram från riskbeskrivningen, representerad av intervallets aritmetiska mittpunkt. Valet och underlaget framgår per risk. Indikatorn används för att rikta uppmärksamheten mot ekonomiskt betydelsefulla förlopp; den är ingen observerad årskostnad, inget statistiskt årsmedelvärde och ingen median för årets faktiska förlust. [REG, RES, SRC]


Belopp och bedömda effekter i rapporten avser den avslutade risk- och kontrollbedömningen den 22 oktober 2026, svensk tid, med källgranskning samma datum. Av de 321 användbara kostnadsindikatorerna bygger 285 helt på modellmedianer och 36 på en modellmedian tillsammans med en aritmetisk mittpunkt från riskbeskrivningens bedömning. Beskrivningsuppgiften avser kostnaden per händelse i 35 fall och händelsefrekvensen i ett fall. Ingen av huvudindikatorerna bygger på ett direkt eller anpassat historiskt förlustbelopp. Historiska ärendeantal och handläggningstider redovisas med sina egna årtal och används för att pröva rimlighet och avgränsning. Antal risker, kontroller och kopplingar är räknade registerposter i rapportutgåvan och ska hållas åtskilda från verkliga händelser per år. [REG, RES, SRC, NUM]

Handläggningstiden i vattenmål har den högsta indikatorn, cirka 11,2 miljarder kronor per år. Därefter följer överprövningens handläggningstid med cirka 8,24 miljarder och försenad markåtkomst i ledningsprojekt med cirka 6,95 miljarder. Gemensamt är att projekten kan vara beroende av ett besked eller en rättighet som inte går att ersätta genom att arbeta vidare i ett annat spår. Kostnaden beror då på hur mycket kapital och andra resurser som är bundna, vilka aktiviteter som förskjuts och om en försening förändrar förutsättningarna för investeringen. De höga indikatorerna motiverar en närmare undersökning av dessa förlopp, med den ekonomiska följden avgränsad till det som kan hänföras till själva hindret. [REG, RES, SRC]

För vattenmålen ger Naturvårdsverkets statistik en historisk jämförelse av ärendevolym och tid. År 2024 fick 193 vattenmål ett första avgörande, med en medianhandläggningstid på 356 dagar. Bland 34 avgjorda överklagade vattenmål var den sammanlagda mediantiden 1 004 dagar, utan

Högsta domstolens handläggning. Statistiken anger inte hur många projekt som fick en kostsam försening. I indikatorn används en modellmedian om cirka 109 händelser per år, vilket ligger nära beskrivningens grova bedömningsram 50–100, och en kostnadspunkt om 102,5 miljoner kronor. Kostnadspunkten är mittpunkten i beskrivningens intervall 5–200 miljoner per händelse. Historiska avgöranden och bedömda projektförseningar är därmed olika uppgifter med olika funktion i analysen. [REG, RES, NV24, SRC]

Figur 3. Frekvens och händelsekostnad för de högst placerade riskerna

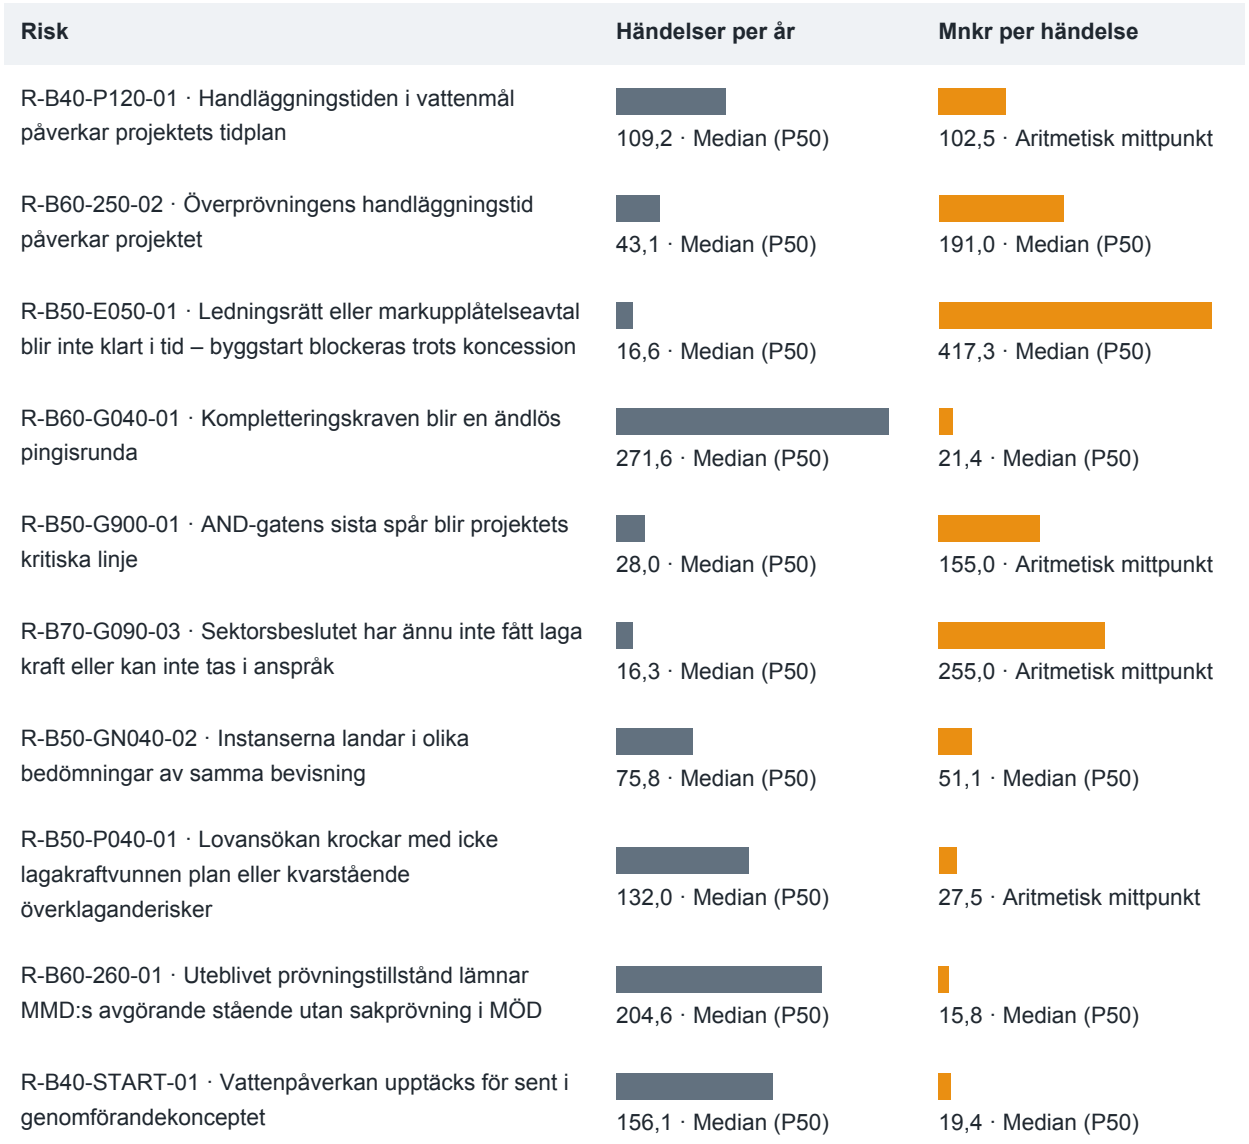

Separata linjära skalor för händelser per år och kostnad per händelse. Stapellängder mellan kolumnerna är inte jämförbara.

De tio högsta kostnadsindikatorerna delas upp i de komponenter som används i beräkningen. Händelser per år och miljoner kronor per händelse har separata skalor. Modellmedian och beskrivningsmittpunkt markeras vid respektive värde. · Källa: REG, RES, SRC

Ursprung och datum: Riskbedömning 2026-10-22 (RES) och källgranskning 2026-10-22 (SRC).

Statistik och beräkning: De två använda komponenterna visas separat: händelser per år och miljoner kronor per händelse. Varje kolumn har egen linjär skala. Komponentens typ anges vid värdet; deras produkt ger kostnadsindikatorn, inte medianen av verklig årsförlust.

För överprövningens handläggningstid används en frekvensmedian på cirka 43 händelser per år och en median för bedömd händelsekostnad på cirka 191 miljoner kronor. Produkten ger indikatorn 8,24 miljarder. Naturvårdsverket redovisar 58 överklagade tillståndsmål med ursprung hos miljöprövningsdelegation som avgjordes 2024, med en totalmedian på 834 dagar. Denna tid avser prövningskedjan och kan inte utan ytterligare underlag fördelas på överprövningens tillkommande väntan. De ekonomiska modellvärdena är därför inte bekräftade av denna historik. En relevant fortsatt undersökning behöver följa när projektet annars skulle ha kunnat genomföras och vilka kostnader som uppkom just under väntan på överprövningen. [REG, RES, NV24, SRC]

Figur 4. De tio högsta källgranskade kostnadsindikatorerna



Miljoner kronor per risk och år utan införda kontroller. Varje indikator är produkten av de angivna frekvens- och kostnadspunkterna; modellmedianer och beskrivningsmittpunkter framgår i figuren. Riskerna kan överlappa ekonomiskt och staplarna ska inte summeras till en nationell kostnad. · Källa: REG, RES

Ursprung och datum: Riskbedömning 2026-10-22 (RES) och källgranskning 2026-10-22 (SRC).

Statistik och beräkning: Årlig kostnadsindikator = använd händelsefrekvens × använd kostnad per händelse. Jämförbara beskrivningsintervall representeras av aritmetisk mittpunkt; övriga användbara komponenter är modellmedianer. Ingen

observerad årsförlust eller statistisk årsmedian. I det visade urvalet bygger 6 riskposter enbart på modellmedianer och 4 på modellvärden tillsammans med beskrivningsskattningar. 0 bygger på anpassade historiska belopp.

Tabellen sammanfattar den historiska jämförelsen för de tio högst placerade riskerna. Uppgifterna kan ge stöd för att ett förlopp förekommer utan att bestämma dess nationella frekvens eller ekonomiska konsekvens. För varje risk framgår därför både den använda kostnadsgrunden och vad den historiska källan faktiskt beskriver. Detta gör det möjligt att skilja en väl dokumenterad handläggningstid från en bedömning av förseningskostnad och att rikta datainsamlingen mot den uppgift som saknas. Samtliga risker i kostnadstopp 50 ingår i den individuella källgranskningen. [REG, RES, SRC]

Tabell 1. Rimlighetsbedömning av de tio högst placerade riskerna

Rang och risk	Indikator, mdkr/år	Historiskt stöd och granskningsbeslut
1. R-B40-P120-01	11,19 · modellmedian × källintervallens mittpunkt	193 första avgöranden och 356 dagars mediantid 2024 ger historisk kontext. Antalet kostsamma projektförseningar mäts inte. Kostnadspunkten 102,5 mnkr är mittpunkten i beskrivningens intervall 5–200 mnkr.
2. R-B60-250-02	8,24 · modellmedian × modellmedian	58 överklagade MPD-mål hade 834 dagars totalmedian 2024. Tiden gäller hela kedjan och belägger ingen viss merkostnad. Kostnaden är modellmedian, med behov av jämförbara historiska förluster.
3. R-B50-E050-01	6,95 · modellmedian × modellmedian	Modellmedianerna cirka 17 ledningsprojekt och 417 mnkr per händelse ryms i beskrivningens breda storleksordningar. Uppgiften om 800 markupplåtelseavtal gäller avtal, inte försenade projekt. Representativ kostnadshistorik saknas.
4. R-B60-G040-01	5,81 · modellmedian × modellmedian	LTU:s studie visar många ofullständiga MPD-ansökningar och längre handläggning, men mäter inte upprepade kompletteringsrundor i alla instanser. Cirka 272 händelser och 21,4 mnkr är modellmedianer vars nationella kostnadsgrund behöver beläggas.
5. R-B50-G900-01	4,35 · modellmedian × källintervallens mittpunkt	Cirka 28 händelser ligger inom beskrivningens bedömning 20–50. Kostnaden 155 mnkr är mittpunkten i intervallet 10–300 mnkr. Fallen beskriver mekanismen, men ger ingen nationell förluststatistik; överlapp med det enskilda delbeslutet återstår.
6. R-B70-G090-03	4,14 · modellmedian × källintervallens mittpunkt	Beskrivningen anger ett tiotal ärenden och 10–500 mnkr per händelse. Modellfrekvensen är cirka 16 och kostnadspunkten 255 mnkr, intervallets mittpunkt. Verifierad nationell fördelning av väntetider och förluster saknas.
7. R-B50-GN040-02	3,88 · modellmedian × modellmedian	Modellfrekvensen cirka 76 ligger inom beskrivningens 30–100. Kostnadsmedianen 51,1 mnkr ligger nära den avrundade ramen 2–50 mnkr. Historiska överklagandeandelar mäter inte ändrad bevisvärdering eller den tillkommande kostnaden.

Rang och risk	Indikator, mdkr/år	Historiskt stöd och granskningsbeslut
8. R-B50-P040-01	3,63 · modellmedian × källintervallens mittpunkt	Boverkets 261 överklagade planer 2023 mäter inte försenade byggstarter. Modellfrekvensen cirka 132 ligger inom beskrivningens 50–150. Kostnadspunkten 27,5 mnkr är mittpunkten i beskrivningens intervall 5–50 mnkr.
9. R-B60-260-01	3,24 · modellmedian × modellmedian	Modellmedianerna cirka 205 händelser och 15,8 mnkr ryms i beskrivningens uppskattningar. Tunadalfallet avgränsar ingen kostnad enbart för väntan på prövningstillstånd. Sådan historik och granskning av ekonomiskt överlapp behövs.
10. R-B40-START-01	3,03 · modellmedian × modellmedian	Modellfrekvensen cirka 156 ligger nära den avrundade ramen 50–150 och kostnadsmedianen 19,4 mnkr inom 1–20 mnkr. Outnyttjade bidrag är inte projektförluster. Historik över sena upptäckter och deras särskilda merkostnad saknas.

Ursprung och beräkning: Indikatorer från riskbedömningen och källgranskningen 2026-10-22. Historiska antal och tider har de årtal som anges i tabellen. Historiken är jämförelseunderlag; den ska inte uppfattas som ursprunget till ett kostnadsbelopp när beloppet bygger på modellmedian eller beskrivningsmittpunkt. [REG, RES, SRC, NV24, BOV23, LTU26]


De två komponenterna ger också olika ingångar till förbättringsarbetet. En hög händelsefrekvens kan tala för ett gemensamt arbetssätt som når många ärenden, medan en hög kostnad per händelse kan motivera en riktad insats i en mindre grupp stora projekt. Kostnadsindikatorn sammanför dessa perspektiv, men döljer inte behovet att förstå hur de uppkommer. För återkommande kompletteringsproblem kan nyttan ligga i att undvika många mindre omtag. För markåtkomst eller ett sista nödvändigt sektorsbeslut kan effekten i ett enskilt projekt vara avgörande. Det är därför relevant att studera både komponenterna och deras produkt, som visas i figurerna och på riskernas detaljsidor. [REG, RES, SRC]

Historiska exempel behöver läsas med sina ekonomiska och tidsmässiga avgränsningar. Ett investeringsbeslut visar resurser som avses bindas i ett projekt, men fastställer ingen förlust vid en försening. En total handläggningstid kan omfatta nödvändig utredning och flera instanser, medan riskens kostnad avser en särskild tillkommande väntan. Kostnadsramar i beskrivningarna används därför som bedömningar av det aktuella förloppet och hålls åtskilda från observerade antal och tider. I den ekonomiska analysen behöver dessutom en förseningsperiod fördelas mellan berörda risker, så att samma kapitalbindning eller produktionsbortfall inte ges full vikt i flera poster. [REG, RES, SRC]

För 21 risker saknas en tillämplig huvudindikator. I vissa fall gäller osäkerheten händelsepopulationen, i andra fall saknas kostnadsavgränsning eller en tidsperiod som behövs för beräkningen. En nätkoncessionsrisk anger exempelvis kostnad per förseningsår utan att den

relevanta förseningslängden är bestämd. En annan risk blandar försvarsrelaterade avslag för olika vindkraftsprojekt med skilda ekonomiska förutsättningar. Dessa risker kan vara viktiga även när de inte kan placeras i en kostnadslista. Deras beskrivningar, processkopplingar och möjliga motåtgärder ingår därför i analysen, medan belopp och förklaringar till kunskapsluckorna redovisas separat. [REG, RES, SRC]

Figur 5. Kostnadsramar som återfinns i riskbeskrivningarna

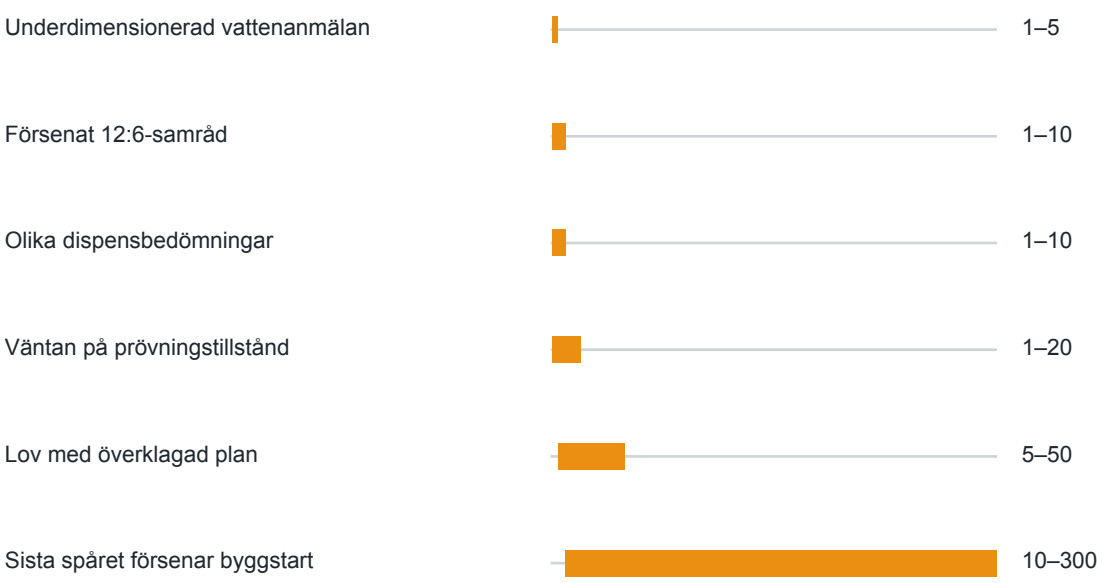

mnkr per händelse. Linjär skala 0–300.

Exempel på typiska kostnadsintervall per händelse, i miljoner kronor. Uppgifterna är beskrivningarnas egna uppskattningar och har ingen angiven statistisk konfidensnivå. · Källa: REG, RES

Ursprung och datum: Riskbeskrivningar i det frysta bedömningsunderlaget; återvunna och granskade 2026-10-22 (REG, RES).

Statistik och beräkning: Uttryckliga uppskattade typiska intervall för kostnad per händelse. Intervallgränserna återges direkt; de är inte observerade min/max, medianer eller konfidensintervall.

Kostnadsperspektivet behöver kombineras med frekvens, processläge och möjlighet att påverka förloppet. En ofta återkommande risk kan motivera en gemensam rutin även när kostnaden per händelse är begränsad. En sällsynt risk kan kräva en särskild hantering om följderna är stora och åtgärden är möjlig att sätta in i tid. Den källgranskade kostnadsindikatorn hjälper till att välja vilka förlopp som behöver närmare ekonomisk analys, medan processkartorna, kontrollkopplingarna och intervjuerna visar vilka insatser som kan vara relevanta. För de högsta beloppen bör nästa steg vara att följa verkliga projekt och skilja tillkommande väntan från den tid som krävs för en saklig prövning. [REG, RES, SRC, I03, I04, I05]

RISKBILD


05 Var i processen riskerna får betydelse

Processkartorna gör det möjligt att följa hur ett tidigt vägval påverkar senare underlag, beslut och förutsättningar för start.

De sju delprocesserna beskriver olika delar av ett projekts väg genom prövningen. De ska läsas som en struktur för analysen och behöver anpassas till det enskilda projektets rättsliga väg. Alla verksamheter passerar inte samtliga noder, och vissa spår löper parallellt. Varje risk har därför en direkt processkoppling som används när antalen redovisas. Uttryckliga följdrelationer kan också undersökas i processvyn, men de har inte gjorts om till en beräknad sannolikhet för att en störning sprids. [REG, RES, MYN]

Figur 6. Myndighetsåtgärdernas täckning per delprocess

Grå: Alla risker i delprocessen. Orange: Åtgärd inom underlagets huvudscenario. risker.

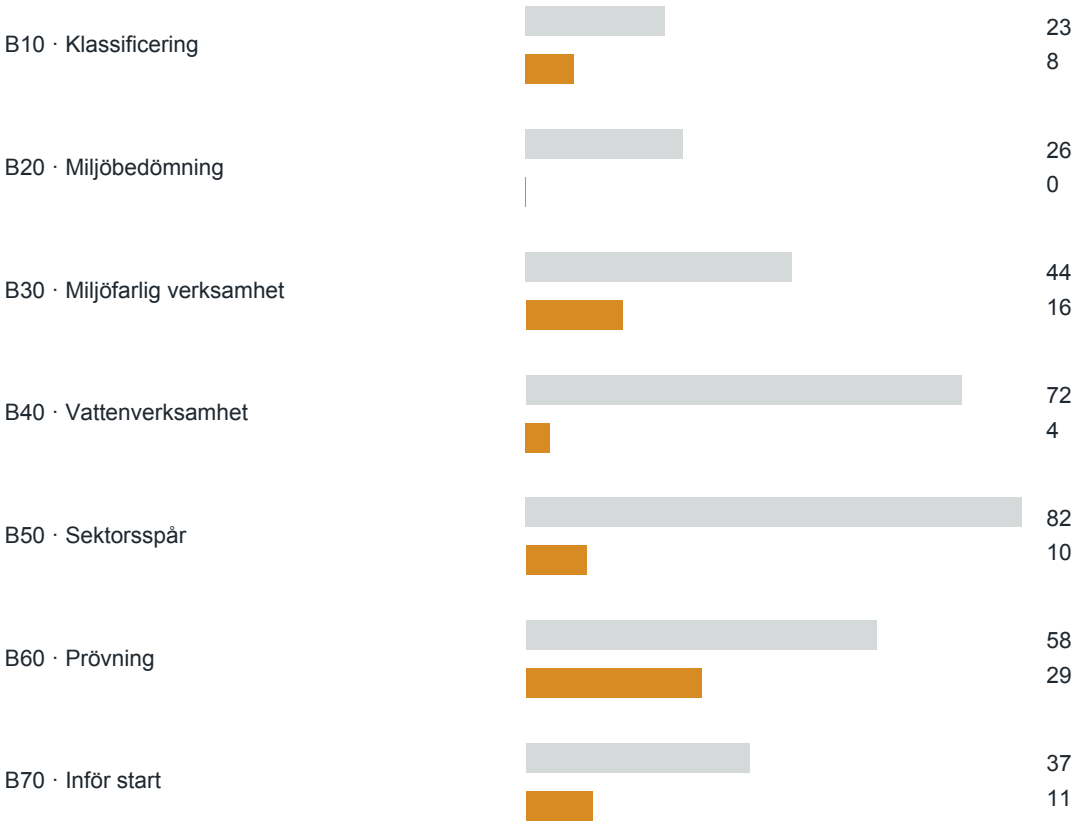

Grå stapel visar alla risker i processen. Orange stapel visar risker med minst en koppling till de 17 åtgärderna i huvudscenariot. Antalen anger dokumenterade samband och säger inget om hur stor effekten blir. · Källa: REG, RES

Ursprung och datum: Registerutdrag för rapportutgåva 2026-10-22; risk- och processregister samt kontrollkopplingar (REG, MYN).

Statistik och beräkning: Antal unika risker i varje delprocess och antal med minst en dokumenterad koppling till huvudscenariots 17 myndighetsåtgärder. Ingen modellerad effekt ingår i antalen.

Den inledande klassificeringen, B10, påverkar vilka prövningar som behöver göras och vilket underlag som ska tas fram. Ett felaktigt vägval kan få följder långt senare, när tid och resurser redan lagts på en ansökan. De föreslagna myndighetsåtgärderna om dokumenterad processvägledning och tidig kontroll av behörighet och prövningsram, MPM-01 och MPM-02, är relevanta i denna del. Deras värde ligger i att frågor om ansvar och avgränsning kan behandlas innan de får konsekvenser för flera andra arbetsmoment. Vägledningen behöver samtidigt ange vilka bedömningar som är preliminära och vilka förutsättningar de bygger på. [REG, RES, MYN]

Miljöbedömningen, B20, innehåller bland annat frågor om avgränsning och underlag. Här kan projektets tekniska utveckling och behovet av naturvetenskapliga undersökningar ha olika tidplaner. Om en inventering förutsätter en viss årstid får tidpunkten för besked om behovet


särskild betydelse. Tre av processens risker finns i den källgranskade kostnadstoppen, men ingen har en direkt koppling till de 17 myndighetsåtgärderna i huvudscenariot. Det betyder att ansvar och tillämpliga åtgärder i denna del behöver undersökas särskilt; de bredare förslagen om framtida mandat bör hållas åtskilda från vad som kan göras inom huvudscenariot. [REG, RES, MYN, SRC]

Prövningen av miljöfarlig verksamhet, B30, har tydliga samband med frågor om fullständighet, handläggning och beslut. Sexton av processens 44 risker nås av myndighetsåtgärderna i huvudscenariot. Det ger en konkret grund för att arbeta med samlad granskning, planering och en spårbar ärendeakt, men täckningen innebär inte att alla bakomliggande problem därmed är lösta. Företagets underlag, projektändringar och behov av teknisk kompetens påverkar fortfarande förloppet. Uppföljningen behöver därför visa både vilka arbetssätt myndigheten använder och vilka förutsättningar som råder i ärendet. [REG, RES, MYN]

Vattenverksamhet, B40, omfattar 72 risker och är den näst största delen av registret. Tolv risker finns i den källgranskade kostnadstoppen, medan fyra av processens risker har en koppling till myndighetsåtgärderna i huvudscenariot. Skillnaden mellan omfattande riskbild och begränsad åtgärdstäckning är relevant för Svenskt Näringslivs fortsatta arbete. Den talar för att förbättringsfrågorna också behöver tas till andra berörda aktörer och att åtgärderna bör avgränsas efter ärendetyp. När kostnaden beror på en tidsförskjutning behöver analysen skilja den nödvändiga utredningens omfattning från merkostnaden av att behovet eller ansvaret klargörs sent. [REG, RES, MYN, SRC]

Sektorsspåren, B50, innehåller 82 risker och 18 av de 50 högst placerade i den källgranskade kostnadsjämförelsen. De omfattar flera slags beslut och rättigheter som kan ha betydelse för ett och samma projekt. Den stora mängden riskposter speglar delvis processens bredd och ska därför inte tolkas som en observerad andel misslyckade ärenden. För prioriteringen är de dokumenterade beroendena centrala. Om ett nödvändigt sektorsbeslut blir klart senare än miljöprövningen kan projektets genomförande ändå behöva vänta. En tillståndsmatris och överenskomna gränssnitt kan ge bättre framförhållning om de används för att följa faktiska beslut, ansvariga och återstående frågor. [REG, RES, MYN, SRC]

Figur 7. Kostnadsindikatorernas fördelning mellan delprocesser

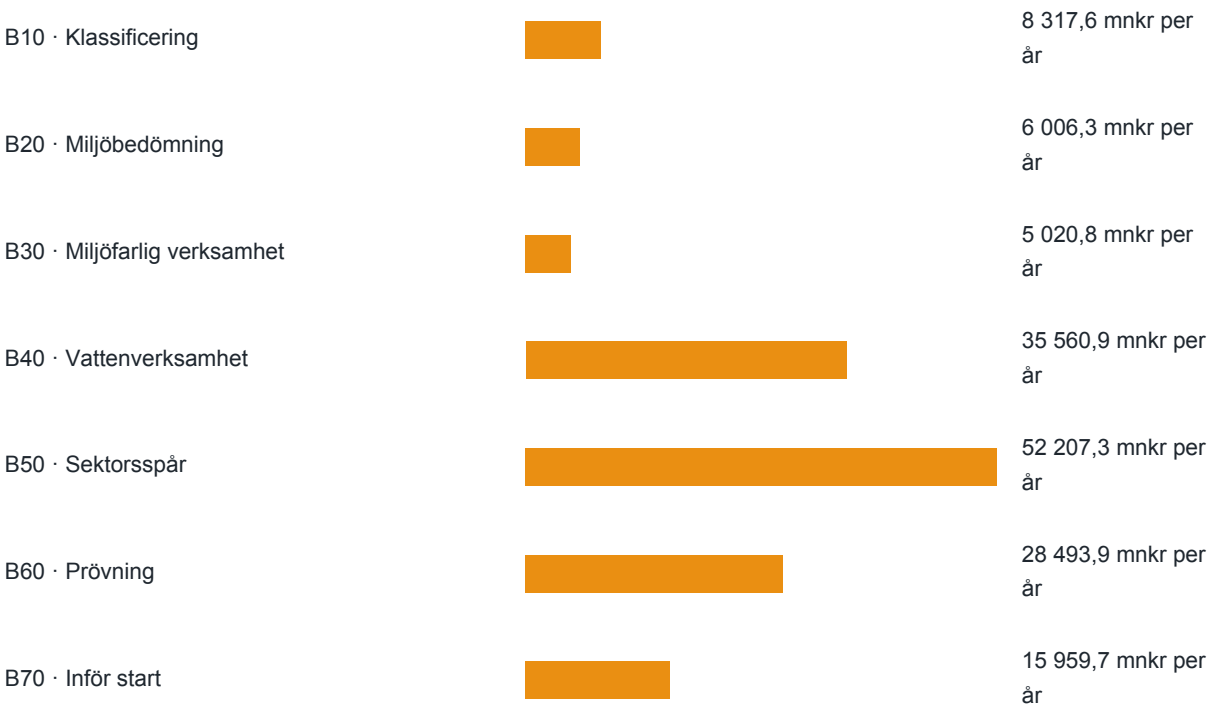

Summa av de användbara källgranskade indikatorerna inom varje delprocess, miljoner kronor per år. Staplarna beskriver separata riskposter med möjlig ekonomisk överlappning och ska inte tolkas som oberoende förluster eller en nationell totalkostnad. · Källa: REG, RES, SRC

Ursprung och datum: Riskbedömning 2026-10-22 (RES) och källgranskning 2026-10-22 (SRC). Processkopplingar: REG.

Statistik och beräkning: Årlig kostnadsindikator = använd händelsefrekvens × använd kostnad per händelse. Jämförbara beskrivningsintervall representeras av aritmetisk mittpunkt; övriga användbara komponenter är modellmedianer. Ingen observerad årsförlust eller statistisk årsmedian. Staplarna summerar separata riskposter per direkt delprocess; ekonomiskt överlapp är inte avräknat. I det visade urvalet bygger 285 riskposter enbart på modellmedianer och 36 på modellvärden tillsammans med beskrivningsskattningar. 0 bygger på anpassade historiska belopp.

Prövning och överprövning, B60, har 58 risker, varav 36 klassificerats med ursprung i myndighet och prövning. Här finns sju risker i den källgranskade kostnadstoppen och 29 risker som nås av myndighetsåtgärderna i huvudscenariot. Det är därmed en central del för analysen av remisshantering, beslutens kvalitet och vad som händer efter ett överklagande eller en återförvisning. En formell brist kan få en omfattande ekonomisk följd om den innebär att handläggning måste tas om. Vilken insats som bör prioriteras behöver dock också stödjas av återkommande ärendeproblem, praktisk rådighet och en granskning av de riskvärden som bär kalkylen. [REG, RES, MYN, SRC]

Inför start, B70, samlas beroenden som återstår när projektet kommit långt. Fem av processens 37 risker ligger i den källgranskade kostnadstoppen. Det kan handla om beslut som ännu inte fått laga kraft, ekonomisk säkerhet eller andra godkännanden som krävs innan verksamheten kan börja. En uppföljning som stannar vid dagen för miljötillståndet kan missa dessa förlopp. För företaget behöver planeringen därför även visa vilket villkor som sist håller tillbaka start och

vilka andra aktiviteter som påverkas av väntan. Myndighetens rådighet kan vara begränsad till vissa delar, men tydlig information om återstående beroenden kan ändå förbättra planeringen. [REG, RES, MYN, SRC]

Tabell 2. Riskbild genom de sju delprocesserna

Delprocess	Risker	Årsindikator finns	I kostnadstopp 50
B10	23	21	4
B20	26	25	3
B30	44	42	1
B40	72	69	12
B50	82	76	18
B60	58	51	7
B70	37	37	5

Ursprung och beräkning: Registerräkning i utgåvan 2026-10-22. Risker räknas efter direkt processkoppling; kostnadstopp 50 följer den källgranskade rangordningen samma datum. Antalen är registerposter och anger ingen frekvens eller sannolikhet för verkliga störningar. [REG, RES, SRC, NUM]

RISKBILD

06 Myndighetsrelaterade risker och möjligheten att påverka dem

Riskens ursprung och åtgärdens ansvar behöver hållas isär när ett förbättringsarbete avgränsas.

Av registrets 342 risker har 118 sitt angivna ursprung i myndighet och prövning, 145 i sökande och ansökan samt 79 i externa förhållanden. Klassningen anger var det beskrivna problemet huvudsakligen uppstår. Den är inte en bedömning av juridiskt ansvar och behöver heller inte sammanfalla med vem som bäst kan förebygga följderna. En brist i ansökan kan exempelvis fångas upp genom en tydlig myndighetsgranskning, medan företaget kan begränsa följderna av en lång handläggning genom bättre planering av beroende aktiviteter. [REG, MYN]

Bland de 118 myndighetsrelaterade riskerna avser 45 kapacitet och handläggning, 26 rättslig osäkerhet och 16 överklagande. Dessa kategorier ger en inriktning för fortsatt analys. Kapacitetsfrågorna berör tillgång till tid och kompetens, medan rättslig osäkerhet kan kräva klargöranden, dokumenterade bedömningar och fungerande former för att hantera förändringar. Överklaganderiskerna behöver i sin tur delas upp mellan sådant som kan förebyggas genom ett väl berett beslut och sådant som hör till en självständig överprövning. Alla dessa frågor kan påverka tidsåtgång, men de kräver olika typer av åtgärder. [REG, MYN, SRC]

Figur 8. Riskernas ursprung och myndighetsåtgärdernas räckvidd

Grå: Alla risker. Orange: Med myndighetsåtgärd. risker.



Alla 20 myndighetsåtgärder ingår i den orange stapeln, inklusive organisationsövergång och framtida mandat. Riskernas ursprung beskriver förloppet och innebär ingen ansvarsprövning. · Källa: REG, RES

Ursprung och datum: Registerutdrag för rapportutgåva 2026-10-22; risk- och processregister samt kontrollkopplingar (REG, MYN).

Statistik och beräkning: Antal unika risker per ursprungskategori; åtgärdstäckning räknas för alla 20 myndighetsåtgärder inklusive övergång och framtida mandat. Kopplingarna anger räckvidd, inte uppmätt riskreduktion.

De 20 myndighetsåtgärderna har kopplingar till 57 av de 118 myndighetsrelaterade riskerna. De når också 23 risker med ursprung hos sökanden och tio externa risker. Det visar hur arbetssätt på myndighetssidan kan minska sårbarheten i ett förlopp även när myndigheten inte orsakar den ursprungliga störningen. En spårbar ärendeakt kan exempelvis underlätta hanteringen av en projektändring, och en tydlig prövningsram kan göra det lättare för sökanden att ta fram rätt material. För att bedöma nyttan behöver analysen därför följa den konkreta orsaken och den föreslagna kontrollens placering i riskförloppet. [REG, MYN]

Drygt hälften av de myndighetsrelaterade riskerna saknar samtidigt koppling till någon av de särskilt framtagna myndighetsåtgärderna. Detta är en lucka i åtgärdsunderlaget som bör granskas, men den visar inte automatiskt att en ny rutin behövs för varje risk. Vissa frågor kan ligga utanför myndighetens mandat, andra kan hanteras genom kontroller som ännu inte klassificerats som myndighetsdrivna. Ett lämpligt nästa steg är att gå igenom de oadresserade riskerna utifrån deras kostnad, processläge och återkommande orsaker, så att fler risker kan hanteras med ett genomtänkt arbetssätt där det är möjligt. [REG, MYN]

De 17 åtgärderna i huvudscenariot har 133 riktade kopplingar till orsaker och åtta till konsekvenser i riskernas bow ties. Tyngdpunkten ligger därmed på att förebygga problem genom vägledning, beredning, planering och beslutsarbete. Sambandskartan kan användas för att se när flera risker delar en orsak eller berörs av samma kontroll. En gemensam orsak är dock inte samma sak som ett uppmätt statistiskt beroende. För att använda sambandet i en

ekonomisk totalberäkning behövs en tydligare beskrivning av vilka händelser och kostnader som faktiskt sammanfaller. [REG, MYN]

ANALYS AV RISKFÖRLOPPEN

07 Från oklart underlagsbehov till en användbar fullständighetsgranskning

Tydliga besked om underlaget påverkar både handläggningen och företagets möjligheter att planera arbetet.

En ansökans fullständighet har betydelse både för myndighetens möjlighet att pröva ärendet och för företagets möjlighet att planera sitt projekt. Intervjukälla I03 beskriver ett ärende där företaget under lång tid saknade besked om underlaget var komplett. Den tidsuppgift som företaget hade fått förutsatte ett fullständigt underlag, medan väntan på själva fullständighetsbedömningen uppfattades ligga utanför prognosen. För den som behöver planera finansiering, bemanning och byggstart blir denna avgränsning svår att använda om det samtidigt är oklart vad som återstår innan tidsuppgiften börjar gälla. Erfarenheten talar för att myndighetens återkoppling bör omfatta både återstående underlagsbehov och den fortsatta handläggningens förutsättningar. Ärendehistoriken återges från intervjun och har inte kontrollerats mot en myndighetsakt. [I03]

> Myndigheten har satt upp en KPI för en del av sin process men det säger inte mig någonting om slutprodukten som kund.

Intervjukälla I03 · Intervjuanteckning, stycke 13 [I03-13]

I04 riktar uppmärksamheten mot kompletteringskravens innehåll och mot kompetensen hos dem som ska formulera och besvara dem. Enligt intervjuanteckningen kan begränsad sakkunskap leda till fler frågor, samtidigt som företagets egen erfarenhet påverkar möjligheten att bedöma vad som efterfrågas och hur kraven bör hanteras. Samspelet ger en möjlig förklaring till att företag beskriver samma slags processsteg på olika sätt. En erfaren sökande kan ha lättare att avgränsa en oklar fråga, medan ett företag med mindre egen tillståndskompetens kan behöva beställa ytterligare utredning innan frågans betydelse har klarlagts. Intervjun ger stöd för att undersöka detta förlopp närmare, men anger ingen representativ andel omotiverade kompletteringar. [I04]

Tidsföljden får särskild betydelse när underlaget bygger på undersökningar som bara kan genomföras under en viss del av året. I05 beskriver sent tillkommande inventeringsbehov där ett passerat undersökningsfönster innebär att projektet behöver invänta nästa lämpliga säsong.

Följderna kan då omfatta fortsatt kapitalbindning, omplanering och förskjutningar av aktiviteter som redan har förberetts. Sambandet mellan utredningskostnad och ekonomisk konsekvens blir därför svagt: en begränsad undersökning kan få stor betydelse för projektets tidsåtgång om behovet identifieras sent. Tidig bedömning av säsongsberoende underlag bör mot denna bakgrund vara en uttrycklig del av den första genomgången av ärendet. [I05]

Åtgärdsförslagen tar fasta på dessa förlopp genom samlad och preciserad fullständighetsgranskning, MPM-05, och tidig identifiering av säsongsberoende underlagsbehov, MPM-06. Myndighetens arbete behöver här möta sökandens egen kontroll av ansökningsunderlaget, C-SHARED-underlagskontroll, så att oklarheter kan redas ut innan de förskjuter senare steg. En användbar gemensam dokumentation bör ange vilken fråga som behöver besvaras, dess relevans för prövningen, vem som ansvarar för nästa åtgärd och när underlaget kan tas fram. När dessa uppgifter följer ärendet blir det lättare att förstå varför en komplettering begärs och att avgöra om en återkommande fråga har ändrats eller redan behandlats. [MYN, REG]

Utformningen behöver samtidigt ge utrymme för kompletteringar som motiveras av nya sakförhållanden eller av att projektet ändras. Ett ensidigt mål om färre kompletteringskrav riskerar att premiera tidiga besked som underlaget inte bär. Uppföljningen bör i stället skilja mellan olika orsaker till att mer information behövs och uppmärksamma de behov som hade kunnat identifieras tidigare. Därmed kan myndigheten undersöka om arbetssättet begränsar onödiga omtag utan att försämra utredningen av frågor som är väsentliga för beslutet. För företagens del är det också relevant att följa om kraven blir tydligare och lättare att omsätta i ett avgränsat utredningsuppdrag.

Den samlade granskningen bör mynna ut i ett besked som ger stöd för det fortsatta arbetet. Av beskedet behöver framgå vilka frågor som fortfarande är öppna, vilken precision som krävs i svaren och hur underlagsarbetet förhåller sig till den övriga handläggningen. Vissa moment kan kanske fortsätta medan en inventering inväntas, medan andra behöver avvakta resultatet. När ett senare kompletteringsbehov uppstår bör skälet dokumenteras i samma ärendebild, så att både myndigheten och sökanden kan följa vad som har ändrats. Denna dokumentation ger också möjlighet att i efterhand bedöma om en rutin har minskat omarbete eller huvudsakligen flyttat arbetsinsatsen mellan olika skeden. [MYN]

Mätningen ger ett positivt samlat bidrag för fullständighetsgranskning, MPM-05, inom de sju av åtta kopplade risker som har ett användbart årligt kostnadsunderlag. Om åtgärden införs ensam minskar summan av dessa riskposters indikatorer med omkring 16 procent. Samtidigt har en av de åtta riskerna ett negativt modellbidrag och en saknar jämförbar kostnadsindikator. Resultatet motiverar fortsatt beredning av åtgärden med särskild uppmärksamhet på hur kompletteringsarbetet förändras i praktiken. En sådan beredning behöver precisera vilka besked myndigheten kan ge, vad som förväntas av sökanden och hur skilda uppfattningar om

underlagets fullständighet ska hanteras. Den bedömda potentialen kan därefter prövas mot dokumenterade ärendeförlopp och kostnaden för att införa arbetssättet. [RES, MYN, SRC]

ANALYS AV RISKFÖRLOPPEN

08 Kompetens och kontinuitet genom handläggningen

Tillgänglig kapacitet, sakkunskap och dokumentation påverkar olika delar av samma ärendeförlopp.

Intervjuerna visar att företagens erfarenheter varierar mellan regioner, ärenden och handläggare. I02, I03 och I04 beskriver skillnader i tidsåtgång, återkoppling och vilka frågor som behöver besvaras. I03 återger även ett annat ärende där återkopplingen upplevdes som tydlig och handläggningen som kompetent. Att samma respondent beskriver både fungerande och svåra förlopp ger anledning att undersöka vilka arbetsformer och förutsättningar som bidrar till skillnaderna. Intervjumaterialet gör det dock inte möjligt att fördela deras betydelse mellan bemanning, ärendets komplexitet och organisationens sätt att arbeta. En sådan bedömning kräver jämförbara uppgifter om ärendena och om de resurser som faktiskt funnits tillgängliga. [I02, I03, I04]

Tillgång till personal kan påverka ett ärende redan innan den aktiva prövningen har kommit i gång. I04 beskriver ett fall där handläggningen enligt intervjupersonen inte påbörjades förrän efter ett år på grund av personalbrist. Erfarenheten belyser behovet av att redovisa väntan på en handläggare separat från tid som används för utredning, kommunicering och beslut. Företagets arbete med en väl förberedd ansökan kan begränsa vissa kompletteringar, men löser inte i sig en kö som beror på otillräcklig kapacitet. För att välja en relevant åtgärd behöver uppföljningen därför visa både var väntan uppstår och vilken kompetens som krävs för att arbetet ska kunna fortsätta. [I04]

Kontinuitet i handläggningen beror också på om ärendets tidigare bedömningar går att förstå när ansvaret byts. I05 beskriver hur frågor som verksamhetsutövaren uppfattat som avklarade kan aktualiseras igen efter ett handläggarbyte. En ny ansvarig behöver kunna sätta sig in i underlaget och göra de bedömningar som uppgiften kräver, men det arbetet blir svårare om avgränsningar, skäl och kvarstående osäkerheter inte har dokumenterats. En ordnad överlämning bör därför följa ärendets sakfrågor och ange vilken version av underlaget som ligger till grund för tidigare ställningstaganden. Det gör det möjligt att återuppta arbetet med en tydlig bild av både genomförda moment och frågor som fortfarande är öppna. [I05]

> Problematiken förstärks av att flera handläggare kan vara involverade i olika skeden av processen. När ansvaret övergår från en person till en annan finns en risk att tidigare diskussioner och bedömningar inte får fullt genomslag i den fortsatta prövningen. Frågor som verksamhetsutövaren uppfattat som avklarade kan därmed aktualiseras på nytt, samtidigt som nya utredningskrav tillkommer.

Intervjukälla I05 · Intervjuanteckning, stycke 24 [I05-24]

En mer samlad organisation behöver förena gemensamma arbetssätt med kunskap om de förhållanden som skiljer ärenden åt. I01 framhåller behovet av enhetlig handläggning med utrymme för sakligt motiverade lokala skillnader, och I02 betonar värdet av lokalkännedom. Synpunkterna talar för en specialisering där handläggaren får tillgång till relevant ämneskompetens utan att platsens förutsättningar försvinner ur bedömningen. Gemensamma mallar och dokumentationskrav kan stödja detta om de hjälper organisationen att redovisa vilka lokala omständigheter som är betydelsefulla och varför ett visst underlag behövs. [I01, I02]

Gemensam kapacitets- och specialistfördelning, MPM-08, bör därför beredas tillsammans med aktiv planering av ärendena och en dokumentation som flera personer kan använda. Fördelningen av specialistresurser kan underlätta tillgången till rätt kompetens när en viss fråga behöver bedömas, medan spårbarheten i ärendeakten gör det lättare att ta till vara arbetet. MPM-10 avser versionskontroll och spårbarhet i myndighetens egen akt. MPM-14 gäller överlämnandet efter överklagande och myndighetens uppgift i den fortsatta domstolsprocessen. Åtgärderna berör olika övergångar och bör få egna krav på tillämpning, ansvar och uppföljning, så att det framgår var en förbättring förväntas uppstå. [MYN]

Ett uppföljningsunderlag bör ge en samlad bild av väntetid, efterfrågad kompetens och de arbetsinsatser som behövs när ansvaret förändras. Med sådana uppgifter går det att undersöka om en försening främst beror på resursbrist, prioritering mellan ärenden eller svårigheter att återskapa tidigare bedömningar. Även väl fungerande ärenden behöver ingå i analysen. De kan visa vilka former av dialog, dokumentation och specialiststöd som underlättar arbetet och under vilka förutsättningar erfarenheterna kan användas i andra ärenden. För företagen bör förbättringen kunna märkas i tydligare återkoppling, bättre framförhållning och färre omtag som uppstår enbart därför att ärendets kunskap gått förlorad. [I02, I03, I04, I05]

ANALYS AV RISKFÖRLOPPEN

09 Parallella beslut och den faktiska möjligheten att starta

När flera beslut behövs avgör deras inbördes beroenden hur en försening påverkar projektet.

Processkartorna visar att ett projekts möjlighet att genomföras ofta beror på flera beslut som hanteras i olika ordningar och av olika aktörer. Miljöprövningen kan löpa parallellt med planläggning, sektorsbeslut och rättighetsfrågor, samtidigt som vissa delar kräver att ett tidigare ställningstagande är klart. När ett nödvändigt beslut dröjer kan andra färdiga beslut och förberedda resurser få begränsad praktisk betydelse under väntetiden. Analysen behöver därför följa hela beslutskedjan och ange vilka kvarstående frågor som faktiskt hindrar projektets fortsättning. En sådan beskrivning gör det också lättare att skilja arbete som kan bedrivas parallellt från moment som måste avvakta. [REG]

För ett projekt som behöver uppfylla flera villkor före start är det sist färdiga nödvändiga villkoret avgörande för den tidigaste möjliga tidpunkten. Därför kan en förkortning av en viss handläggning ge liten tidsvinst för projektet, medan en begränsad förbättring i ett annat spår får större betydelse. Bedömningen behöver utgå från de faktiska beroendena mellan besluten och från de förutsättningar som gäller medan projektet väntar. Avtal, reserverade resurser och tidsbegränsade åtaganden kan behöva omprövas om tidsplanen förskjuts. Det är denna koppling mellan beslutens ordning och projektets ekonomiska förutsättningar som en gemensam planering behöver synliggöra. [REG]

I03 beskriver hur tillståndens rättsliga status, tilldelning av eleffekt och villkor för investeringsstöd kan påverka samma projekt. När dessa processer utgår från olika tidpunkter kan en försening i prövningen få följder för förutsättningarna att ordna finansiering eller anslutning. Erfarenheten illustrerar varför projektets samlade tidsplan behöver omfatta fler frågor än handläggningen av själva tillståndsansökan. Uppgifterna återges som en beskrivning av företagets riskförlopp; intervjun fastställer varken ett visst stödutfall eller någon generell regel för hur nätkapacitet fördelas. [I03]

I05 beskriver större projekt där flera prövningar och överklaganden behöver hanteras innan genomförandet kan fortsätta. För den ekonomiska analysen blir det då viktigt att avgöra om riskerna orsakar samma väntetid eller olika förseningar. Om två hinder pågår samtidigt kan en del av kapitalbindningen och produktionsbortfallet vara gemensam, vilket innebär att de fulla

tidskostnaderna inte kan räknas en gång för varje hinder. Ett sent besked kan också göra att ett undersöknings- eller arbetsfönster missas och därmed förlänga projektets väntan ytterligare. Kostnadsunderlaget behöver beskriva dessa förlopp i tidsordning för att visa vilken del av förlusten en viss åtgärd har möjlighet att påverka. [I05, REG]

En samordnad tillståndsmatris per åtgärd, C-SHARED-tillstandsmatris, kan ge företaget en överblick över beslut, underlag och återstående villkor. Överenskomna gränssnitt med andra beslutsorgan, MPM-04, avser hur ansvariga aktörer samverkar kring dessa beroenden. Tillsammans kan arbetssätten göra det tydligare vilka uppgifter som delas, vem som behöver agera och när ett besked måste finnas för att nästa steg ska vara möjligt. Den tänkta nyttan förutsätter att överblicken används i den löpande planeringen och uppdateras när projektet eller prövningens förutsättningar ändras. Även med en väl dokumenterad matris återstår de utredningar och självständiga bedömningar som respektive beslut kräver. [REG, MYN]

En fortsatt ekonomisk beredning bör knyta varje belopp till en identifierad förseningsperiod och till det kostnadsslag som påverkas. Då kan kapitalbindning, omarbete och utebliven produktion följas genom projektet och gemensamma belopp skiljas från kostnader som tillkommer vid ett nytt hinder. Denna avgränsning är särskilt viktig när flera kontroller riktas mot närliggande delar av samma förlopp. För att deras samlade nytta ska kunna bedömas behöver referensläget och åtgärdsalternativen omfatta samma projekt, tidsperioder och ekonomiska poster.

För MPM-04 ger modellen en fristående minskning på omkring 36 procent av kostnadsindikatorerna för de tre kopplade riskerna. Åtgärdens bedömda betydelse framgår därmed tydligare när både riskernas kostnader och deras påverkbarhet ingår än när enbart antalet kopplingar räknas. Den praktiska beredningen behöver följa samma samband och undersöka hur en kontaktväg eller en tillståndsmatris leder till ett annat handlande i berörda projekt. Ansvar för att hålla informationen aktuell, hantera ändrade förutsättningar och föra olösta frågor vidare behöver därför ingå i åtgärdens utformning. Den beräknade potentialen kan först därefter vägas mot kostnaden för ett arbetssätt som går att tillämpa återkommande. [RES, MYN, SRC]

ANALYS AV RISKFÖRLOPPEN

10 Beslut, överklagande och vägen tillbaka efter återförvisning

Kvalitet i beslutets beredning och formella hantering kan få stor betydelse när projektet annars behöver genomgå ytterligare en prövningsomgång.

Överprövning hör till de förlopp som har stor ekonomisk betydelse i riskbedömningen. En del av tidsåtgången följer av att beslut ska kunna prövas självständigt och att berörda intressen behöver komma till tals. Samtidigt kan brister i beredning, otydliga villkor och fel i kungörelse eller delgivning skapa ytterligare arbete och förlänga vägen till ett användbart beslut. För förbättringsarbetet behöver dessa orsaker skiljas åt, eftersom de ger olika möjligheter till påverkan. En åtgärd inom beslutsmyndigheten bör därför avgränsas till de moment där myndighetens eget arbete kan förebygga ett omtag eller göra det fortsatta förloppet mer förutsebart. [REG, RES, MYN]

Kontrollerad kungörelse, delgivning och överklagandeinformation, MPM-13, är kopplad till åtta risker och har ett positivt modellbidrag för samtliga. Om åtgärden införs ensam minskar summan av deras kostnadsindikatorer med omkring tolv procent. För att bedöma om denna potential går att realisera behöver kontrollen beskrivas som en arbetsuppgift med tydligt ansvar: vilka moment som ska granskas, när granskningen sker och hur upptäckta avvikelser rättas innan de påverkar beslutets fortsatta hantering. Dokumentation av kontrollens genomförande kan därefter knytas till återkommande fel och till det merarbete som uppstår i berörda ärenden. [REG, RES, MYN, SRC]

När ett ärende återförvisas behöver den fortsatta handläggningen ta sin utgångspunkt i vad avgörandet innebär för de återstående frågorna. Riktad hantering efter återförvisning, MPM-16, är kopplad till två risker och avser att samla nödvändiga insatser för detta fortsatta arbete. Ett praktiskt underlag bör ange vilka frågor som måste behandlas på nytt, vilka tidigare uppgifter som fortfarande är användbara och hur berörda aktörer ska medverka. Den ekonomiska bedömningen behöver samtidigt stöd i faktiska återförvisningsärenden och i den del av deras fortsatta tidsåtgång som arbetssättet kan påverka. På så sätt kan prioriteringen knytas till både ett avgränsat problem och en möjlig förändring av handläggningen. [REG, RES, MYN]

Juridisk och teknisk kvalitetssäkring av egna beslut, MPM-11, samt entydiga och inbördes förenliga tillståndsvillkor, MPM-12, riktas mot tidigare moment i samma beslutskedja. Tydliga förutsättningar, skäl och krav kan underlätta både den fortsatta prövningen och

verksamhetsutövarens planering och efterlevnad. För MPM-12 motsvarar den sammanlagda modellerade minskningen cirka 29 procent av de kopplade riskernas kostnadsunderlag, medan två av riskerna får ökade värden. Det innebär att den positiva summan behöver granskas tillsammans med delresultaten. Beredningen bör undersöka vad de skilda bedömningarna avser och om åtgärdens innehåll är tillräckligt preciserat för de olika riskförloppen innan den ekonomiska potentialen används som investeringsgrund. [REG, RES, MYN, SRC]

Uppföljningen av beslutskvalitet behöver omfatta orsakerna till att ett ärende går vidare och vad som händer i den fortsatta prövningen. Antalet överklaganden ger begränsad vägledning om kvaliteten, eftersom ett överklagande kan vara välgrundat och prövningen kan behövas för att klarlägga sakfrågan. Mer användbara uppgifter för förbättringsarbetet är vilka frågor som leder till ändring eller återförvisning, vilka formella brister som återkommer och hur mycket ytterligare arbete dessa medför. Med den inriktningen kan kontrollernas innehåll utvecklas utifrån dokumenterade problem samtidigt som överprövningens självständighet och de berördas rättigheter beaktas. [REG, RES, MYN]

ÅTGÄRDER OCH GENOMFÖRANDE

11 Motåtgärdernas potential och vad en investering behöver pröva


Mätningen gör det möjligt att jämföra föreslagna åtgärders bidrag. Ett investeringsbeslut behöver dessutom ta hänsyn till genomförandekostnad, täckning och osäkerhet.

Kontrollregistret omfattar 378 föreslagna motåtgärder. De har olika räckvidd och kan vara riktade mot en bakomliggande orsak, mot själva riskhändelsen eller mot dess konsekvenser. En kontroll kan beröra flera risker, och samma risk kan ha flera kontroller. Detta gör det möjligt att undersöka gemensamma arbetssätt som påverkar flera delar av processen, men innebär också att en ekonomisk bedömning behöver hantera kombinationer. Två åtgärder som berör samma risk kan inte jämföras genom att deras fristående besparingar utan vidare läggs samman. [RES, REG, MYN]

Risk- och kontrollbedömningen innehåller 998 effektposter för 377 kontroller. De beskriver bedömda proportionella förändringar av händelsefrekvens respektive kostnad per händelse. För varje kontrollurval kombineras effekterna per risk och tillämpas på riskens angivna kostnadsgrund, oavsett om dess komponent kommer från modellmedian eller beskrivningsmittpunkt. Detta förutsätter att den relativa effektbedömningen är tillämplig på just den frekvens- och kostnadsnivån. Utgångsläget har inga införda kontroller och resultatet är en modellpotential före kostnader för genomförandet. Särskilda samspel mellan åtgärder är inte empiriskt skattade, vilket behöver beaktas när flera arbetssätt planeras tillsammans. [RES, REG, MYN, SRC]

Myndighetsåtgärderna skiljer sig både i räckvidd och i de ekonomiska förlopp de påverkar. Inom huvudscenariot har juridisk och teknisk kvalitetssäkring, MPM-11, det största fristående kronbidraget. Därefter följer fullständighetsgranskning, MPM-05, samordnad handläggning, MPM-03, och aktiv tidsplanering, MPM-07. En hög placering kan bero på ett fåtal risker med stora indikatorer och behöver därför bedömas genom dessa riskers innehåll. Procentsatsen för en åtgärd använder dessutom en annan ekonomisk bas än procentsatsen för en annan. För investeringsberedningen behövs både absolut bidrag, relativ förändring, antal prissatta risker och kontrollens praktiska möjlighet att påverka förloppet. [RES, REG, MYN, SRC]

Figur 9. Myndighetsåtgärder med störst fristående ekonomisk potential

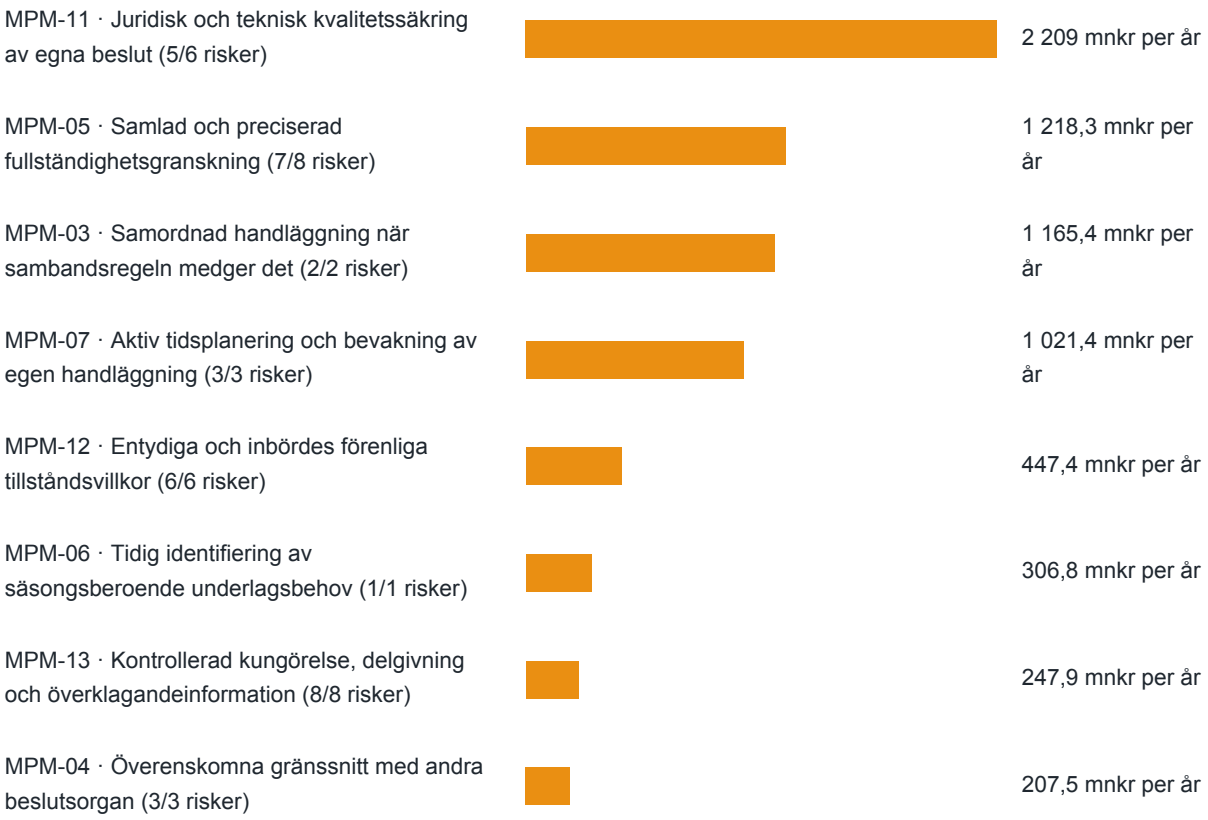


De åtta största positiva fristående indikatorminskningarna inom huvudscenariot, i miljoner kronor per år. Andra åtgärder antas inte införda. Åtgärdernas underlag och ekonomiska räckvidd varierar; beloppen är modellpotential före införande- och driftskostnader. · Källa: REG, RES, SRC

Ursprung och datum: Riskbedömning 2026-10-22 (RES) och källgranskning 2026-10-22 (SRC). Huvudscenariots 17 åtgärder: MYN.

Statistik och beräkning: Modellerad fristående förändring från läget utan åtgärder: riskens kostnadsindikator × [1 − exp(−frekvensskift − kostnadsskift)]. Effektskiftena kommer från risk- och kontrollbedömningen; angivna källnivåer får samma proportionella effekt. Staplarna visar de åtta största positiva fristående bidragen, i miljoner kronor per år. Varje åtgärd har sitt eget riskunderlag. Kostnader för införande och drift saknas; bidragen får inte adderas till ett åtgärdspaket.

För fullständighetsgranskning, gränssnitt mellan beslutsorgan och ärendets dokumentation ger resultaten en mer sammansatt bild. Dessa åtgärder har stöd i de riskmekanismer som intervjuerna beskriver, men deras ekonomiska bidrag varierar och underlaget täcker inte alltid alla kopplade risker. Det är särskilt viktigt vid jämförelser där en åtgärd når risker utan årsbelopp. Ett lågt redovisat bidrag kan då bero på att en betydelsefull del av nyttan ännu inte kan kostnadsberäknas. Tabellen och den digitala analysen visar därför både antal berörda risker och hur många som faktiskt ingår i beloppsjämförelsen. [RES, REG, MYN, I03, I04, I05]

Figur 10. Fristående åtgärdseffekt inom respektive kostnadsunderlag

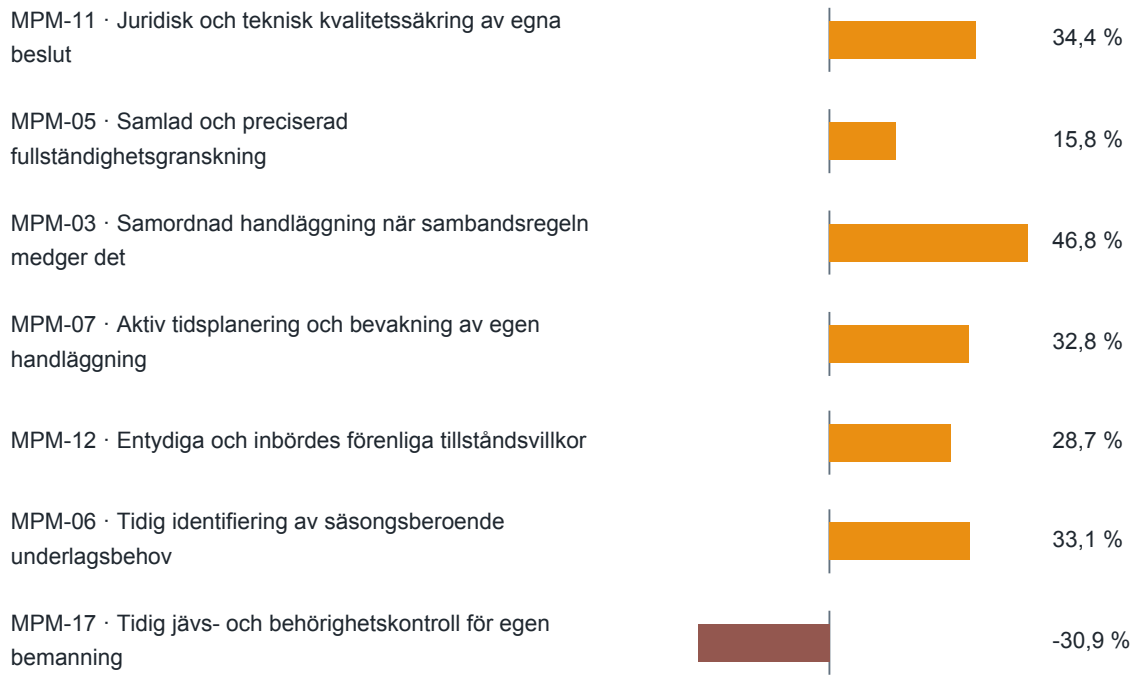

Noll i mitten. Höger: minskning. Vänster: ökning i modellen. Gemensam linjär skala.

Fristående procentuell minskning av källgranskade årsindikatorer inom respektive åtgärds riskunderlag. Varje rad avser sina egna risker och sin redovisade täckning. Negativa värden innebär en ökning i modellen. Urvalet visar de största positiva bidragen och negativa resultat i huvudscenariot. · Källa: REG, RES

Ursprung och datum: Riskbedömning 2026-10-22 (RES) och källgranskning 2026-10-22 (SRC). Huvudscenariots 17 åtgärder: MYN.

Statistik och beräkning: Modellerad fristående förändring från läget utan åtgärder: riskens kostnadsindikator × [1 − exp(−frekvensskift − kostnadsskift)]. Effektskiftena kommer från risk- och kontrollbedömningen; angivna källnivåer får samma proportionella effekt. Procent = summerad indikatorminskning / samma åtgärds summerade kostnadsunderlag. Andra åtgärder är inte införda; negativa effekter behålls.

De 17 åtgärderna i huvudscenariot har dokumenterade kopplingar till 78 risker. För 75 av dessa finns en användbar kostnadsindikator och ett fullständigt effektunderlag. I den kombinerade beräkningen minskar summan från cirka 29,9 till 22,3 miljarder kronor, motsvarande 7,56 miljarder eller 25,3 procent. Jämförelsen använder samma riskposter i båda lägena och de angivna komponenterna från modell- och beskrivningsunderlaget. Tretton risker får en högre indikator i den kombinerade modellen, medan tre kopplade risker saknar jämförbar kostnadsgrund. Den sammanlagda potentialen behöver därför bedömas tillsammans med dessa delresultat. Eftersom genomförandekostnader saknas och förluster kan överlappa är summan ingen nationell nettobesparing. [RES, REG, MYN, SRC, NUM]

Negativa bidrag förekommer även när en åtgärds sammanlagda resultat är positivt. För MPM-05 avser ett sådant bidrag risken att villkorsförslag krockar med tillståndshistoriken, och

för MPM-12 gäller det två av sex kopplade risker. MPM-17 har ett negativt fristående resultat för sin enda risk. Dessa utfall är modellbedömningar som behöver undersökas mot kontrollens avsedda funktion och de antaganden som ligger bakom. De ger skäl att precisera tillämpningen och kontrollera risken för merarbete eller förskjutning av problem, men utgör inte observerade skadeverkningar av kontroller som ännu inte har införts. [RES, REG, MYN]

Figur 11. Huvudscenariots 17 myndighetsåtgärder tillsammans



Jämförelsen omfattar samma 75 riskposter med källgranskad årsindikator i båda lägena. Index 100 är utgångsläget utan åtgärder. Tre ytterligare kopplade risker saknar jämförbart underlag. Åtgärdskostnader och ekonomiska överlapp ingår inte. · Källa: REG, RES

Ursprung och datum: Riskbedömning 2026-10-22 (RES) och källgranskning 2026-10-22 (SRC). Huvudscenariots 17 åtgärder: MYN.

Statistik och beräkning: Index 100 är summan av 75 jämförbara riskindikatorer utan åtgärder. Kontrollernas logaritmiska effektskift summeras per risk; kvarvarande kostnadsindikatorer jämförs på samma riskurval. Tre kopplade risker saknar jämförbart underlag. Modellerad potential före genomförandekostnad, inte empiriskt uppmätt nytta.

För en konkret investering bör jämförelsen därför föras vidare till genomförandet. Det behöver anges vilket arbetssätt som ska förändras, i vilka ärenden det ska användas, vem som ansvarar och vilka resurser som krävs. Kostnaden bör omfatta utveckling, utbildning, löpande arbete och eventuell ökad belastning hos sökanden. En åtgärd med mindre beräknad bruttonytta kan vara mer attraktiv om den är enklare att införa, har lägre kostnad eller ger ett mer robust resultat. Omvänt kan en omfattande systemförändring behöva prövas i mindre skala innan den modellerade nyttan används för att motivera en större investering. [RES, REG, MYN]

Den separata analysfliken för motåtgärder är utformad för denna jämförelse. Besökaren kan välja kontroller, se förändringen per risk och undersöka vad varje kontroll tillför när de andra i urvalet behålls. Valen ändrar endast analysen på skärmen. Genomförandestatus och källdata ligger fast. På så sätt kan underlaget användas för att diskutera alternativa insatser utan att ett utforskat scenario förväxlas med ett fattat beslut eller en redan genomförd förbättring. [RES, REG, MYN]

Tabell 3. Exempel på underlag för fortsatt investeringsbedömning

Åtgärd	Jämförbara risker	Minskning av indikator	Vad som behöver prövas
MPM-11 · Juridisk och teknisk kvalitetssäkring av egna beslut	5 av 6 risker	34,4 %	Granskning före beslut, saknade riskvärden och faktisk resursåtgång.
MPM-05 · Samlad och preciserad fullständighetsgranskning	7 av 8 risker	15,8 %	Samlad granskning, sena behov och förändrad arbetsinsats.
MPM-03 · Samordnad handläggning när sambandsregeln medger det	2 av 2 risker	46,8 %	Samordningens rättsliga utrymme och de två riskernas kostnadsnivåer.
MPM-07 · Aktiv tidsplanering och bevakning av egen handläggning	3 av 3 risker	32,8 %	Tidplanens användning, uppföljning och hantering av beroenden.
MPM-09 · Strukturerad remiss och kommunicering	5 av 5 risker	12,3 %	Remissplan, kommunicering och följder av ändrad arbetsfördelning.

Ursprung och beräkning: Risk- och kontrollbedömning 2026-10-22, källgranskning och oberoende omräkning samma datum. Kronbidrag = summan av varje jämförbar riskindikator × (1 − exp(−frekvensskift − kostnadsskift)). Procentsats = detta bidrag / samma riskers indikatorer utan åtgärd. Rangordning efter fristående kronbidrag; negativa bidrag bevaras. Ingen genomförandekostnad eller ekonomisk dubbelräkning är avräknad. [REG, RES, SRC, NUM]

ÅTGÄRDER OCH GENOMFÖRANDE


12 Åtgärdspaket inom myndighetens rådighet

Förslagen behöver föras över till arbetssätt som går att använda, bemanna och följa upp i konkreta ärenden.

Åtgärderna i huvudscenariot kan samlas i fem arbetsområden: vägledning och mottagning, underlag och ärendeakt, planering och samordning, beslut och delgivning samt fortsatt prövning och förutsättningar inför start. Indelningen följer kontrollernas innehåll och gör det lättare att se vilka funktioner som behöver samarbeta. Den ersätter inte bedömningen av varje åtgärd. Ett arbetsområde kan innehålla förslag med olika rättsliga förutsättningar, resursbehov och styrka i effektunderlaget, vilket behöver framgå när ett paket bereds. [MYN, REG, RES]

Figur 12. Vilka risker de fem arbetsområdena når

Grå: Kopplade risker. Orange: Därav i kostnadstopp 50. risker.

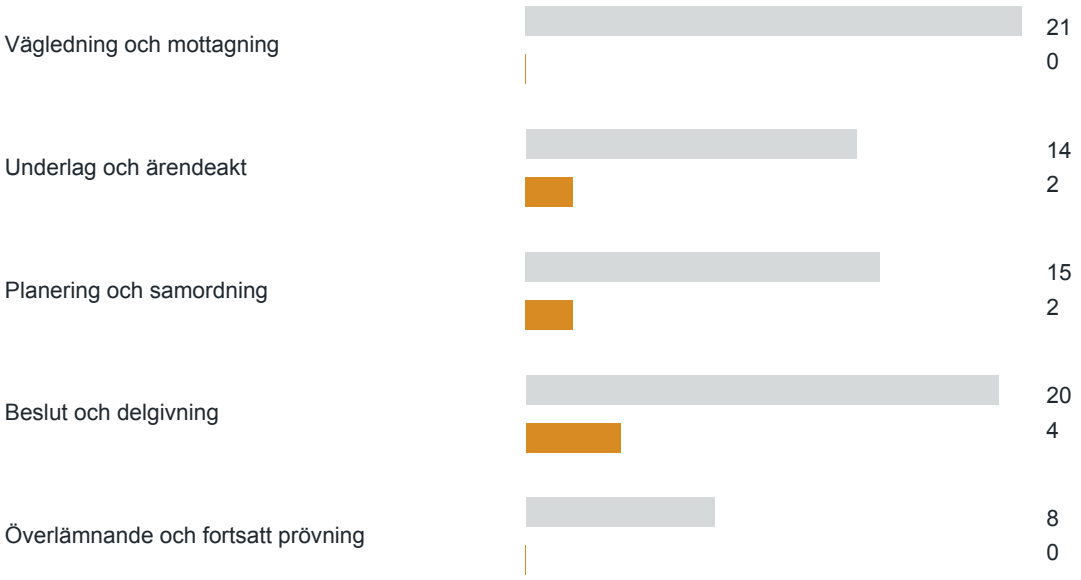

De 17 åtgärderna i huvudscenariot. En risk kan förekomma i fler än ett arbetsområde. Orange visar risker i kostnadstopp 50, grått samtliga kopplade risker. · Källa: REG, RES

Ursprung och datum: Registerutdrag för rapportutgåva 2026-10-22; risk- och processregister samt kontrollkopplingar (REG, MYN). Rangordning: Riskbedömning 2026-10-22 (RES) och källgranskning 2026-10-22 (SRC).

Statistik och beräkning: Antal unika risker per arbetsområde bland huvudscenariots 17 åtgärder samt antal av dessa i topp 50. En risk kan ingå i flera arbetsområden; summan av grupperna är inte antal unika risker i hela urvalet.

Vägledning och mottagning omfattar framför allt MPM-01 och MPM-02. Här bör ett gemensamt arbetssätt göra det lättare att identifiera behörig prövning, hålla reda på vilken projektversion som diskuteras och dokumentera vilka besked som lämnats. En tydlig avgränsning är särskilt viktig när den sökande ännu inte har bestämt alla tekniska detaljer. Arbetssättet behöver kunna hantera ändringar utan att tidigare information går förlorad eller uppfattas som mer bindande än den är. Nyttan bör följas genom färre sena omtag i vägval och en bättre förståelse för vad som återstår. [MYN, REG, RES]

Underlag och ärendeakt omfattar samlad fullständighetsgranskning, säsongsberoende behov och versionskontroll. MPM-05, MPM-06 och MPM-10 berör tillsammans 14 unika risker. Ett gemensamt genomförande bör göra det möjligt att följa en fråga från det första beskedet till det underlag som besvarar den, med uppgift om ansvarig, datum och eventuell förändring av kravet. Detta kan förbättra förutsättningarna både för handläggning och överlämning. Det bör dock följas om dokumentationsarbetet blir proportionerligt och om det faktiskt används, så att en ny rutin inte främst blir ytterligare en administrativ uppgift. [MYN, REG, RES]

Planering och samordning förenar MPM-03, MPM-04 och MPM-07–09. Förslagen berör dels sambandet mellan ärenden och beslutsorgan, dels planeringen av den egna handläggningen,

tillgång till specialiststöd och remissarbetet. Tillsammans når de 15 unika risker. Genomförandet bör börja med en tydlig skillnad mellan det myndigheten själv kan planera och beroenden där andra behöver agera. En tidplan blir mer användbar om den visar varför en tidpunkt är osäker, vilka besked som kan ändra den och när planeringen ska uppdateras. Samma information kan hjälpa sökanden att samordna sina egna aktiviteter. [MYN, REG, RES]

Beslut och delgivning omfattar MPM-11–13 och når 20 unika risker. Här finns både möjligheter till sakkunnig granskning av beslutets innehåll och kontroll av den formella hanteringen. Ett lämpligt arbetssätt bör precisera när granskningen ska ske och hur upptäckta brister rättas. Om kontrollen läggs för sent kan den i sig skapa försening, medan en tydlig kontrollpunkt före expediering kan begränsa senare omtag. Den ekonomiska jämförelsen bör knytas till de fel som faktiskt återkommer i organisationens ärenden. Särskilt de riskposter som står för en stor del av ett beräknat bidrag behöver granskas, så att osäkra storleksordningar inte ensamma avgör vilken kontroll som införs först. [MYN, REG, RES]

Arbetsområdet överlämnande och fortsatt prövning omfattar MPM-14–17 och når åtta unika risker. Här finns skilda uppgifter: att överlämna en användbar akt, hantera egna förstartsgodkännanden, organisera arbetet efter återförvisning och säkra jävs- och behörighetskontroller. MPM-14 och MPM-16 har positiva sammanlagda modellbidrag, medan MPM-17:s bidrag är negativt och behöver granskas. Det praktiska genomförandet bör börja i vilken information och ansvarsfördelning nästa aktör behöver för att kunna arbeta vidare. Uppföljningen kan sedan visa om akter går att använda, om återstående frågor är tydliga och om ett omtag begränsas till det som faktiskt behöver prövas. [MYN, REG, RES]

Organisationsövergången, MPM-T01, bör hållas åtskild från den löpande verksamhetens förbättringsarbete. Åtgärden når nio risker, varav åtta har användbara källgranskade indikatorer i den aktuella jämförelsen. Det modellerade bidraget behöver läsas tillsammans med den verksamhetsrisk som en bristfällig överföring av pågående ärenden kan medföra. En praktisk beredning bör kontrollera ärendeakter, frister, ansvar, åtkomst och öppna frågor samt ordna en hantering av avvikelser. Förslagen om ett framtida bredare mandat, MPM-F01 och MPM-F02, behöver i sin tur behandlas som särskilda utvecklingsfrågor och inte räknas in i ett genomförande inom huvudscenariot. [MYN, REG, RES]

Figur 13. Arbetsområdenas kopplingar till delprocesserna

Åtgärdsområde	B10	B20	B30	B40	B50	B60	B70
Vägledning och mottagning	4	0	11	0	3	2	1
Underlag och ärendeakt	1	0	4	1	1	6	1
Planering och samordning	3	0	1	3	1	7	0
Beslut och delgivning	0	0	0	0	5	10	5
Överlämnande och fortsatt prövning	0	0	0	0	0	4	4

Antal unika risker inom varje kombination av arbetsområde och delprocess. Tabellen visar var den föreslagna verksamhetsutvecklingen möter processernas risker. · Källa: REG, RES

Ursprung och datum: Registerutdrag för rapportutgåva 2026-10-22; risk- och processregister samt kontrollkopplingar (REG, MYN).

Statistik och beräkning: Antal unika risker inom varje kombination av arbetsområde och direkt delprocess för huvudscenariots 17 åtgärder. Kopplingsräkning, inte effektstorlek eller sannolikhet.

BEDÖMNING OCH REKOMMENDATIONER

13 Hur resultaten bör vägas samman

Prioriteringen blir mer användbar när belopp, riskförlopp, genomförbarhet och erfarenheter prövas tillsammans.

Riskbedömning, processkartläggning och intervjuer bidrar med olika kunskap. Den ekonomiska jämförelsen visar vilka bedömda händelser som har störst vikt, processkartorna placerar dem i en beslutskedja och intervjuerna beskriver hur förloppen kan uppfattas och hanteras i praktiken. När materialen pekar mot samma mekanism blir det lättare att formulera en konkret förbättringsinsats. Samstämmighet är dock inte automatiskt ett oberoende belägg: vissa intervjuer utgick från presenterade riskexempel. Analysen behöver därför också uppmärksamma nyanseringar, fungerande ärenden och erfarenheter som inte passar in i den förväntade bilden. [REG, RES, MYN, I03, I04, I05]


Det mest genomgående sambandet gäller hur underlag och tidigare bedömningar följer med mellan processens steg. Otydliga besked kan ge merarbete hos sökanden, medan bristande dokumentation kan göra det svårt för en ny handläggare att förstå vad som redan har utretts. En åtgärd som förbättrar dokumentationen kan därför bidra till flera risker samtidigt. För att detta ska bli en faktisk förbättring behöver arbetssättet även ge utrymme för saklig omprövning när projektet eller omständigheterna ändras. Kontinuitet bör innebära att tidigare arbete kan förstås och användas, med tydliga skäl när en ny bedömning behövs. [REG, RES, MYN, I03, I04, I05]

En andra fråga gäller förhållandet mellan en myndighets prestation och företagets möjlighet att genomföra projektet. En kortare handläggningstid kan ha stort värde, men effekten beror på vilka andra beslut som återstår och när resurser behöver bindas. Intervjuerna beskriver hur tidsfrister som börjar efter en fullständighetsbedömning kan vara svåra att använda för den som inte vet när denna bedömning blir klar. Uppföljningen behöver därför omfatta både den egna handläggningen och relevanta väntetider före och efter den. Det ger en bättre grund för att förstå om en förbättring faktiskt förändrar projektets förutsättningar. [REG, RES, MYN, I03, I04, I05]

Kostnadsindikatorerna har olika källgrund och ska bedömas utifrån vad den kan bära. En modellmedian uttrycker en bedömd central nivå, medan en mittpunkt i ett beskrivningsintervall ger en uttrycklig jämförelsepunkt inom den angivna ramen. Historiska antal och tider kan pröva om händelsepopulationen och förloppet är rimliga utan att därmed bestämma den ekonomiska förlusten. Ingen av huvudindikatorerna är direkt hämtad ur representativ historisk

kostnadsstatistik. Detta gör koncentrationen i de största risk- och kontrollbidragen viktig: en kalkyl som till stor del bärs av två risker behöver ett särskilt bra underlag för just deras antal, tidsförskjutning och kostnad. [REG, RES, MYN, I03, I04, I05, SRC]

Figur 14. Vilka risker som bär de högst prioriterade åtgärdernas bidrag

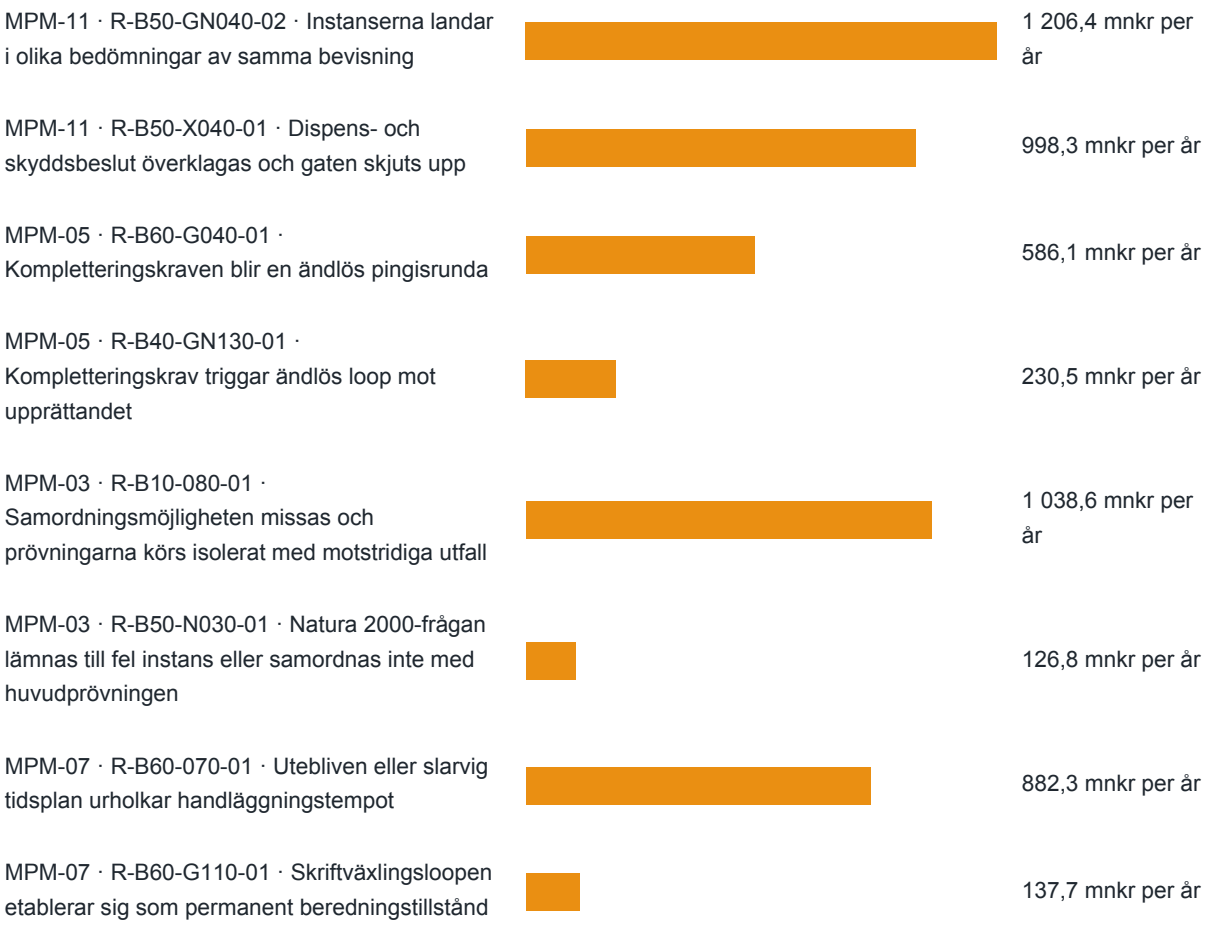

Två största riskbidrag per åtgärd för MPM-11, MPM-05, MPM-03 och MPM-07, i miljoner kronor per år. Figuren visar koncentrationen i varje fristående kalkyl. Andra riskbidrag kan vara positiva, negativa eller odefinierade. Bidragen från olika åtgärder får inte summeras till en gemensam besparing. · Källa: REG, RES, SRC

Ursprung och datum: Riskbedömning 2026-10-22 (RES) och källgranskning 2026-10-22 (SRC). Åtgärder och riskkopplingar: MYN.

Statistik och beräkning: Modellerad fristående förändring från läget utan åtgärder: riskens kostnadsindikator × [1 − exp(−frekvensskift − kostnadsskift)]. Effektskiftena kommer från risk- och kontrollbedömningen; angivna källnivåer får samma proportionella effekt. De två största positiva riskbidragen visas för var och en av huvudscenariots fyra högst rangordnade åtgärder. Övriga riskbidrag ingår i respektive åtgärds total men visas inte här. Samma risk eller förlust kan beröras av flera åtgärder.

För kontrollerna tillkommer frågan om överlapp. Två åtgärder kan påverka samma risk, och två risker kan beskriva delar av samma ekonomiska förlust. Modellens kombination av kontrolleffekter hanterar det första på den valda logaritmiska skalan, men innehåller ingen

skattning av alla praktiska samspel. Den ekonomiska överlappningen mellan riskposter är ännu inte avstämd. Summan av källgranskade indikatorer används därför för att jämföra samma riskurval före och efter en åtgärd, med tydlig redovisning av täckningen. Den är varken en nationell kostnadsprognos eller en portföljmedian. En budget eller ett investeringsbeslut behöver ett mer avgränsat kostnadsunderlag och en beräkning av genomförandets resurser. [REG, RES, MYN, I03, I04, I05, SRC]

Förslagen bör därför beredas på ett sätt som förenar ekonomisk prioritering med prövning av deras praktiska funktion. Kvalitetssäkring av beslut, fullständighetsgranskning, samordning och tidsplanering har stora modellbidrag inom huvudscenariot, medan intervjuerna visar varför tidiga besked och kontinuitet också behöver ingå i utformningen. De fyra högsta fristående kalkylernas koncentration framgår av figuren. Den hjälper till att välja vilka ärendetyper som först bör studeras, och vilka uppgifter som behövs för att skilja faktisk riskreduktion från förändrad dokumentation eller flyttat arbete. Ett sådant upplägg gör det möjligt att pröva kontrollernas innehåll innan bredare resursåtaganden görs. [REG, RES, MYN, I03, I04, I05]

BEDÖMNING OCH REKOMMENDATIONER

14 Inriktning för prioritering och beredning

Svenskt Näringsliv rekommenderar en riktad investeringsberedning där ekonomisk potential följs till de risker och arbetssätt som bär den.

Inom huvudscenariots 17 myndighetsåtgärder bör den fortsatta investeringsberedningen börja med MPM-11, MPM-05, MPM-03 och MPM-07. Det är deras ordning efter fristående minskning av den källgranskade kostnadsindikatorn, om respektive åtgärd införs ensam. Ordningen bygger på modellskattade effekter och de redovisade frekvens- och kostnadsgrunderna. Den är ett underlag för att välja vilka åtgärder som först ska preciseras och kostnadsberäknas; faktisk nettonytta kan ännu inte jämföras eftersom utvecklings-, införande- och driftskostnader saknas. Procentuell minskning av olika riskunderlag ger en annan ordning än kronbidragen, varför både belopp, täckning och de bakomliggande riskerna redovisas nedan. [REG, RES, SRC, MYN, NUM]

MPM-11, juridisk och teknisk kvalitetssäkring av egna beslut, har den största fristående beräknade minskningen: cirka 2 209 miljoner kronor per år, eller 34,4 procent av det prissatta underlaget för fem av sex kopplade risker. Två risker står för 99,8 procent av bidraget. R-B50-GN040-02, ”Instanserna landar i olika bedömningar av samma bevisning”, bidrar med

cirka 1 206 miljoner och R-B50-X040-01, ”Dispens- och skyddsbeslut överklagas och gaten skjuts upp”, med cirka 998 miljoner. Förslaget bör därför beredas genom att undersöka vilka brister i egna beslut som faktiskt kan förebyggas i dessa förlopp och skilja dem från en högre instans självständiga bevisvärdering. Den sjätte risken, R-B60-G210-01 om en separat överprövningskedja, saknar jämförbar kostnadsindikator. Det stora bidraget är således koncentrerat till två bedömda kostnadsförlopp och behöver ett motsvarande riktat ärendeunderlag. [REG, RES, SRC, MYN, NUM]

MPM-05, samlad och preciserad fullständighetsgranskning, följer med cirka 1 218 miljoner kronor i fristående årlig indikatorminskning, motsvarande 15,8 procent för sju av åtta kopplade risker. R-B60-G040-01, ”Kompletteringskraven blir en ändlös pingisrunda”, står för cirka 586 miljoner, eller 48,1 procent av det sammanlagda bidraget. Därefter följer R-B40-GN130-01 om kompletteringskrav som utlöser en återkommande loop, med cirka 231 miljoner och 18,9 procent, samt R-B50-N030-02 om kompletteringsloopar i Natura-ärenden, med cirka 206 miljoner och 16,9 procent. Åtgärden bör prövas i dessa återkommande kompletteringsförlopp, med uppföljning av sena krav, omarbete och faktiskt sparad tid. Samtidigt ger modellen en ökning med cirka 0,12 miljoner kronor för R-B30-100-02, ”Villkorsförslagen krockar med tillståndshistoriken”, och saknar kostnadsgrund för R-B60-030-01 om MKB-brister vid fullständighetsbedömningen. Den negativa delbedömningen behöver klarläggas, och rutinen bör prövas mot tillståndshistoriken innan ett bredare införande beslutas. [REG, RES, SRC, MYN, NUM]

MPM-03, samordnad handläggning när sambandsregeln medger det, ligger därefter med cirka 1 165 miljoner kronor i fristående årlig minskning, motsvarande 46,8 procent av två kopplade riskers indikatorer. R-B10-080-01, ”Samordningsmöjligheten missas och prövningarna körs isolerat med motstridiga utfall”, står för cirka 1 039 miljoner, eller 89,1 procent av bidraget. Den andra risken är R-B50-N030-01, där Natura 2000-frågan lämnas till fel instans eller inte samordnas med huvudprövningen, med cirka 127 miljoner och 10,9 procent. Den stora riskens händelsekostnad är 255 miljoner kronor, mittpunkten i beskrivningens intervall 10–500 miljoner. Åtgärden förutsätter en rättsligt och praktiskt avgränsad möjlighet till samordning. Beredningen behöver visa vilka parallella frågor som kan hanteras gemensamt, vilket organ som ansvarar och hur dubbelarbete eller faktisk väntan minskar. [REG, RES, SRC, MYN, NUM]

MPM-07, aktiv tidsplanering och bevakning av egen handläggning, ger cirka 1 021 miljoner kronor i fristående årlig indikatorminskning, eller 32,8 procent för samtliga tre kopplade risker. R-B60-070-01, ”Utebliven eller slarvig tidsplan urholkar handläggningstempot”, svarar för cirka 882 miljoner och 86,4 procent av bidraget. R-B60-G110-01, där skriftväxlingsloopen blir ett permanent beredningstillstånd, bidrar med cirka 138 miljoner och 13,5 procent. Den tredje risken, R-B40-M130-01 om osäker handläggningstid för markavvattning, bidrar med cirka 1,3 miljoner. Insatsen bör utformas så att tidplanen används för att identifiera väntan och ansvar, uppdateras när förutsättningarna ändras och kan följas mot faktiskt arbete. Den beräknade

effekten behöver prövas mot vilka väntetider myndigheten kan påverka och vilken arbetsinsats bevakningen kräver. [REG, RES, SRC, MYN, NUM]

De fyra beloppen är fristående jämförelser och får inte adderas till en gemensam besparing. Andelarna ovan anger respektive risks bidrag till en åtgärds beräknade indikatorminskning, och är varken en sannolikhet eller åtgärdens effektprocent. Modellens relativa effekter har tillämpats på granskade kostnadsgrunder den 22 oktober 2026. Kostnadsgrunderna är bedömningar, och ekonomiskt överlapp mellan riskerna återstår. En gemensam prövning av åtgärderna behöver därför göras med den kombinerade modellen, varefter kalkylen avgränsas till faktiska projekt och genomförandekostnader tillförs. [REG, RES, SRC, MYN, NUM]

Därefter följer MPM-12, entydiga och inbördes förenliga tillståndsvillkor, med cirka 447 miljoner kronor i fristående årlig indikatorminskning, och MPM-06, tidig identifiering av säsongsberoende underlag, med cirka 307 miljoner. MPM-12 har två negativa riskbidrag som behöver granskas, medan MPM-06:s hela bidrag avser R-B60-050-01, ”Säsongsberoende kompletteringar missar fönstret”. För den senare åtgärden ger intervjuerna ytterligare skäl att pröva om tidigare besked kan undvika att en inventeringssäsong går förlorad. Samtliga 20 myndighetsdrivna förslag redovisas i bilaga G. Övergångsåtgärden MPM-T01 och de två förslagen för framtida mandat hålls där åtskilda från huvudscenariot, även om deras ekonomiska bidrag kan jämföras beräkningstekniskt. [REG, RES, SRC, MYN, NUM, I03, I04, I05]

Den andra rekommendationen är att utveckla fullständighetsgranskning och hantering av säsongsberoende underlag tillsammans med sökandens förberedelser. Ett gemensamt besked om återstående frågor bör kunna följas till svar, underlagsversion och ansvarig. Vid nya krav bör det framgå varför de tillkommit och vilken påverkan de har på planeringen. Insatsen bör prövas i ärenden där tidsfönster och kompletteringar har tydlig ekonomisk betydelse. Utvärderingen behöver även fånga om mer arbete läggs tidigt i processen, så att en kortare senare handläggning inte automatiskt räknas som en minskning av den totala belastningen. [RES, MYN, REG]

Den tredje rekommendationen gäller planering, kompetens och kontinuitet. En användbar ärendeakt, tydliga prioriteringar och tillgång till rätt specialiststöd bör behandlas som delar av det praktiska arbetet. Det bör gå att se vilka frågor som väntar på bedömning, vilken kompetens som behövs och vilka tidigare ställningstaganden nästa handläggare kan utgå från. Företagens erfarenheter kan visa när besked blir användbara för planeringen och vilka väntetider som är svåra att förstå. Uppföljningen bör samtidigt ge utrymme för myndighetens förklaring av ärendets komplexitet och av varför ett underlag behöver kompletteras. [RES, MYN, REG]

Den fjärde rekommendationen är att följa projektens viktigaste beroenden fram till möjlig start. För ett avgränsat ärendeurval bör det dokumenteras vilka beslut och godkännanden som återstår, vilket organ som ansvarar och vad som hindrar nästa steg. Åtgärder för gränssnitt och tillståndsmatriser kan då bedömas utifrån om de förbättrar information, planering och faktisk

hantering. Detta arbete bör även uppmärksamma risker utanför den nya myndighetens mandat, så att en förbättring inom ett spår inte döljer att projektet fortfarande väntar på ett annat. [RES, MYN, REG]

Den femte rekommendationen är att skilja den nya organisationens övergångsrisker från den långsiktiga effektbedömningen. Pågående ärenden behöver en mottagande ansvarig och en verifierad överföring av dokument, frister och öppna frågor. Åtta av övergångsåtgärdens nio kopplade risker kan ingå i den källgranskade jämförelsen, men beräkningsunderlaget visar inte alla följder av en bristfällig överföring. Ett genomförande bör därför också motiveras med den konkreta verksamhetsrisk som behöver förebyggas och följas genom stickprov på faktisk användbarhet. Ett begränsat modellbidrag får inte ensamt avgöra betydelsen av att bevara kunskap och ansvar i pågående ärenden. [RES, MYN, REG]

Slutligen bör den genomförda källgranskningen följas av riktad insamling av faktiska ärendekostnader för de högsta indikatorerna. För vattenmål, överprövning, markåtkomst och upprepade kompletteringar behövs uppgifter om vilka projekt som verkligen försenats, hur lång den tillkommande väntan var och vilka kostnader som kan hänföras till den. Detta kan pröva de modellvärden som saknar jämförbar historik och de beskrivningsuppskattningar som används i rangordningen. Negativa kontrolleffekter behöver dessutom granskas mot kontrollens avsedda funktion och jämförbarheten mellan lägena utan och med åtgärd. Resultatet bör dokumenteras tillsammans med källa och påverkan på prioriteringen, så att resursbeslut successivt får ett starkare stöd i observerade förlopp. [RES, MYN, REG, SRC]

BEDÖMNING OCH REKOMMENDATIONER

15 Uppföljning av genomförande, kostnader och resultat

Faktisk användning av åtgärderna behöver följas tillsammans med hur ärendena utvecklas.

En uppföljning av åtgärdernas effekt behöver börja med att fastställa hur de används. För varje kontroll bör det gå att följa vilka ärenden som omfattas, när arbetssättet börjar tillämpas och vad handläggaren eller företaget faktiskt gör annorlunda. Om en åtgärd bara finns beskriven i en rutin går det annars inte att avgöra om ett uteblivet resultat beror på dess utformning eller på att den aldrig tillämpats. Genomförande och utfall behöver därför följas tillsammans, med uppgifter som kan kopplas till det riskförlopp som kontrollen avser att förändra.

Tabell 4. Föreslagna uppföljningsmått

Mått	Definition	Tolkning och kontroll
Tid till första samlade besked	Dagar från mottagen ansökan till dokumenterat besked om samlade underlagsbehov	Redovisa median och spridning per ärendetyp; kontrollera ändrad ärendemix
Sena tidigare kända behov	Kompletteringskrav efter första beskedet där behovet kunde identifieras vid granskningen	Skilj nya sakförhållanden och projektändringar från missade behov
Kontinuitet vid överlämning	Ärenden med verifierad överlämning av version, avgränsningar, frister och öppna frågor	Följ faktisk användbarhet genom stickprov
Kö och aktiv handläggning	Tid utan aktiv handläggning respektive tid i dokumenterat arbete	Redovisa definition och registreringsgrad
Tid till möjlig projektstart	Tid tills samtliga identifierade förstartsvillkor är uppfyllda	Håll isär tillståndsbeslut, laga kraft och andra nödvändiga villkor
Merkostnad	Dokumenterad omarbetning och förseningskostnad med orsak och period	Undvik samma kostnad i flera riskposter

Ursprung och beräkning: Register-, intervju- och bedömningsunderlag för rapportutgåvan 2026-10-22. Klassningar och kopplingar är dokumenterade analysuppgifter, inte observerade effekter. Se respektive angiven källa. [REG, RES, SRC, NUM]

En jämförelse mellan ärenden före och efter införandet behöver ta hänsyn till att deras förutsättningar kan skilja sig åt. Bransch, omfattning, tidigare tillstånd och ändringar under projektets gång kan påverka tidsåtgången, liksom belastningen hos den handläggande organisationen. Dessa förhållanden bör dokumenteras där de har betydelse för jämförelsen och där uppgifter finns tillgängliga. Ett förbättrat utfall som sammanfaller med en ny rutin ger inte ensamt besked om rutinens bidrag. När underlaget inte medger en tillräckligt jämförbar bedömning bör förändringen redovisas beskrivande och slutsatsen om orsak begränsas till vad ärendeuppgifterna faktiskt stöder.

Kostnaden för en kontroll behöver omfatta både införandet och den återkommande användningen samt eventuella arbetsinsatser hos sökanden. Ett gemensamt handläggarstöd kan exempelvis kräva utveckling, utbildning och förvaltning samtidigt som det minskar tidsåtgången i senare ärenden. För att bedöma nettonyttan behöver dessa kostnader sättas i relation till en avgränsad tidsperiod och till samma ekonomiska poster i referensläget och åtgärdsalternativet. Där kostnadsuppgifter saknas behöver luckan framgå, så att en positiv

bedömning av riskminskningen inte får fungera som ett outrett antagande om att åtgärden är lönsam.

Den återkommande uppföljningen bör hålla isär förändringar i inträffade händelser, bättre kunskap om kostnader och förändringar i kontrollernas tillämpning. En annan placering i en rangordning kan bero på vart och ett av dessa förhållanden och behöver därför förklaras med den information som har tillkommit. Genom att låta text, tabeller och figurer avse samma bedömningstidpunkt kan resultaten följas utan att olika underlag blandas. Dokumenterade tidigare bedömningar ger då ett stöd för att förstå vad som faktiskt har förändrats och vilka frågor som fortfarande saknar ett tillräckligt underlag. [RES]

Mer avancerad simulering kan bli relevant när ett avgränsat beslut kräver kunskap om exempelvis budgetrisk eller spridningen i ett projekts kostnader. En gemensam monetär Monte Carlo-analys förutsätter då att händelser, gemensamma orsaker och överlapp mellan kostnadsposter har beskrivits på ett konsekvent sätt och att kostnadsfördelningarna har en tydlig innebörd. Dessa förutsättningar behöver bedömas innan en simulerad fördelning används i beslutsunderlaget. De redovisade jämförelsemåtten ger redan möjlighet att undersöka riskernas relativa betydelse och åtgärdernas bedömda potential, medan en simulering behöver motiveras av den ytterligare fråga som ska besvaras.

BEDÖMNING OCH REKOMMENDATIONER

16 Slutsatser

Riskbilden ger skäl att prioritera både kvaliteten i enskilda beslut och kontinuiteten genom hela tillståndsprocessen.

Tillståndsprocessens ekonomiska risker sträcker sig från de första vägvalen till de sista förutsättningarna för start. Handläggningstid, kompletteringar, markåtkomst och parallella beslut kan påverka samma projekt och behöver därför analyseras i sitt sammanhang. De högsta kostnadsindikatorerna visar var sådana förlopp har stor bedömd ekonomisk betydelse, samtidigt som historiska ärendeuppgifter visar behovet av att skilja total prövningstid från tillkommande projektförsening. Förutsebarhet kräver användbara besked om vad som återstår, ansvar för öppna frågor och möjlighet att planera när förutsättningarna förändras. [REG, RES, MYN, SRC]

Svenskt Näringsliv bedömer att investeringsberedningen inom myndighetens huvudscenario bör inriktas på kvalitetssäkring av beslut, fullständighetsgranskning, samordnad handläggning och aktiv tidsplanering. Deras stora fristående modellbidrag ger ett ekonomiskt motiv att undersöka dem närmare, medan de bakomliggande riskerna anger vilka ärenden och

arbetsmoment som bör omfattas. Beredningen behöver även fånga negativa delresultat, kostnader för genomförandet och beroenden mellan kontroller. Åtgärderna bör prövas i konkreta förlopp där effekten på väntan, omarbete och kostnad kan följas. Organisationsövergång och förslag som kräver framtida mandat ska behandlas utifrån sina egna förutsättningar. [REG, RES, MYN]

Riskregistret ger ett brett underlag för detta arbete, men de ekonomiska bedömningarna behöver successivt förankras i projektdata. För de största indikatorerna är faktiska händelseantal, tillkommande väntetid och avgränsad merkostnad särskilt angelägna uppgifter. För kontrollerna behövs dessutom en uppföljning av hur arbetssättet används och vilka resurser det tar i anspråk. Med denna inriktning kan myndigheter och företag utveckla en gemensam förståelse för vilka hinder som kan påverkas och vilka åtgärder som ger resultat. Svenskt Näringsliv vill att förbättringsarbetet tar sin utgångspunkt i dessa konkreta förlopp och förenar en välgrundad miljöprövning med bättre förutsättningar för investeringar. [REG, RES, MYN, SRC]

KÄLLOR

17 Referenser och källförteckning

Rapportens analys bygger på process- och riskunderlag, mätresultat, åtgärdsförslag och intervjuer.

Källorna nedan har olika funktion. Process- och riskregistret beskriver möjliga förlopp och deras kopplingar, medan mätningen ger modellbedömningar inom en angiven omfattning. Intervjukällorna används för att förstå erfarenheter och mekanismer och har inte behandlats som ett representativt statistiskt urval. Hänvisningar till offentliga dokument stödjer beskrivningen av den institutionella bakgrunden. Uppgifter som endast återfinns som uppskattningar i en riskbeskrivning redovisas som sådana och har inte uppgraderats till verifierad offentlig statistik.

[REG] Riskregister, processkartor och kontrollregister

Registerunderlag daterat 22 oktober 2026: 342 risker, 378 motåtgärder, 500 unika risk–kontrollpar och 633 riktade kontrollkopplingar. Grundmaterialets rättsliga referenser finns kvar på varje risk och processnod. Baslinjen S0 är daterad 20 augusti 2026; reformscenarier redovisas separat.

[RES] Risk- och åtgärdsbedömning, oktober 2026

Avslutad bedömning av 341 registerrisker. Analysen använder läget utan införda kontroller och bevarar de separata bedömningarna med kontroller som jämförelseunderlag. Källresultat och omfattning är daterade och låsta till denna rapportutgåva.

[CODE] Beräkningsprinciper och reproducerbart analysunderlag

Dokumentation av riskmått, kontrolleffekter, källkontroller och rapportens beräkningar. Tekniska identiteter och kontrollsummor finns i webbplatsens dataunderlag.

https://nic-esp.github.io/miljotillstandsrisker/data/measurement.json

[MYN] Prioriterade myndighetsåtgärder, version 0.10

Tillhandahållna tabeller myndighetskontroller_riskkopplingar.csv och atgardsforslag_bedomning.csv med läsanvisning. Bedömningsdatum 30 september 2026. Innehåller 17 åtgärder i S1, en införandeåtgärd och två förslag som förutsätter framtida mandat. Klassningen beskriver förslagens tillämpning och ska inte likställas med verifierat genomförande.

[RIX] Riksdagen: Ny myndighet för miljöprövning, betänkande 2025/26:MJU24

Miljö- och jordbruksutskottets behandling av proposition 2025/26:238. Underlag för beskrivningen av reformens inriktning och avgränsning. Kontrollerad 22 oktober 2026.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/betankande/ny-myndighet-for-miljoprovning_hd01mju24/html/

[LST] Länsstyrelsen Västra Götaland: Ny myndighet för miljöprövning får kontor i Göteborg

Publicerad 19 augusti 2026. Bekräftar planerad myndighetsstart den 1 juli 2027 och kontor i Stockholm, Göteborg och Umeå. Kontrollerad 22 oktober 2026.

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---vastra-gotaland/2026-08-19-ny-myndighet-for-miljoprovning-far-kontor-i-goteborg.html

[NV24] Naturvårdsverket: Samlad statistik om miljöprövning för år 2024

Historiska antal och handläggningstider för vattenmål och överklagade tillståndsmål som inletts hos miljöprövningsdelegation, s. 3 och 52–55. Uppgifterna avser avgjorda mål och mäter inte kostsamma förseningars frekvens eller ekonomiska förlust. Kontrollerad 22 oktober 2026.

https://www.naturvardsverket.se/49e4ea/globalassets/vagledning/miljobalken/miljoprovning/samlad-statistik-om-miljoprovning-for-ar-2024.pdf

[SRC] Granskning av högt rangordnade risker mot beskrivningar och historik, 22 oktober 2026

Individuell bedömning av 80 riskers händelser, populationer, kostnadsramar och historiska källuppgifter, inklusive samtliga i kostnadstopp 50. Källtext, enhet, använd komponent och kvarstående luckor redovisas per risk. Beskrivningsintervall representeras av en uttrycklig aritmetisk mittpunkt och hålls åtskilda från observerad historik.

https://nic-esp.github.io/miljotillstandsrisker/data/source-review.json

[NUM] Oberoende kontroll av publicerade värden och åtgärdsberäkningar, 22 oktober 2026

Aritmetisk kontroll av samtliga 342 risker, klassning av frekvens- och kostnadskomponenternas ursprung samt oberoende omräkning av kontrollernas effekter och rangordning. Kontrollen bekräftar beräkning och kopplingar, men innebär ingen empirisk validering av modellernas nivåer eller åtgärdernas faktiska effekt.

https://nic-esp.github.io/miljotillstandsrisker/data/numeric-audit.json

[BOV23] Boverket: Redovisning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen år 2023

Statistik om antagna och överklagade detaljplaner samt upphävanden, rapport 2024:10, s. 14–16. Antalen gäller planbeslut och ska inte likställas med försenade byggstarter eller en matchad ärendekohort. Kontrollerad 22 oktober 2026.

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2024/redovisning-av-tillampningen-av-plan--och-bygglagstiftningen-ar-2023.pdf

[LTU26] Luleå tekniska universitet: Kunskapsglapp fördröjer miljötillstånd

Publicerad 24 mars 2026. Redovisning av studie om fullständighet och handläggningstider i ansökningar hos miljöprövningsdelegationerna. Måttet ofullständig ansökan är bredare än upprepade kompletteringsrundor. Kontrollerad 22 oktober 2026.

https://www.ltu.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2026-03-24-kunskapsglapp-fordrojer-miljotillstand

Intervjukällor

[I01] Intervjukälla I01 · Offentlig förvaltning och organisationsförändring

[I02] Intervjukälla I02 · Erfarenhet från näringsliv och förvaltning

[I03] Intervjukälla I03 · Industriell projektutveckling

[I04] Intervjukälla I04 · Industri och logistik

[I05] Intervjukälla I05 · Infrastruktur och anläggning

BILAGOR

A Metod och måttens betydelse

Bilagan beskriver hur riskunderlaget har strukturerats, hur bedömningarna har omräknats och vilka slutsatser måtten medger.

Analysen börjar i ett register där varje risk har ett identifierat händelseförlopp och en direkt koppling till en processnod. Orsaker, händelse och konsekvenser redovisas som en bow tie. Kontrollerna kopplas till riskerna och, där underlaget anger detta, till särskilda orsaker eller konsekvenser. Strukturen används för att undersöka likheter, gemensamma åtgärder och processberoenden. En sådan koppling är ett dokumenterat samband i analysunderlaget och innebär inte i sig att ett orsakssamband är statistiskt verifierat. [REG, RES, CODE]

Mätningen bygger på jämförande bedömningar av riskerna och kalibrering mot absoluta referensnivåer. Bradley–Terry–Luce-modellen används för att anpassa en relativ skala till jämförelserna. Den relativa rangordningen anger hur risker förhåller sig till varandra inom bedömningen. För att kunna uttrycka resultaten som händelser per år eller kronor behövs dessutom jämförelser mot angivna frekvens- och kostnadsankare. Modellresultat förs vidare till beloppsberäkningen när de har godkänd absolut kalibrering och en användbar skattning. Komponenter från riskbeskrivningar har separat dokumenterad grund och tillskrivs inte modellens kalibreringsstatus. Kalibrering beskriver hur skalan kopplas till enheterna; den visar inte ensam att bedömningarna stämmer med observerade utfall. [REG, RES, CODE, SRC]

Den använda omfattningen avser händelser i svenska prövningsärenden och projekt under ett år. Konsekvensen gäller den enskilda händelsen i ett projekt. Analysen skiljer på bedömningar utan och med kontroller och använder läget utan kontroller som utgångspunkt, eftersom ingen av de föreslagna åtgärderna ännu är införd. Frekvens- och kostnadsbedömningarna är lognormala parameterfördelningar. Median och medelvärde har beräknats analytiskt från de sparade läges- och spridningsparametrarna för detta utgångsläge, vilket bevarar mätningens fördelningsantagande utan en ny simulering. [REG, RES, CODE]

För modellkomponenterna används medianen som central parameterbedömning. I den lognormala fördelningen är den exp(μ), där μ är läget på logaritmisk skala. En källa som i stället anger ett jämförbart bedömningsintervall från a till b representeras av punkten (a + b) / 2. Denna aritmetiska mittpunkt är ett analysval och har ingen statistisk median- eller medelvärdesegenskap. Årsindikatorn beräknas därefter som använd frekvens × använd händelsekostnad. Formeln gör det möjligt att följa beloppet till dess två komponenter, men sammanfattar inte fördelningen av verkliga ekonomiska utfall under ett år. Ett sådant utfall påverkas även av hur många händelser som inträffar och hur deras enskilda kostnader varierar. [REG, RES, CODE, SRC]

Median och medelvärde är skilda statistiska mått. För en lognormal bedömning är medelvärdet $\exp(\mu + \sigma^2/2)$, vilket gör det känsligt för spridningen σ. Rapportens kostnadsindikator bygger på de angivna median- eller källpunkterna och ska därför inte beskrivas som ett förväntat årsmedel. Frekvens och händelsekostnad måste avse jämförbar händelseenhet, period och ekonomisk avgränsning för att deras produkt ska vara meningsfull. Om samma kostnad återkommer i flera riskbeskrivningar behöver den fördelas innan en nationell total kan skattas. En ren addition av indikatorerna löser varken denna dubbelräkning eller frågan om statistiska beroenden mellan riskerna. [REG, RES, CODE, SRC]

Det tillgängliga underlaget innehåller även Monte Carlo-resultat för parameterosäkerhet. Dessa behålls som källresultat och kan användas för att kontrollera och fördjupa tolkningen av bedömningarna. Det finns däremot ingen användbar gemensam monetär årsförlustfördelning som motiverar en redovisning av portföljmedian eller övre förlustkvantiler. Rapporten visar därför inte något sådant diagram. Fler simulerade utfall skulle i sig inte lösa frågor om händelseenhet, ekonomisk dubbelräkning eller osäkerhet i grundbedömningarna. [REG, RES, CODE]

Riskernas årsindikatorer kan summeras för att beskriva ett visst urval, men summan är varken en portföljmedian eller en förväntad nationell kostnad. Två processhinder kan löpa samtidigt och båda beskriva kostnaden för samma förseningsperiod. Ett statistiskt beroende mellan händelserna är en annan fråga än denna ekonomiska dubbelräkning. Rapportens summeringar används därför för att jämföra samma riskposter före och efter ett kontrollurval, med redovisad täckning och beräkningsgrund. En nationell kostnadsbedömning kräver ett projektbaserat underlag där kostnaderna fördelas mellan händelser och perioder. [REG, RES, CODE]

Källuppgifter bedöms efter vad de avser och hur väl de motsvarar riskens definition. Dokumenterad historik för samma händelse, population, period och ekonomiska avgränsning har företräde framför en ospecificerad bedömning. Antal inkomna, avgjorda och pågående ärenden får inte användas som utbytbara mått. Ett investeringsbelopp är inte en förlust och en kostnad per förseningsår kräver en relevant förseningsperiod. För beskrivningsintervall behöver det framgå att ramen gäller just den aktuella händelsen. Avrundade typiska storleksordningar är inga hårda gränser; små avvikelser eller olika populationer behöver bedömas sakligt. Underlag som inte kan förenas på denna nivå ger ingen jämförbar huvudindikator. [REG, RES, CODE, SRC]

Vid läsning av ett belopp behöver ursprung och statistiskt mått skiljas åt. En modellmedian är ett centralvärde i en bedömningsfördelning, ett modellmedelvärde påverkas även av fördelningens spridning och en beskrivningsmittpunkt är en beslutad jämförelsepunkt mellan två uttryckliga gränser. Ingen av dessa beteckningar innebär att beloppet har observerats i verkliga ärenden. Årliga kostnadsindikatorer är produkter av de använda komponenterna. Kontrollernas kronbidrag är ytterligare en härledning, där modellens relativa effekt tillämpas på

samma kostnadsgrund. Figurer och tabeller anger därför både underlag och beräkning, medan riskkort och granskningsdata redovisar varje komponents ursprung. [REG, RES, SRC, NUM]

BILAGOR

B Datakvalitet och källkritisk bedömning

Uppgifternas användbarhet beror på händelse, population, period och ekonomisk avgränsning, utöver att själva beräkningen är korrekt.

Källgranskningen bedömer om uppgifterna avser rätt händelse, population, tidsperiod och kostnadsbegrepp. Den skiljer detta från kontrollen av enheter, riskidentiteter och aritmetik. En numeriskt korrekt produkt kan fortfarande bygga på en svagt belagd händelsefrekvens eller på kostnader som överlappar andra risker. Granskningen redovisar därför både vilket underlag som används och vilken kunskap som saknas. En odefinierad indikator innebär att ekonomisk jämförbarhet saknas; risken ingår ändå i beskrivningar, processkartor och kontrollkopplingar. [RES, REG, SRC]

För 321 av registrets 342 risker finns en användbar kostnadsindikator. För 285 utgörs båda komponenterna av modellmedianer, medan 36 kombinerar en modellmedian med en bedömningsmittpunkt från riskbeskrivningen. En modellfrekvens på mer än 10 000 händelser per år eller en händelsekostnad på mer än 10 miljarder kronor kräver särskild granskning av stöd och exponering. Även värden under dessa nivåer kan vara olämpliga när population eller kostnadsdefinition inte stämmer. Bland de 21 risker som saknar huvudindikator ingår en inte i mätningens riskurval. [RES, REG, SRC]

En individuell genomgång av händelse, källor och kostnadsavgränsning omfattar 80 risker, däribland samtliga i kostnadstopp 50. För dessa finns dokumenterade skäl till den använda komponenten eller till att en indikator saknas. Modellen har exempelvis inte jämförts direkt med antalet MPD-ärenden när riskdefinitionen även omfattar domstolsmål. Historiska vindkraftsavslag under en viss beslutsomgång har inte heller behandlats som en stationär årlig frekvens. Sådana skillnader i population och period är avgörande för om en källa kan användas numeriskt eller enbart som bakgrund. [RES, REG, SRC]

Utöver den individuella källgranskningen finns en genomgång av numeriska uppgifter i ytterligare 176 riskbeskrivningar. Denna genomgång identifierar användbara uppgifter och begränsningar i den tillhandahållna texten, men innebär inte att varje bakomliggande extern referens är verifierad. Totalt saknar 262 risker motsvarande fördjupade individuella

källgranskning. Det är därför viktigt att även väl kalibrerade modellvärden läses som bedömningar. Ett underlag kan vara tillräckligt för jämförande prioritering utan att ge stöd för en empiriskt fastställd nationell kostnad. [RES, REG, SRC]

Figur 15. Den individuella källgranskningens omfattning



80 risker har granskats individuellt avseende händelse, population, källuppgifter och kostnadsavgränsning; 262 saknar motsvarande fördjupade granskning. Samtliga risker i topp 50 ingår bland de 80. Den separata aritmetiska kontrollen omfattar alla 342 risker och innebär ingen empirisk validering. · Källa: REG, RES

Ursprung och datum: Individuell källgranskning och oberoende aritmetisk kontroll 2026-10-22 (SRC, NUM).

Statistik och beräkning: Antal registerrisker med respektive utan fördjupad individuell källgranskning. Detta är granskningsomfattning, inte en bedömning av faktisk risk eller av hur många modellvärden som är korrekta. Den aritmetiska kontrollen omfattar samtliga 342 risker.

För en beskrivningsskattning dokumenteras den exakta texten, enheten, populationen och hur värdet används. Orden typisk kostnad och storleksordning anger inte en statistisk fördelning. Väsentliga historiska påståenden i den individuella granskningen har kontrollerats mot primärkällor, bland annat Naturvårdsverkets ärendestatistik och Boverkets planstatistik. Kontrollernas omfattning och kvarstående luckor framgår per risk. Ett verifierat enskilt fall kan styrka att en mekanism förekommer utan att ge ett representativt förlustbelopp eller en nationell frekvens. [RES, REG, SRC]

Modellkomponenter och beskrivningsskattningar lagras åtskilda med sina definitioner. För varje risk går det att följa vilka komponenter som använts i indikatorn och om ett uttryckligt källintervall finns. De historiska uppgifterna redovisas med källa, period och begränsning i jämförbarhet. Ingen risk har genom detta arbete klassats som empiriskt validerad. En sådan validering skulle kräva ett tillräckligt representativt underlag om faktiska händelser och kostnader, med samma avgränsning som modellens bedömning. [RES, REG, SRC]

Osäkerheten ska påverka hur resultatet används. En risk vars indikator är koncentrerad till en svagt belagd kostnadsdel bör undersökas i konkreta projekt innan beloppet används i en investeringskalkyl. Där kostnaden anges för en odefinierad period eller blandar olika händelser lämnas indikatorn odefinierad. Där ett intervall är användbart redovisas hela ramen tillsammans med mittpunkten. Dessa principer gör det möjligt att prioritera fortsatt arbete samtidigt som underlagets begränsningar går att följa. [REG, RES, CODE, SRC]

En oberoende aritmetisk kontroll omfattar samtliga 342 risker och har stämt av komponenter, produkter, rangordning och kontrollkopplingar utan upptäckta räknefel. På komponentnivå finns 632 modellmedianer, 36 mittpunkter i beskrivningsintervall och 16 saknade användbara

komponenter. Dessa antal är inte samma sak som antalet risker utan huvudindikator, eftersom även kombinationens användbarhet prövas. Effektunderlag finns för 377 av 378 kontroller. Den saknade kontrollen är C-SRC-R-B40-GN170-02 och tillhör inte myndighetsåtgärderna. Saknade effekter behandlas som odefinierade och används inte som noll. [REG, RES, SRC, NUM]

BILAGOR

C Intervjumetod och analysmatris

Intervjuerna används för att förstå förlopp och pröva förbättringsförslag, med öppna begränsningar i urval och återgivning.

Underlaget består av fem dokument och omfattar sex medverkande personer. De representerar offentlig förvaltning, erfarenhet från bransch och förvaltning, industriell projektutveckling, industri och logistik samt infrastruktur och anläggning. Ett dokument sammanfattar ett samtal med två personer. Rapporten räknar därför inte varje dokument som en statistiskt oberoende observation av samma fenomen. [I01, I02, I03, I04, I05]

Dokumenten har lästs i sin helhet och delats in med stabila styckehänvisningar. Analysen har först identifierat beskrivna händelser och förlopp, därefter kopplat dem till teman och slutligen jämfört dem med risk- och kontrollregistret. Skillnaden mellan respondentens uppgift och rapportens tolkning har bevarats. Företagsspecifika uppgifter om tid och handläggning har inte gjorts om till absoluta frekvenser eller kostnader.

Tabell C1. Tematisk analysmatris

Tema	Källstöd	Praktisk tolkning och begränsning
Fullständighet och återkoppling	I03 stycke 8 och 13; I04 stycke 14–15	Tidsprognos behöver omfatta vägen till komplett ansökan. Ärendehistorikerna är inte aktgranskade.
Sena krav och säsongsfönster	I05 stycke 16–17	Tidpunkt för identifiering kan få stor betydelse. Omfattning i hela populationen är okänd.
Kompetens och variation	I02 stycke 9–11; I03 stycke 10; I04 stycke 19–23	Möjligt gemensamt förbättringsområde. Ärendekomplexitet och bemanning kan inte separeras kvantitativt.
Överlämning och kontinuitet	I05 stycke 24 och 62; I01 stycke 9–11	Dokumenterad avgränsning och projektversion bör följa ärendet. Implementerad effekt har inte uppmätts.
Företagets egen förmåga	I04 stycke 21 och 32; I05 stycke 37–40	Förberedelser kan minska omtag men löser inte alla myndighetsberoenden.
Samband med finansiering och start	I03 stycke 35–36; I05 stycke 44–51	Projektets samlade tidplan behövs. Uppgifterna ger ingen generell nät- eller stödregel.
Motexempel och variation	I03 stycke 10 och 22; I04 stycke 13 och 49	Positiva erfarenheter och begränsad förekomst ska påverka tolkningen.

Ursprung och beräkning: Register-, intervju- och bedömningsunderlag för rapportutgåvan 2026-10-22. Klassningar och kopplingar är dokumenterade analysuppgifter, inte observerade effekter. Se respektive angiven källa. [REG, RES, SRC, NUM]

C.1 Frågeställningens påverkan

I04 och I05 presenterar tre högt rankade riskexempel innan intervjupersonerna kommenterar dem. Detta skapar en risk för styrning av uppmärksamheten. Analysen har därför inte räknat instämmande som en oberoende validering av rangordningen. Särskild vikt har lagts vid nyanseringar, ytterligare förlopp och exempel som avviker från den presenterade listan. [I04, I05]

C.2 Återgivning och citat

De publicerade utdragen är kontrollerade mot dokumentens text och försedda med styckehänvisning. Den redaktionella granskningen innebär inte att anteckningarnas alla sakuppgifter är externt verifierade eller att intervjupersonerna har godkänt rapportens samlade slutsatser. Där en anteckning beskriver ett konkret ärende anges uppgiften som en erfarenhet i materialet. Den används för att förklara ett möjligt förlopp och inte för att tillskriva en namngiven handläggare ansvar.

C.3 Fortsatt datainsamling

Ett nästa steg är att komplettera med ett avgränsat urval av ärendeakter och intervjuer från fler perspektiv, inklusive handläggare och verksamhetsutövare med olika storlek och erfarenhet. Samma händelseförlopp bör då följas från båda sidor och tidsuppgifterna stämmas av mot dokument. Detta skulle göra det möjligt att pröva om beskrivna mönster återkommer och vilka delar som beror på särskilda ärendeförhållanden.

BILAGOR

D Beräkning av kontrollernas bidrag

Kontrolljämförelsen använder samma risker och kostnadsunderlag före och efter ett valt åtgärdsurval.

Kontrollernas effektposter bygger på skillnaden mellan bedömda lägen utan och med kontroller, fördelad mellan de kontroller som är kopplade till risken. Fördelningen görs separat för frekvens och kostnad per händelse. Endast identifierade effekter med rätt risk- och kontrollkoppling används. En saknad effektpost är odefinierad och behandlas inte som noll. Även negativa bidrag bevaras, eftersom de är relevanta för granskning av bedömningens riktning och innehåll. [REG, RES, CODE]

Effekterna är angivna på logaritmisk skala. För ett valt kontrollurval summeras skiftet inom varje risk och dimension, varefter frekvens och händelsekostnad multipliceras med exp(−skiftet). Osäkerhetens bredd hålls konstant. Huvudjämförelsen beräknar sedan förändringen av samma risks källgranskade årsindikator från utgångsläget utan kontroller. Modellen antar därmed additiva skift på logaritmisk skala och multiplicativa förändringar på ursprunglig skala. Enskilda procenttal eller fristående kronbidrag adderas aldrig direkt. Effektfaktorerna beskriver bedömda proportionella förändringar och ger ingen uppmätt besparing. [REG, RES, CODE, SRC]

Den kombinerade beräkningen förutsätter att särskilda samspel mellan åtgärder inte tillför ytterligare effekter. I praktiken kan en åtgärd göra en annan möjlig eller minska dess betydelse. Modellen ska därför läsas som en jämförelse under detta antagande, inte som en empiriskt skattad funktion för varje tänkbar kombination. På webbplatsen går det även att se vad en åtgärd tillför när övriga valda åtgärder behålls. Det är skillnaden mellan kombinationen med och utan just den åtgärden, och sådana bidrag ska inte summeras till en total. [REG, RES, CODE]

Kronjämförelsen omfattar endast risker med en användbar källgranskad årsindikator och ett fullständigt effektunderlag för det valda urvalet. Samma riskmängd används i referens och åtgärdsläge, och täckningen visas bredvid resultatet. En positiv förändring beskriver en modellerad minskning av indikatorernas summa inom detta underlag. Genomförandekostnader saknas för samtliga föreslagna åtgärder, vilket innebär att nettonytta och avkastning lämnas odefinierade. Modellvärden på noll har inte använts som belägg för att en kontroll är kostnadsfri. Skillnader i ekonomisk vikt mellan riskerna kan påverka både kontrollernas ordning och tecknet på ett samlat bidrag. När ett källvärde används antas samma proportionella

effektfaktor gälla även detta nya utgångsvärde. Det är en överföring av bedömd effekt, vars relevans behöver prövas vid fortsatt beredning, och ingen uppmätt riskreduktion efter genomförande. [REG, RES, CODE, SRC]

De 500 unika risk–kontrollparen och de 342 direkta processnodkopplingarna har stämts av mellan webbplatsens register och mätunderlaget. Kopplingarna till enskilda bow tie-element är inte helt identiska mellan källorna. Därför används riskregistrets målrelationer för den visuella beskrivningen och mätningens effekter på risk- och kontrollnivå för beräkningen. Resultatet fördelas inte på enskilda orsaker eller konsekvenser som om en sådan detaljeffekt vore uppmätt. En senare analys på den nivån behöver först stämma av målrelationerna. [REG, RES, CODE]

BILAGOR

E Underlag, avgränsning och möjlighet till granskning

Rapport, tabeller och figurer bygger på samma daterade underlag.

Analysen omfattar 342 risker, sju delprocesser och 378 kontroller. Modellbedömningen är daterad den 22 oktober 2026, svensk tid, och innehåller 341 av registerriskerna. Källor, omfattning och kopplingar hör till samma fastställda underlag. Riskidentiteter och kontrollrelationer används för att säkerställa att rätt effekt tillämpas på rätt risk. Baslinjen är ett läge där ingen av de föreslagna kontrollerna är införd; alla åtgärdsjämförelser avser därför möjliga insatser. [REG, RES, CODE]

Rapportens ekonomiska uppgifter kan följas till publicerade data om riskernas komponenter, kostnadsindikatorer, rangordning och kontrollernas effektposter. Den individuella källgranskningen redovisar beskrivningsintervall, historiska uppgifter och bedömningar av jämförbarhet. Den aritmetiska kontrollen redovisar underlag och beräkning för samtliga risker och kontroller. Tekniska identiteter och kontrollsummor finns i dataunderlaget för reproducerbarhet, medan rapporten använder läsbara hänvisningar. Denna dokumentation gör det möjligt att undersöka både ett aggregerat resultat och de enskilda riskposter som bär det. [REG, RES, CODE, SRC]

Intervjuutdragen är kopplade till dokument och styckepositioner. Personuppgifter och privata original som inte omfattas av publiceringen ingår inte i det offentliga underlaget. Rapportens webb- och PDF-format återger samma text, tabeller och bedömningstidpunkt. Sakuppgifter från intervjuer skiljs från rapportens analytiska slutsatser, och företagsspecifika erfarenheter

används inte som nationella frekvensmått. Källhänvisningarna ger därmed både möjlighet att följa ett påstående och stöd för att förstå vilken typ av belägg det bygger på. [REG, RES, CODE]

REGISTERBILAGOR

F Kostnadstopp 50

Rangordningen använder granskad frekvens och händelsekostnad utan införda kontroller, med källbaserade ersättningar där modellnivån bedömts orimlig.

Tabellen anger de 50 högsta årliga kostnadsindikatorerna i miljoner kronor. Varje indikator är produkten av använd händelsefrekvens och använd händelsekostnad, med komponenternas statistiska typ angiven på raden. Modellmedianer och beskrivningsmittpunkter är bedömningar med olika ursprung. Samtliga risker i tabellen omfattas av den individuella källgranskningen, och källintervall samt jämförbarhetsfrågor finns i riskernas detaljunderlag. Beloppen är prioriteringsindikatorer och ska inte läsas som observerade årskostnader eller summeras till en nationell förlust utan granskning av ekonomiska överlapp. [REG, RES, SRC]

Tabell F1. Rangordning efter källgranskad årlig kostnadsindikator

Rang och risk	Riskhändelse	Indikator, mnkr/år
1. R-B40-P120-01	Handläggningstiden i vattenmål påverkar projektets tidplan Beräkning: modellmedian × källintervallens mittpunkt.	11 194,9
2. R-B60-250-02	Överprövningens handläggningstid påverkar projektet Beräkning: modellmedian × modellmedian.	8 239,2
3. R-B50-E050-01	Ledningsrätt eller markupplåtelseavtal blir inte klart i tid – byggstart blockeras trots koncession Beräkning: modellmedian × modellmedian.	6 948,6
4. R-B60-G040-01	Kompletteringskraven blir en ändlös pingisrunda Beräkning: modellmedian × modellmedian.	5 813,3
5. R-B50-G900-01	AND-gatens sista spår blir projektets kritiska linje Beräkning: modellmedian × källintervallens mittpunkt.	4 346,9
6. R-B70-G090-03	Sektorsbeslutet har ännu inte fått laga kraft eller kan inte tas i anspråk Beräkning: modellmedian × källintervallens mittpunkt.	4 144,7
7. R-B50-GN040-02	Instanserna landar i olika bedömningar av samma bevisning Beräkning: modellmedian × modellmedian.	3 875,1
8. R-B50-P040-01	Lovansökan krockar med icke lagakraftvunnen plan eller kvarstående överklaganderisker Beräkning: modellmedian × källintervallens mittpunkt.	3 629,0
9. R-B60-260-01	Uteblivet prövningstillstånd lämnar MMD:s avgörande stående utan sakprövning i MÖD Beräkning: modellmedian × modellmedian.	3 238,3
10. R-B40-START-01	Vattenpåverkan upptäcks för sent i genomförandekonceptet Beräkning: modellmedian × modellmedian.	3 026,4
11. R-B40-G070-01	Fel spår väljs: undantag trots att tillståndsplikt föreligger Beräkning: modellmedian × modellmedian.	2 854,5
12. R-B40-G020-01	Felklassificering av tillfällig grundvattenbortledning Beräkning: modellmedian × modellmedian.	2 559,3

Rang och risk	Riskhändelse	Indikator, mnkr/år
13. R-B60-070-01	Utebliven eller slarvig tidsplan urholkar handläggningstempot Beräkning: modellmedian × modellmedian.	2 448,5
14. R-B50-T030-01	Vatten-, Natura- och artskyddsbeslut ligger efter planen och blockerar etapper Beräkning: modellmedian × källintervallens mittpunkt.	2 394,9
15. R-B50-X040-01	Dispens- och skyddsbeslut överklagas och gaten skjuts upp Beräkning: modellmedian × modellmedian.	2 388,8
16. R-B50-P020-01	Lokal opinion och samrådsmotstånd förlänger eller omkullkastar planarbetet Beräkning: modellmedian × modellmedian.	2 384,4
17. R-B70-G050-03	Tillståndshavarens ekonomiska svikt underminerar säkerhets- och garantistrukturen Beräkning: modellmedian × modellmedian.	2 329,1
18. R-B50-E020-01	Ansökan bedöms som ofullständig och måste kompletteras innan sakprövningen går vidare Beräkning: modellmedian × modellmedian.	2 307,5
19. R-B10-080-01	Samordningsmöjligheten missas och prövningarna körs isolerat med motstridiga utfall Beräkning: modellmedian × källintervallens mittpunkt.	2 208,9
20. R-B50-P050-01	Överklagandekedjan länsstyrelse–MMD–MÖD stoppar byggstart Beräkning: modellmedian × modellmedian.	2 198,4
21. R-B50-X030-02	Omprojektering för att undvika förbudet urholkar projektets funktion eller ekonomi Beräkning: modellmedian × källintervallens mittpunkt.	2 133,9
22. R-B30-070-01	MKB:n täcker inte den prövning som faktiskt krävs Beräkning: modellmedian × källintervallens mittpunkt.	1 949,6
23. R-B70-END-01	Byggberedskapen urholkas av att tillståndet aldrig tas i anspråk innan fristens utgång Beräkning: modellmedian × modellmedian.	1 923,7
24. R-B20-010-02	Säsongsberoende basdata hinner inte samlas in Beräkning: modellmedian × modellmedian.	1 866,3

Rang och risk	Riskhändelse	Indikator, mnkr/år
25. R-B10-060-03	Sektorsspelregler identifieras inte i klassificeringen Beräkning: modellmedian × källintervallens mittpunkt.	1 846,1
26. R-B60-180-01	Natura 2000- eller artskyddskraven kan inte uppfyllas Beräkning: modellmedian × modellmedian.	1 831,1
27. R-B50-P010-01	Kommunens planmonopol: ovilja eller köstopp stoppar projektet i förhand Beräkning: modellmedian × modellmedian.	1 699,8
28. R-B50-M030-02	Koncessionsbeslut angrips genom överklagande eller rättsprövning Beräkning: modellmedian × modellmedian.	1 603,6
29. R-B50-P030-01	Antagen detaljplan överklagas och laga kraft skjuts upp Beräkning: modellmedian × modellmedian.	1 527,1
30. R-B40-P100-01	B20:s miljöunderlag är föråldrat eller fel avgränsat för vattenfrågorna Beräkning: modellmedian × modellmedian.	1 522,2
31. R-B40-030-01	Hydrologiskt och hydrogeologiskt underlag håller inte domstolsmått Beräkning: modellmedian × modellmedian.	1 493,2
32. R-B40-010-02	Tillfälliga arbeten och grundvattenbortledning faller utanför avgränsningen Beräkning: modellmedian × källintervallens mittpunkt.	1 489,9
33. R-B40-G020-03	Sammansatt åtgärd klassificeras bara delvis Beräkning: modellmedian × modellmedian.	1 486,0
34. R-B40-P110-02	Ersättnings- och sakägaravsnitt provocerar fram motstånd Beräkning: modellmedian × modellmedian.	1 433,3
35. R-B70-G020-01	Överklagande inkommer på sista fristdagen och ändrar finalitetsstatusen Beräkning: modellmedian × modellmedian.	1 307,0
36. R-B50-START-01	Osynliga spår blockerar byggstart trots färdigt huvudtillstånd Beräkning: modellmedian × källintervallens mittpunkt.	1 178,6
37. R-B40-010-03	Följdåtgärder utanför huvudplatsen missas Beräkning: modellmedian × modellmedian.	1 176,5
38. R-B50-E010-01	Korridorvalet kolliderar med riksintressen, rennäring eller Natura 2000 Beräkning: modellmedian × källintervallens mittpunkt.	1 147,9

Rang och risk	Riskhändelse	Indikator, mnkr/år
39. R-B40-N180-03	Parallella beslut och rättigheter är inte synkade vid start Beräkning: modellmedian × modellmedian.	1 116,4
40. R-B70-G070-01	Markägare vägrar avtal – ledningsrättsspåret försenar genomföranderätten Beräkning: modellmedian × modellmedian.	1 063,1
41. R-B60-190-01	Otydliga eller overkställbara villkor föder nya processer efter beslutet Beräkning: modellmedian × modellmedian.	1 006,3
42. R-B50-P010-02	Felbedömt planbehov: projektet bedöms inte kräva plan – och tvingas ändå till det sent Beräkning: modellmedian × källintervallens mittpunkt.	996,9
43. R-B10-050-02	Kommunalt veto eller negativ kommunal signal låser projektet i startgroparna Beräkning: modellmedian × modellmedian.	987,0
44. R-B10-040-01	Säsongsberoende inventeringar missar sitt fältfönster Beräkning: modellmedian × modellmedian.	985,0
45. R-B40-G020-02	Gränsdragning mot husbehov och undantagna smååtgärder feltolkas Beräkning: modellmedian × modellmedian.	965,8
46. R-B20-060-03	Komplex effektmodellering ifrågasätts i prövningen Beräkning: modellmedian × modellmedian.	952,8
47. R-B50-P030-03	Planens laga kraft avvaktar inte miljöprövningens – beroendekrock mellan spåren Beräkning: modellmedian × källintervallens mittpunkt.	943,1
48. R-B20-G010-02	Sektorsspår och Natura-kollisioner fångas inte i vägvalet Beräkning: modellmedian × källintervallens mittpunkt.	931,3
49. R-B60-050-01	Säsongsberoende kompletteringar missar fönstret Beräkning: modellmedian × modellmedian.	928,1
50. R-B50-T030-02	Markinlösen och fastighetsbildning drar ut på tiden längs sträckan Beräkning: modellmedian × modellmedian.	890,7

Ursprung och beräkning: Riskbedömning 2026-10-22 och källgranskning samma datum. Frekvenspunkt × kostnadspunkt; komponenternas ursprung anges på varje rad. Beskrivningsmittpunkter är bedömningar och modellmedianer är modellskattningar. Ingen indikator är ett observerat årsbelopp eller en statistisk årsmedian. [REG, RES, SRC, NUM]

REGISTERBILAGOR

G Myndighetsåtgärder och ekonomiskt jämförelseunderlag

Alla åtgärder är förslag. Täckning och beräknat bidrag behöver läsas tillsammans med mandat och genomförandekostnad.

Bilagan redovisar samtliga 20 myndighetsdrivna åtgärder i ekonomisk rangordning, med huvudscenariots 17 förslag åtskilda från organisationsövergång och framtida mandat. Rangordningen avser fristående minskning av kostnadsindikatorn när endast den aktuella åtgärden införs. Tabellen visar både rang inom huvudscenariot och en beräkningsteknisk rang bland alla 20; den senare förändrar inte mandatet. Procentsatsen använder varje åtgärds eget prissatta riskunderlag som nämnare. Antalet negativa riskbidrag visar hur många kopplade risker som får en högre indikator i den fristående modellberäkningen. Åtgärdskostnader saknas, och beloppen är varken uppmätta besparingar eller nettonytta. [MYN, RES, SRC, NUM]

Tabell G1. Huvudscenariots 17 åtgärder i ekonomisk ordning

Rang S1 / alla 20 · åtgärd	Prissatta / kopplade risker	Fristående minskning, mnkr/år; procent	Negativa riskbidrag
1 / 1 · MPM-11 · Juridisk och teknisk kvalitetssäkring av egna beslut	5 / 6	2 209,0; 34,4 %	0
2 / 2 · MPM-05 · Samlad och preciserad fullständighetsgranskning	7 / 8	1 218,3; 15,8 %	1
3 / 3 · MPM-03 · Samordnad handläggning när sambandsregeln medger det	2 / 2	1 165,4; 46,8 %	0
4 / 4 · MPM-07 · Aktiv tidsplanering och bevakning av egen handläggning	3 / 3	1 021,4; 32,8 %	0
5 / 5 · MPM-12 · Entydiga och inbördes förenliga tillståndsvillkor	6 / 6	447,4; 28,7 %	2
6 / 6 · MPM-06 · Tidig identifiering av säsongsberoende underlagsbehov	1 / 1	306,8; 33,1 %	0
7 / 7 · MPM-13 · Kontrollerad kungörelse, delgivning och överklagandeinformation	8 / 8	247,9; 12,0 %	0
8 / 8 · MPM-04 · Överenskomna gränssnitt med andra beslutsorgan	3 / 3	207,5; 36,0 %	0
9 / 9 · MPM-01 · Dokumenterad och avgränsad processvägledning	11 / 11	176,2; 13,4 %	1
10 / 10 · MPM-09 · Strukturerad remiss och kommunicering	5 / 5	153,6; 12,3 %	3
11 / 11 · MPM-02 · Tidig kontroll av behörighet och prövningsram	10 / 10	113,6; 46,2 %	1
12 / 12 · MPM-08 · Gemensam kapacitets- och specialistfördelning	2 / 3	106,1; 3,6 %	0
13 / 13 · MPM-15 · Samlad prövning av säkerhet och andra egna förstartsgodkännanden	3 / 3	105,7; 11,8 %	2

Rang S1 / alla 20 · åtgärd	Prissatta / kopplade risker	Fristående minskning, mnkr/år; procent	Negativa riskbidrag
14 / 14 · MPM-14 · Komplett överlämnande och kompetent myndighetsmotpart	2 / 2	42,2; 51,8 %	1
15 / 15 · MPM-10 · Spårbar ärendeakt och versionskontroll	6 / 6	32,8; 0,5 %	1
16 / 16 · MPM-16 · Riktad hantering efter återförvisning	2 / 2	30,6; 32,8 %	0
17 / 20 · MPM-17 · Tidig jävs- och behörighetskontroll för egen bemanning	1 / 1	-0,053; -30,9 %	1

Ursprung och beräkning: Risk- och kontrollbedömning 2026-10-22, källgranskning och oberoende omräkning samma datum. Kronbidrag = summan av varje jämförbar riskindikator × (1 − exp(−frekvensskift − kostnadsskift)). Procentsats = detta bidrag / samma riskers indikatorer utan åtgärd. Rangordning efter fristående kronbidrag; negativa bidrag bevaras. Ingen genomförandekostnad eller ekonomisk dubbelräkning är avräknad. [MYN, RES, SRC, NUM]

Tabell G2. Organisationsövergång, utanför huvudscenariot

Rang S1 / alla 20 · åtgärd	Prissatta / kopplade risker	Fristående minskning, mnkr/år; procent	Negativa riskbidrag
— / 17 · MPM-T01 · Verifierad överföring vid myndighetsstart	8 / 9	3,2; 2,5 %	0

Ursprung och beräkning: Risk- och kontrollbedömning 2026-10-22, källgranskning och oberoende omräkning samma datum. Kronbidrag = summan av varje jämförbar riskindikator × (1 − exp(−frekvensskift − kostnadsskift)). Procentsats = detta bidrag / samma riskers indikatorer utan åtgärd. Rangordning efter fristående kronbidrag; negativa bidrag bevaras. Ingen genomförandekostnad eller ekonomisk dubbelräkning är avräknad. [MYN, RES, SRC, NUM]

Tabell G3. Förslag som kräver framtida mandat

Rang S1 / alla 20 · åtgärd	Prissatta / kopplade risker	Fristående minskning, mnkr/år; procent	Negativa riskbidrag
— / 18 · MPM-F02 · Gemensam kontaktpunkt för flera tillståndsspår	2 / 2	0,998; 1,3 %	0
— / 19 · MPM-F01 · Samlad myndighetsledning av BMP och MKB-avgränsning	4 / 4	0,479; 1,8 %	0

Ursprung och beräkning: Risk- och kontrollbedömning 2026-10-22, källgranskning och oberoende omräkning samma datum. Kronbidrag = summan av varje jämförbar riskindikator × (1 − exp(−frekvensskift − kostnadsskift)). Procentsats = detta bidrag / samma riskers indikatorer utan åtgärd. Rangordning efter fristående kronbidrag; negativa bidrag bevaras. Ingen genomförandekostnad eller ekonomisk dubbelräkning är avräknad. [MYN, RES, SRC, NUM]

REGISTERBILAGOR

H Risker utan jämförbar årlig kostnadsindikator

Listan visar vad som återstår för att en jämförbar årlig kostnadsindikator ska kunna redovisas.

De 21 riskerna i tabellen saknar en jämförbar årlig kostnadsindikator. Tjugo ingår i modellbedömningen och en ligger utanför dess urval. Orsakerna gäller bland annat saknad användbar kalibrering, höga komponentvärden utan tillräckligt stöd samt problem med händelsepopulation, tidsperiod eller ekonomisk avgränsning. Beskrivningar, processkopplingar och tillgängliga delmått finns kvar för samtliga risker. Ett saknat belopp har ingen numerisk innebörd och ska inte läsas som noll. Tabellen anger vilken uppgift eller avgränsning som behövs för att en ekonomisk jämförelse ska bli möjlig. [REG, RES, SRC]

Tabell H1. Risker utan jämförbar källgranskad årsindikator

Risk	Händelse	Vad som saknas
R-B10-020-03	Försvars- och totalförsvarsintressen stoppar lokaliseringen på politisk nivå	Modellens 2,11 miljarder per stoppat projekt överstiger den enda angivna storleksramen omkring 1 miljard för havsvind; landvind anges mycket lägre. Beskrivningen blandar dessutom företagets förlust med förlorad klimatnytta och saknar en användbar gemensam kostnadsfördelning. Därför hålls kostnaden odefinierad i stället för att låta den osakligt höga punkten styra rangordningen.
R-B10-090-02	Företagsspecifik data smyger in i det generiska typfallet	Kalibrerad kostnadsfördelning saknas eller har endast ett gränsvärde.
R-B20-020-02	Lokal opinion mobiliserar och hårdnar under samrådet	192,40 händelser per år ligger tydligt över beskrivningens några tiotal till ett hundratal. Den formuleringen har ingen exakt nedre gräns som kan användas för en ärlig mittpunkt. Vindkraftsveton och planöverklaganden avser andra och delvis överlappande populationer. Lämna frekvens och årlig kostnadsrang odefinierade tills en jämförbar händelseavgränsning och ett numeriskt intervall finns.
R-B30-G110-03	Miljöprövningsdelegationens handläggningstid överskrider projektplanen	Modellens över 1 300 försenade MPD-ärenden per år överstiger beskrivningens totala ärendevolym på cirka 260–330. Jämförbar population och skillnaden mellan inflöde, avgjorda och pågående ärenden behöver klargöras.
R-B30-O100-02	Reformdriven omprövningsplikt träffar äldre tillstånd	Beskrivningens numeriska underlag avser vattenkraftens omprövning. Risken gäller reformdriven omprövningsplikt för miljöfarlig verksamhet, för vilken beskrivningen inte anger en tillämplig bindande ordning. Jämförbar händelsefrekvens saknas för denna riskpopulation.

Risk	Händelse	Vad som saknas
R-B40-GE120-02	12:6-samrådet kan pågå längre än sexveckorsspärren	Modellens median är cirka 3 553 försenade 12:6-samråd per år, medan den frysta riskbeskrivningen anger storleksordningen hundratals sådana förseningshändelser. Detta är en skillnad i storleksordning som behöver klarläggas, inte ett statistiskt bevis på ett visst sant årsantal. Kostnadsindikatorn hålls odefinierad tills händelsepopulation och skala kan förenas. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.
R-B40-GN170-02	Underrättelse om 'ingen åtgärd' ger falsk trygghet	Risken ingår inte i körningens frysta urval. Kalibrerad kostnadsfördelning saknas eller har endast ett gränsvärde.
R-B40-N110-01	Anmälningsunderlaget underdimensioneras i tron att 'det är bara en anmälan'	Modellens median är cirka 1 133 händelser per år, medan den frysta riskbeskrivningen bedömer 100–250 underdimensionerade vattenanmälningar som förskjuter starten per år. Samma händelse har därmed väsentligt olika frekvens i underlagen. Population och skala behöver klarläggas innan kostnadsindikatorn används; beskrivningsintervallet behålls utan vald mittpunkt. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.
R-B50-E040-01	Koncessionsbeslutet överklagas – lång överprövning hos regering eller domstol	Modellens 5,20 miljarder per koncessionsöverklagande saknar stöd i beskrivningens ekonomiska storleksordning. SSAB:s 6,2 miljarder är en investering; den citerade förlusten anges bara som hundratals miljoner per förseningsår. Utan händelsens förseningstid kan den inte omräknas till en per-händelsekostnad. Kostnaden och kostnadsrangen hålls därför odefinierade.
R-B50-M020-02	Kompletteringsbehov fördröjer koncessionsärendets sakprövning	Medianen för bedömd händelsekostnad överstiger 10 miljarder kronor. Kostnadens omfattning och jämförbarhet behöver särskilt beläggas.

Risk	Händelse	Vad som saknas
R-B50-M030-01	Hänskjutande till regeringen lägger till ett prövningsled med osäker tidsplan	Medianen för bedömd händelsekostnad överstiger 10 miljarder kronor. Kostnadens omfattning och jämförbarhet behöver särskilt beläggas. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.
R-B50-M040-01	Koncessionen räcker inte – miljötillståndet blir den verkliga flaskhalsen	Medianen för bedömd händelsekostnad överstiger 10 miljarder kronor. Kostnadens omfattning och jämförbarhet behöver särskilt beläggas.
R-B50-N050-02	Undantagsvägen i 29 § är politisk och oförutsägbar	Medianen för bedömd händelsekostnad överstiger 10 miljarder kronor. Kostnadens omfattning och jämförbarhet behöver särskilt beläggas. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.
R-B50-P050-03	Kompetens- och kapacitetsbrist i byggnadsnämnd förlänger tio-veckorsfristen	Frekvensmedianen 792,40 stöds endast av en bred bygglovspopulation. Riskbeskrivningen anger samtidigt få sådana händelser i stora industriärenden. Stockholms lokala urval om 150 bygglov under tre månader kan inte ge en nationell årlig frekvens för miljötillståndsprojekten. Lämna årsindikatorn odefinierad tills händelsepopulationen är klar; kostnadsmedianen 2,33 miljoner ligger inom beskrivningens 1–10 miljoner och kan bevaras separat.
R-B60-030-01	MKB-brister stjälper fullständighetsbedömningen	Frekvensmedianen överstiger 10 000 händelser per år. Jämförbar ärendevolym och exponeringsskala behöver särskilt beläggas.
R-B60-160-01	Regeringsprövningen är ett separat beslutssteg utan lagstadgad handläggningsfrist	Medianen för bedömd händelsekostnad överstiger 10 miljarder kronor. Kostnadens omfattning och jämförbarhet behöver särskilt beläggas. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.
R-B60-160-03	Rättsprövning skapar fortsatt processrisk utan automatisk inhibition	Medianen för bedömd händelsekostnad överstiger 10 miljarder kronor. Kostnadens omfattning och jämförbarhet behöver särskilt beläggas.

Risk	Händelse	Vad som saknas
R-B60-270-02	Prejudicerande avgörande flyttar rättsläget för hela branschen	Källtexten blandar antalet prejudicerande avgöranden med antalet berörda projekt och anger 1–10 per år utan entydig population. Modellens över 450 händelser per år kan inte förenas med denna beskrivningsram innan händelseenheten klargörs.
R-B60-G150-01	Sent förbehåll från regeringen kastar om hela beslutskedjan	Medianen för bedömd händelsekostnad överstiger 10 miljarder kronor. Kostnadens omfattning och jämförbarhet behöver särskilt beläggas. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.
R-B60-G210-01	Ett överklagande startar en separat överprövningskedja	Modellens median är cirka 2 726 nya överprövningskedjor per år, medan den frysta riskbeskrivningen anger cirka 300–500 per år för samma händelse inom miljöbalken, PBL och sektorskoncessioner. Skillnaden i händelsepopulation och skala behöver klarläggas innan ett kostnadsbelopp används. Beskrivningens intervall behålls separat utan vald mittpunkt. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.
R-B60-G230-02	S1-reformen ändrar instanskartan mitt i processen	Absolut frekvens saknas eller har endast ett gränsvärde. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.

Ursprung och beräkning: Register och dokumenterade granskningsbeslut 2026-10-22. Tabellen räknar risker utan användbar huvudindikator; frånvaro av belopp betyder inte noll kostnad. Förklaringar kan avse både modelluppgifter och jämförelser med riskbeskrivningar. [REG, RES, SRC, NUM]
