SVENSKT NÄRINGSLIV

ANALYSRAPPORT · OKTOBER 2026

Miljötillståndsrisker

Kostnader, processer och åtgärder för en mer förutsägbar prövning

En analys för Svenskt Näringsliv av tillståndsprocessens kostnader, återkommande störningar och möjliga förbättringar, med riskbedömningar, processkartor och intervjuer som underlag.

342 risker · 378 föreslagna motåtgärder · fem intervjukällor

17 kapitel och åtta bilagor om riskbild, åtgärder, genomförande och metod.

2026-10-22

Innehåll

01 Sammanfattning	3
02 Tillståndsprövningens betydelse för företagens investeringar	6
03 Den nya myndigheten och ansvaret för hela prövningskedjan	8
04 Riskernas kostnader och betydelse för prioriteringen	10
05 Var i processen riskerna får betydelse	14
06 Myndighetsrelaterade risker och möjligheten att påverka dem	17
07 Från oklart underlagsbehov till en användbar fullständighetsgranskning	20
08 Kompetens och kontinuitet genom handläggningen	22
09 Parallella beslut och den faktiska möjligheten att starta	23
10 Beslut, överklagande och vägen tillbaka efter återförvisning	25
11 Motåtgärdernas potential och vad en investering behöver pröva	27
12 Åtgärdspaket inom myndighetens rådighet	31
13 Hur resultaten bör vägas samman	34
14 Inriktning för prioritering och beredning	35
15 Uppföljning av genomförande, kostnader och resultat	37
16 Slutsatser	39
17 Referenser och källförteckning	41
A Metod och måttens betydelse	43
B Värdegranskning och återvunna beskrivningsuppgifter	45
C Intervjumetod och analysmatris	47
D Beräkning av kontrollernas bidrag	49
E Underlag, avgränsning och möjlighet till granskning	51
F Kostnadstopp 50	52
G Myndighetsåtgärder och ekonomiskt jämförelseunderlag	56
H Risker utan jämförbar årlig kostnadsindikator	59

Om rapporten

Rapporten förenar risk- och processkartläggning, modellskattningar och intervjuer. Mätunderlag och intervjukällor är låsta till denna utgåva. Bilagorna redovisar metod, källkedja, granskningsregler och registerutdrag.

ÖVERBLICK

01 Sammanfattning

Tillståndsprocessens betydelse för investeringar behöver bedömas från de första utredningarna till den tidpunkt då verksamheten faktiskt kan starta.

Miljöprövningen ska ge ett tillräckligt underlag för att bedöma en verksamhets påverkan och fastställa de villkor som behövs. För företaget är prövningen samtidigt en del av en större investeringsprocess, där finansiering, markåtkomst, elanslutning, teknisk projektering och leveransavtal behöver planeras. När ett avgörande besked förskjuts kan följden därför bli större än den direkta kostnaden för ytterligare en utredning. Kapital förblir bundet, planerad produktion skjuts fram och andra beslut kan behöva tas om. Möjligheten att förstå vilka krav som återstår och när de kan vara uppfyllda har på detta sätt ett ekonomiskt värde även när tillståndets slutliga utfall fortfarande är öppet. [REG, RES, MYN]

Den här rapporten ger Svenskt Näringsliv ett underlag för att prioritera förbättringar av prövningen och bedöma vilka motåtgärder som förtjänar närmare beredning. Analysen omfattar 342 risker i sju delprocesser, 378 föreslagna motåtgärder och erfarenheter från fem intervjudokument med sex medverkande personer. Riskbeskrivningarna visar var ett problem uppstår, vad som kan utlösa det och vilka följder som kan uppstå. Mätningen ger bedömningar av händelsefrekvens, kostnad och möjliga åtgärdseffekter. Intervjuerna bidrar med förklaringar till hur förloppen kan utvecklas i praktiken och vilka arbetsformer som upplevs fungera väl. [REG, RES, MYN]

Ett återkommande mönster är att osäkerhet byggs upp mellan olika steg i handläggningen. En sökande kan ha lagt ned ett omfattande arbete utan att ännu veta om myndigheten bedömer underlaget som fullständigt. Ett behov av en inventering kan upptäckas efter att rätt årstid passerat. En ny handläggare kan behöva rekonstruera tidigare avgränsningar, medan ett projekt med miljötillstånd fortfarande väntar på ett sektorsbeslut eller ett förstartsgodkännande. Dessa förlopp binder samman frågor om underlag, kompetens, kontinuitet och samordning. De bör därför följas genom hela ärendet och, där det är relevant, fram till möjlig byggstart. [REG, RES, MYN]

Riskmätningen omfattar 341 av registrets risker. Med utgångspunkt i ett läge utan införda motåtgärder kan en medianbaserad årlig kostnadsindikator redovisas för 325 risker. Den beräknas som medianen för händelsefrekvens multiplicerad med medianen för kostnad per händelse och ligger till grund för huvudrangordningen. För 17 registerrisker saknas en jämförbar indikator; en av dessa ingår inte i mätningen. Samtliga 342 finns kvar på webbplatsen. Medelvärdesbaserad årskostnad bevaras som fördjupning för 307 risker. Genomgången av riskbeskrivningarna har dessutom identifierat 40 användbara intervall för 32

risker, vilka redovisas som beskrivningarnas egna uppskattningar utan att en mittpunkt väljs som ersättning för ett saknat modellvärde. [REG, RES, MYN]

De 50 riskerna med högst medianbaserad årsindikator är spridda över hela beslutskedjan. Sektorsspåren innehåller 23, vattenverksamhet och prövning åtta vardera, förutsättningarna inför start fyra, klassificering och miljöbedömning tre vardera samt miljöfarlig verksamhet en. Fördelningen riktar uppmärksamheten mot beslutens inbördes beroenden och mot den ekonomiska betydelsen av att ett ärende förskjuts i tid. Den exakta sammansättningen är samtidigt känslig för vilket riskmått som används. På ett fast urval med 307 risker återkommer 27 av de 50 högst placerade i både en medelvärdesbaserad och en medianproduktbaserad lista. Huvudlistan omfattar ett något bredare urval där ytterligare medianbedömningar kan användas. [REG, RES, MYN]

Figur 1. Kostnadstopp 50 genom beslutskedjan



Antal risker hänförda till sin direkta delprocess. En process med fler registerposter har också fler möjliga risker att ingå i listan. Figuren visar rangordningens sammansättning, inte sannolikheten att en process störs. · Källa: REG, RES

Myndighetsrelaterade förlopp har en tydlig plats i riskregistret. Av 342 risker har 118 klassificerats med ursprung i myndighet och prövning, och 16 av dessa återfinns i den medianbaserade kostnadstoppen. De 20 särskilt framtagna myndighetsåtgärderna når tillsammans 90 risker. Sjutton förslag hör till underlagets huvudscenario för myndighetens uppdrag och når 78 risker, däribland sex i topp 50. Det finns därmed ett konkret handlingsutrymme, men också viktiga risker som beror på andra aktörers beslut, företagens förberedelser eller ändrade yttre förutsättningar. Antalet kopplingar beskriver räckvidden och behöver läsas tillsammans med vad en åtgärd faktiskt kan förändra. [REG, RES, MYN]

Samtliga kontroller behandlas som ännu inte införda. För de 17 myndighetsåtgärderna i huvudscenariot finns jämförbara medianbaserade kostnadsindikatorer och effektunderlag för 75 av de 78 berörda riskerna. När dessa åtgärder kombineras minskar summan av indikatorerna med cirka 36 procent inom detta urval. Resultatet är en modelljämförelse vid bedömningarnas centrala nivåer, och några få stora riskposter har betydande vikt även här. Genomförandekostnader saknas, och samma ekonomiska förlust kan ingå i flera riskposter. Resultatet behöver därför föras vidare till avgränsade ärendekalkyler innan det används som grund för en budget eller en bedömning av samhällsekonomisk nettobesparing. [REG, RES, MYN]

Den samlade analysen ger skäl att bereda åtgärder för fullständighet, remisshantering, beslutens kvalitet, tidsplanering och samordning. Intervjuerna ger samtidigt konkreta erfarenheter av sena säsongsbehov och bristande kontinuitet i ärendeakten. Åtgärderna verkar på olika delar av förloppet och behöver bedömas både var för sig och tillsammans. Den ekonomiska ordningen mellan dem förändras när medelvärden ersätts av medianbaserade indikatorer, vilket gör det särskilt viktigt att granska vilka riskposter som står för ett stort bidrag. Återförvisning och formell beslutshantering är fortsatt relevanta områden, men deras extrema medelvärdesbaserade belopp styr inte rapportens rekommendationer. [REG, RES, MYN]

Rapportens rekommendation är att gå vidare med avgränsade åtgärdspaket där ansvar, tillämpning, kostnad och uppföljning kan anges. Den nya myndighetens förberedelser erbjuder ett tillfälle att etablera gemensamma rutiner, men övergången behöver också säkra kunskapen i pågående ärenden. Svenskt Näringsliv kan bidra genom att samla företagens erfarenheter, precisera vilka kostnader som uppstår i olika förseningsförlopp och följa om förändrade arbetssätt leder till bättre framförhållning och färre omtag. Metod, antaganden och kvalitetsgranskning redovisas i bilagorna. [REG, RES, MYN]

BAKGRUND OCH UPPDRAG

02 Tillståndsprövningens betydelse för företagens investeringar

Företagets planering berör flera beslut och aktörer. Förutsebarhet handlar om hur dessa delar fungerar tillsammans över tid.

Ett investeringsbeslut fattas ofta långt innan alla villkor för genomförandet är uppfyllda. Verksamhetsutövaren behöver bedöma om projektets framtida intäkter och andra nyttor motiverar de resurser som ska bindas, samtidigt som den tekniska utformningen och lokaliseringen kan behöva anpassas till prövningen. Miljökrav och motstående intressen behöver utredas med tillräcklig omsorg. För företaget blir det därför väsentligt att kunna skilja frågor som är avgjorda från frågor som fortfarande kan påverka projektet och att förstå vilket ytterligare arbete som behövs för ett beslut. [REG, I03, I04, I05]

När kraven kan preciseras tidigt går det att planera utredningar, beställa specialistinsatser och ordna arbetet i en rimlig följd. Om motsvarande behov framkommer sent kan redan framtaget material behöva revideras och andra delar av projektet avvakta. Skillnaden är särskilt betydelsefull när en undersökning endast kan göras under en viss säsong eller när ett beslut är en förutsättning för att söka ett annat. Då kan en begränsad förskjutning i ett enskilt steg ge en lång väntan för projektet som helhet. Det är denna typ av följder som riskkartläggningen försöker göra möjliga att undersöka systematiskt. [REG, I03, I04, I05]

Intervjumaterialet beskriver hur osäkerheten kan bestå även efter omfattande förberedelser. Företagsrepresentanter återkommer till behovet av tydliga besked om fullständighet, tillgång till handläggare med rätt kompetens och kontinuitet mellan samråd och fortsatt prövning. De beskriver också erfarenheter av fungerande dialog och kunniga handläggare, vilket ger viktiga jämförelsepunkter. Rapporten använder berättelserna för att förstå mekanismer och formulera frågor för förbättringsarbetet. Deras omfattning medger däremot ingen uppskattning av hur stor andel av Sveriges ärenden som följer ett visst förlopp. [REG, I03, I04, I05]

Riskerna påverkar företag olika. En större organisation kan ha egen juridisk och teknisk kompetens, erfarenhet av tidigare prövningar och möjlighet att arbeta vidare med andra delar av projektet under väntetiden. Ett företag med begränsade resurser kan behöva köpa motsvarande kompetens och få svårare att hantera upprepade omtag. Även kapitalbindningen varierar mellan projekt som befinner sig i tidig utveckling och projekt där kontrakt, utrustning eller byggorganisation redan finns på plats. Kostnadsbedömningarna behöver därför följas tillbaka till den händelse och den projektsituation som de avser. [REG, I03, I04, I05]

> En viktig framgångsfaktor är enligt intervjupersonen att etablera goda relationer med berörda remissinstanser och handläggande myndigheter. Erfarenheten är att tydlighet från företagets sida bidrar till ett mer konstruktivt samarbete och att myndigheterna då också anstränger sig mer för att driva processen framåt. Väl genomarbetade ansökningar och tydlig kommunikation kan därmed minska risken för missförstånd och onödiga kompletteringar.

Intervjukälla I04 · Intervjuanteckning, stycke 32 [I04-32]

Rapportens uppgift är att ge Svenskt Näringsliv en samlad grund för att diskutera vilka förbättringar som kan göra störst nytta och vilka belägg som behövs innan resurser binds i en viss åtgärd. Den behandlar fyra frågor: var ekonomiskt betydelsefulla risker uppstår, hur de hänger samman med processernas utformning, vilka föreslagna motåtgärder som kan påverka dem och hur genomförandet bör följas upp. Den ekonomiska huvudjämförelsen använder medianbaserade årsindikatorer. Medelvärdena redovisas som fördjupning och känslighetsunderlag, medan riskbeskrivningar, processkartor och intervjuer används för att förstå vad en åtgärd faktiskt behöver förändra och om den är genomförbar. [REG, I03, I04, I05]

En händelse avser att en risk inträffar i ett enskilt prövningsärende eller projekt. Frekvensen beskriver antal sådana händelser per år i Sverige, och konsekvensen beskriver kostnaden i det berörda projektet. En nationell frekvens kan därför inte läsas som sannolikheten för en viss sökande. Bedömningsramen omfattar bland annat försening, kapitalbindning, utredning och processarbete. Beloppen behöver granskas med avseende på vad som redan räknas i närliggande risker, eftersom flera beskrivningar kan fånga olika led i samma ekonomiska förlust. [REG, I03, I04, I05]

Den digitala delen gör det möjligt att gå från rapportens slutsatser till enskilda risker, deras orsaker och konsekvenser samt föreslagna kontroller. En läsare kan där undersöka en viss process, filtrera fram myndighetsdrivna åtgärder eller jämföra ett åtgärdsurval. Rapporten ger den löpande analysen och motiverar prioriteringarna, medan registret ger möjlighet att pröva dem mot detaljerna. Underlaget omfattar även risker som ligger utanför den nya myndighetens direkta rådighet, vilket är nödvändigt för att beskriva företagets hela beslutskedja. [REG, I03, I04, I05]

BAKGRUND OCH UPPDRAG

03 Den nya myndigheten och ansvaret för hela prövningskedjan

En organisatorisk förändring skapar möjligheter till gemensamma arbetssätt, men ansvarsfördelningen mellan prövningens aktörer behöver vara tydlig.

Miljöprövningsmyndigheten planeras starta den 1 juli 2027 och överta uppgifter från miljöprövningsdelegationerna. Kontoren ska finnas i Stockholm, Göteborg och Umeå. Reformen ger en organisatorisk bakgrund till analysen av likvärdig handläggning, tillgång till kompetens och gemensamma rutiner. Registret omfattar samtidigt fler beslut än dem som den nya myndigheten själv kommer att fatta. Företagens projekt kan även bero på domstolsprövning, vattenfrågor, plan- och byggbeslut och andra sektorsbeslut. Ett myndighetsövertagande ger därför inte i sig ett samlat ansvar för varje steg fram till byggstart. [RIX, LST]

För den praktiska utformningen blir det viktigt att skilja mellan vad organisationen kan besluta om, vad den kan samordna och vad den behöver informera om. Myndigheten kan exempelvis utveckla mottagning, egen handläggning, dokumentation och kvalitetssäkring inom sitt uppdrag. När ett annat beslutsorgan ansvarar för en fråga kan värdet i stället ligga i att identifiera beroendet, klargöra vilken information som behöver delas och skapa fungerande kontaktvägar. En överenskommelse om sådana gränssnitt behöver respektera respektive organs uppgifter och möjligheter att göra en självständig prövning. [MYN]

Intervjuerna ger stöd för att skilja likvärdiga arbetssätt från likadana utfall. Lokala miljöförhållanden, verksamhetens utformning och berörda intressen kan motivera olika krav i olika ärenden. Gemensamma rutiner kan ändå göra det tydligare hur behov identifieras, hur avgränsningar dokumenteras och hur en sökande får information om ärendets fortsättning. Om regional variation ska följas upp behöver jämförelsen därför ta hänsyn till ärendenas innehåll och till skälen för olika bedömningar. En enkel jämförelse av genomsnittliga handläggningstider kan annars ge en felaktig bild av variationens orsaker. [MYN, I01, I02]

Införandet innebär dessutom att kunskap behöver föras över mellan organisationer. Ett pågående ärende kan innehålla tidigare projektversioner, överenskomna kompletteringar, öppna sakfrågor och tidskritiska åtaganden som inte framgår av den senaste ansökningshandlingen. Om den mottagande organisationen får svårt att återskapa dessa förutsättningar kan både myndighet och sökande behöva göra om arbete. Överföringen bör

därför behandlas som en egen risk och följas med en kontroll av att dokumentation och ansvar faktiskt går att använda i fortsatt handläggning. [MYN, I01, I02]

Åtgärdsunderlaget delar in myndighetsförslagen i 17 åtgärder inom huvudscenariot, en särskild övergångsåtgärd och två förslag som förutsätter ett vidare framtida mandat. Rapporten följer denna indelning i både ekonomiska jämförelser och rekommendationer. Det gör det möjligt att arbeta vidare med det som ryms inom det beskrivna uppdraget, samtidigt som behov av bredare samordning kan beredas på rätt nivå. Klassningen innebär varken att förslagen redan är införda eller att varje tillämpningsfråga är rättsligt avgjord. [MYN, I01, I02]

RISKBILD

04 Riskernas kostnader och betydelse för prioriteringen

Kostnadsrangordningen visar vilka riskposter som ger störst modellerat ekonomiskt utslag. Beskrivningarna behövs för att bedöma varför och vad som går att påverka.

Den ekonomiska rangordningen bygger på ett utgångsläge utan införda motåtgärder, eftersom samtliga kontroller i analysen är föreslagna investeringar. Huvudmåttet är en medianbaserad årlig kostnadsindikator: medianen för händelsefrekvens multipliceras med medianen för kostnad per händelse. Därmed kan läsaren följa beräkningen från de två värden som visas på riskkortet till dess årsindikator. Måttet ger en jämförelse vid bedömningarnas centrala nivåer. Det ska varken benämnas förväntad årskostnad eller medianen för årets faktiska förlust, eftersom dessa mått svarar på andra frågor och kräver andra beräkningar. [REG, RES]

Högst i huvudlistan finns handläggningstiden i vattenmål, följd av missad samordning mellan prövningar och sektorsbeslut som ännu inte kan tas i anspråk. Indikatorn för vattenmål är cirka 65,6 miljarder kronor per år. Det är en modellerad storleksordning som behöver prövas mot vilka ärenden, tidsförskjutningar och ekonomiska konsekvenser som faktiskt avses. Flera av de högst placerade riskerna gäller beroenden där ett projekt kan ha betydande åtaganden när en störning uppstår. Medianerna minskar känsligheten för fördelningarnas höga utfall, men undanröjer inte frågor om kostnadsnivå, exponering eller ekonomiskt överlapp. Förbättringar behöver därför bedömas både efter hur många ärenden de når och efter vad som kan förändras i de berörda förloppen. [REG, RES]

Historiken ger en nödvändig utgångspunkt för att pröva denna storleksordning. Naturvårdsverket redovisar 193 avgjorda vattenmål i första instans 2024, med en medianhandläggningstid på 356 dagar. För 34 avgjorda överklagade vattenmål var den sammanlagda mediantiden 1 004 dagar; Högsta domstolens handläggning ingår inte. Uppgifterna visar att vissa ärenden har långa förlopp, men mäter inte hur många förseningar som medför en viss ekonomisk förlust. Riskbeskrivningens 50–100 sådana händelser per år och 5–200 miljoner kronor per händelse är bedömningar. Modellens cirka 109 händelser och 601 miljoner kronor per händelse behöver därför undersökas mot projektens faktiska väntetid, kapitalbindning och bortfall. Historiska tider ska styra faktaredovisningen, medan kostnadsindikatorn förblir en modellbedömning vars nivå behöver beläggas. [REG, RES, NV24]

Skillnaden mellan huvudmåttet och ett årsmedelvärde är stor för vissa risker. Risken att överprövningens handläggningstid påverkar projektet har en frekvensmedian på cirka 43

händelser per år och en median för bedömd kostnad på cirka 191 miljoner kronor. Deras produkt är cirka 8,24 miljarder kronor per år i den medianbaserade jämförelsen. Det tidigare framträdande årsmedelvärdet på omkring 602 miljarder kronor beräknas i stället från ungefär 725 händelser per år och 830 miljoner kronor per händelse. Skillnaden på cirka 73 gånger uppstår när fördelningarnas höga utfall höjer båda medelvärdena. Beloppet 602 miljarder beskriver därför ett särskilt modellresultat med starkt genomslag för dessa utfall och används inte som rapportens huvudsakliga prioriteringsvärde. [REG, RES]

Figur 2. De tio högsta medianbaserade årsindikatorerna



Miljoner kronor per risk och år, beräknat som frekvensmedian × kostnadsmedian utan införda kontroller. Indikatorn är varken förväntad årskostnad eller medianen för årets faktiska förlust. Ekonomiska överlapp kan förekomma. · Källa: REG, RES


En känslighetsjämförelse visar att valet av sammanfattning påverkar vilka risker som hamnar högst. Bland de 307 risker som har både ett årsmedelvärde och medianbaserat underlag återkommer 27 i båda topplistorna. Några risker flyttar mer än hundra placeringar när medelvärden ersätts av medianprodukter. Jämförelsen håller riskurvalet fast för att isolera

måttets betydelse; huvudlistan kan dessutom innehålla risker vars medianer är användbara trots att medelvärdena har lämnats odefinierade. Detta är ett skäl att bevara flera perspektiv i fördjupningen, samtidigt som huvudlistan använder ett tydligt och konsekvent mått. En hög placering behöver fortfarande granskas mot händelseenhet, ärendevolym och kostnadens innehåll. [REG, RES]

Även centrala modellvärden behöver stämmas av mot den verklighet de ska beskriva. Dokumenterade historiska händelseantal är den främsta kontrollen av frekvensens skala när de avser samma händelse, population och period. Ett modellvärde som avviker tydligt från ett sådant underlag behöver förklaras innan det används för prioritering. Ett prejudikat som förändrar rättsläget kan exempelvis beskrivas både som en rättslig händelse och som ett antal berörda projekt, vilket gör kostnadsberäkningen olika beroende på vad som räknas. Beskrivningarnas uppskattade intervall är ett annat slags stöd än observerad statistik. De kan visa att en storleksordning behöver granskas, men deras mittpunkter har inte använts som automatiska ersättningar för modellvärden. Risker med en kvarstående konflikt finns kvar med odefinierad indikator och en förklaring till vad som behöver klargöras. [REG, RES]

Genomgången av riskbeskrivningarna ger ett kompletterande sätt att bedöma storleksordningar. Fyrtio intervall för 32 risker kan föras tillbaka till uttryckliga uppgifter om exempelvis antal händelser per år eller typisk kostnad i ett ärende. Ett intervall för väntan på ett besked om prövningstillstånd är något annat än kostnaden för hela överprövningen, vilket framgår av källtextens avgränsning. Denna precision är värdefull även när intervallet inte kan ersätta ett medelvärde. Intervallen visas därför som egna uppskattningar, med källtext och förklaring, och påverkar inte rangordningen genom en godtyckligt vald mittpunkt. [REG, RES]

Figur 3. Kostnadsramar som återfinns i riskbeskrivningarna

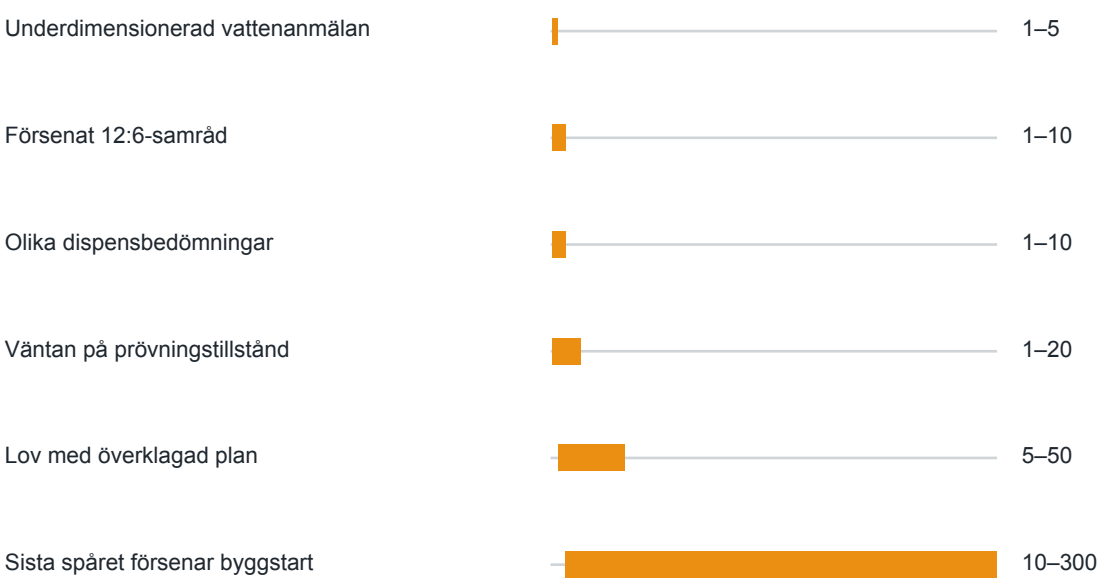

mnkr per händelse. Linjär skala 0–300.

Exempel på typiska kostnadsintervall per händelse, i miljoner kronor. Uppgifterna är beskrivningarnas egna uppskattningar och har ingen angiven statistisk konfidensnivå. · Källa: REG, RES

Kostnad och relativ sannolikhet svarar slutligen på olika frågor. Sannolikhetsrangordningen visar vilka risker som modellen placerar högre än andra i fråga om förekomst. Den medianbaserade kostnadsindikatorn tar också hänsyn till händelsekostnaden och kan därför föra fram mindre vanliga men ekonomiskt betydande förlopp. För en organisation som ska prioritera insatser bör dessa perspektiv läsas tillsammans: vanliga problem kan motivera breda förbättringar av arbetssätt, medan stora konsekvenser kan motivera en mer riktad kvalitetssäkring. Processkopplingarna visar var insatserna kan sättas in, och känslighetsanalysen visar när en ekonomisk placering beror starkt på hur osäkerheten sammanfattas. [REG, RES]

RISKBILD


05 Var i processen riskerna får betydelse

Processkartorna gör det möjligt att följa hur ett tidigt vägval påverkar senare underlag, beslut och förutsättningar för start.

De sju delprocesserna beskriver olika delar av ett projekts väg genom prövningen. De ska läsas som en struktur för analysen och behöver anpassas till det enskilda projektets rättsliga väg. Alla verksamheter passerar inte samtliga noder, och vissa spår löper parallellt. Varje risk har därför en direkt processkoppling som används när antalen redovisas. Uttryckliga följdrelationer kan också undersökas i processvyn, men de har inte gjorts om till en beräknad sannolikhet för att en störning sprids. [REG, RES, MYN]

Figur 4. Myndighetsåtgärdernas täckning per delprocess

Grå: Alla risker i delprocessen. Orange: Åtgärd inom underlagets huvudscenario.

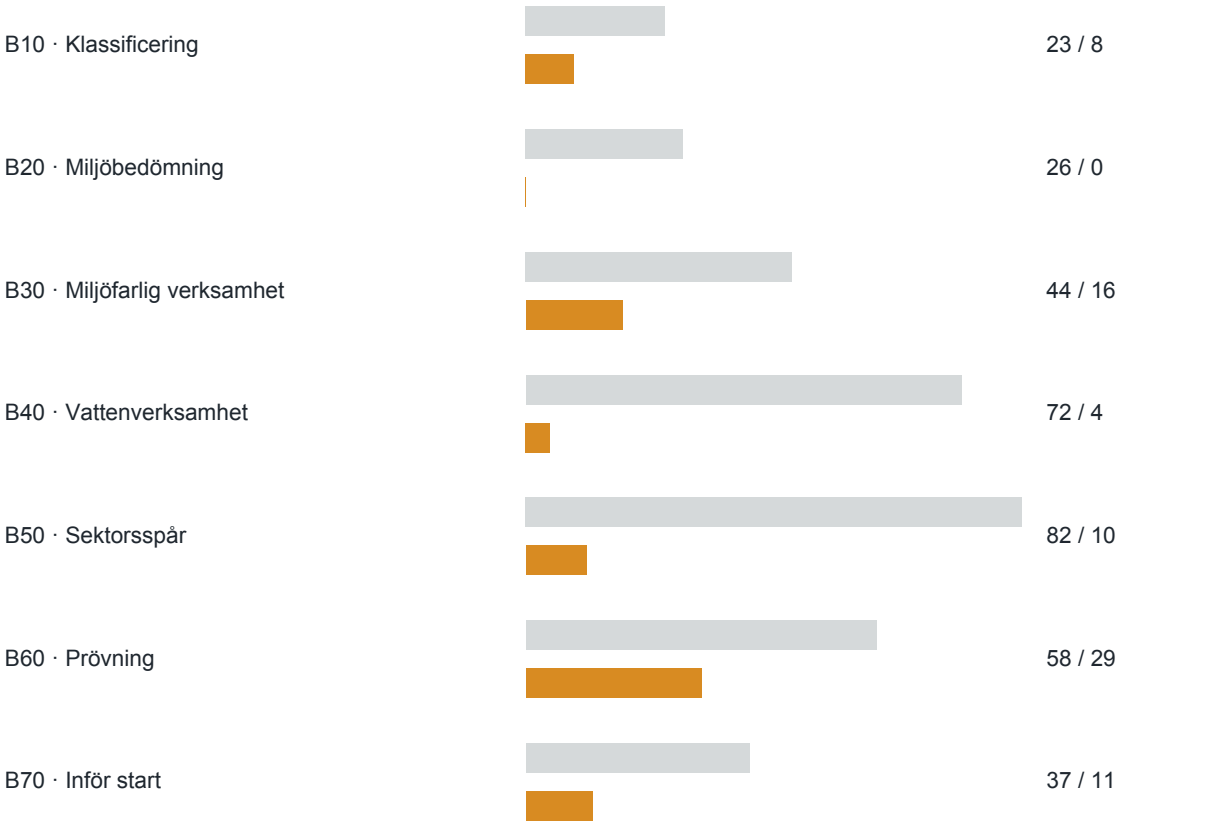

Grå stapel visar alla risker i processen. Orange stapel visar risker med minst en koppling till de 17 åtgärderna i huvudscenariot. Antalen anger dokumenterade samband och säger inget om hur stor effekten blir. · Källa: REG, RES

Den inledande klassificeringen, B10, påverkar vilka prövningar som behöver göras och vilket underlag som ska tas fram. Ett felaktigt vägval kan få följder långt senare, när tid och resurser redan lagts på en ansökan. De föreslagna myndighetsåtgärderna om dokumenterad processvägledning och tidig kontroll av behörighet och prövningsram, MPM-01 och MPM-02, är relevanta i denna del. Deras värde ligger i att frågor om ansvar och avgränsning kan behandlas innan de får konsekvenser för flera andra arbetsmoment. Vägledningen behöver samtidigt ange vilka bedömningar som är preliminära och vilka förutsättningar de bygger på. [REG, RES, MYN]

Miljöbedömningen, B20, innehåller bland annat frågor om avgränsning och underlag. Här kan projektets tekniska utveckling och behovet av naturvetenskapliga undersökningar ha olika tidplaner. Om en inventering förutsätter en viss årstid får tidpunkten för besked om behovet särskild betydelse. Tre av processens risker finns i den medianbaserade kostnadstoppen, men ingen har en direkt koppling till de 17 myndighetsåtgärderna i huvudscenariot. Det betyder att ansvar och tillämpliga åtgärder i denna del behöver undersökas särskilt; de bredare förslagen

om framtida mandat bör hållas åtskilda från vad som kan göras inom huvudscenariot. [REG, RES, MYN]

Prövningen av miljöfarlig verksamhet, B30, har tydliga samband med frågor om fullständighet, handläggning och beslut. Sexton av processens 44 risker nås av myndighetsåtgärderna i huvudscenariot. Det ger en konkret grund för att arbeta med samlad granskning, planering och en spårbar ärendeakt, men täckningen innebär inte att alla bakomliggande problem därmed är lösta. Företagets underlag, projektändringar och behov av teknisk kompetens påverkar fortfarande förloppet. Uppföljningen behöver därför visa både vilka arbetssätt myndigheten använder och vilka förutsättningar som råder i ärendet. [REG, RES, MYN]

Vattenverksamhet, B40, omfattar 72 risker och är den näst största delen av registret. Åtta risker finns i den medianbaserade kostnadstoppen, medan fyra av processens risker har en koppling till myndighetsåtgärderna i huvudscenariot. Skillnaden mellan omfattande riskbild och begränsad åtgärdstäckning är relevant för Svenskt Näringslivs fortsatta arbete. Den talar för att förbättringsfrågorna också behöver tas till andra berörda aktörer och att åtgärderna bör avgränsas efter ärendetyp. När kostnaden beror på en tidsförskjutning behöver analysen skilja den nödvändiga utredningens omfattning från merkostnaden av att behovet eller ansvaret klargörs sent. [REG, RES, MYN]

Sektorsspåren, B50, innehåller 82 risker och 23 av de 50 högst placerade i den medianbaserade kostnadsjämförelsen. De omfattar flera slags beslut och rättigheter som kan ha betydelse för ett och samma projekt. Den stora mängden riskposter speglar delvis processens bredd och ska därför inte tolkas som en observerad andel misslyckade ärenden. För prioriteringen är de dokumenterade beroendena centrala. Om ett nödvändigt sektorsbeslut blir klart senare än miljöprövningen kan projektets genomförande ändå behöva vänta. En tillståndsmatris och överenskomna gränssnitt kan ge bättre framförhållning om de används för att följa faktiska beslut, ansvariga och återstående frågor. [REG, RES, MYN]

Prövning och överprövning, B60, har 58 risker, varav 36 klassificerats med ursprung i myndighet och prövning. Här finns åtta risker i den medianbaserade kostnadstoppen och 29 risker som nås av myndighetsåtgärderna i huvudscenariot. Det är därmed en central del för analysen av remisshantering, beslutens kvalitet och vad som händer efter ett överklagande eller en återförvisning. En formell brist kan få en omfattande ekonomisk följd om den innebär att handläggning måste tas om. Vilken insats som bör prioriteras behöver dock också stödjas av återkommande ärendeproblem, praktisk rådighet och en granskning av de riskvärden som bär kalkylen. [REG, RES, MYN]

Inför start, B70, samlas beroenden som återstår när projektet kommit långt. Fyra av processens 37 risker ligger i den medianbaserade kostnadstoppen. Det kan handla om beslut som ännu inte fått laga kraft, ekonomisk säkerhet eller andra godkännanden som krävs innan verksamheten kan börja. En uppföljning som stannar vid dagen för miljötillståndet kan missa dessa förlopp. För företaget behöver planeringen därför även visa vilket villkor som sist håller tillbaka start och

vilka andra aktiviteter som påverkas av väntan. Myndighetens rådighet kan vara begränsad till vissa delar, men tydlig information om återstående beroenden kan ändå förbättra planeringen. [REG, RES, MYN]

Tabell 1. Riskbild genom de sju delprocesserna

Delprocess	Risker	Årsindikator finns	I kostnadstopp 50
B10	23	22	3
B20	26	26	3
B30	44	42	1
B40	72	69	8
B50	82	78	23
B60	58	51	8
B70	37	37	4

RISKBILD

06 Myndighetsrelaterade risker och möjligheten att påverka dem

Riskens ursprung och åtgärdens ansvar behöver hållas isär när ett förbättringsarbete avgränsas.

Av registrets 342 risker har 118 sitt angivna ursprung i myndighet och prövning, 145 i sökande och ansökan samt 79 i externa förhållanden. Klassningen anger var det beskrivna problemet huvudsakligen uppstår. Den är inte en bedömning av juridiskt ansvar och behöver heller inte sammanfalla med vem som bäst kan förebygga följderna. En brist i ansökan kan exempelvis fångas upp genom en tydlig myndighetsgranskning, medan företaget kan begränsa följderna av en lång handläggning genom bättre planering av beroende aktiviteter. [REG, MYN]

Bland de 118 myndighetsrelaterade riskerna avser 45 kapacitet och handläggning, 26 rättslig osäkerhet och 16 överklagande. Dessa kategorier ger en inriktning för fortsatt analys. Kapacitetsfrågorna berör tillgång till tid och kompetens, medan rättslig osäkerhet kan kräva klargöranden, dokumenterade bedömningar och fungerande former för att hantera förändringar. Överklaganderiskerna behöver i sin tur delas upp mellan sådant som kan förebyggas genom ett väl berett beslut och sådant som hör till en självständig överprövning. Alla dessa frågor kan påverka tidsåtgång, men de kräver olika typer av åtgärder. [REG, MYN]

Figur 5. Riskernas ursprung och myndighetsåtgärdernas räckvidd

Grå: Alla risker. Orange: Med myndighetsåtgärd.



Alla 20 myndighetsåtgärder ingår i den orange stapeln, inklusive organisationsövergång och framtida mandat. Riskernas ursprung beskriver förloppet och innebär ingen ansvarsprövning. · Källa: REG, RES

De 20 myndighetsåtgärderna har kopplingar till 57 av de 118 myndighetsrelaterade riskerna. De når också 23 risker med ursprung hos sökanden och tio externa risker. Det visar hur arbetssätt på myndighetssidan kan minska sårbarheten i ett förlopp även när myndigheten inte orsakar den ursprungliga störningen. En spårbar ärendeakt kan exempelvis underlätta hanteringen av en projektändring, och en tydlig prövningsram kan göra det lättare för sökanden att ta fram rätt material. För att bedöma nyttan behöver analysen därför följa den konkreta orsaken och den föreslagna kontrollens placering i riskförloppet. [REG, MYN]

Drygt hälften av de myndighetsrelaterade riskerna saknar samtidigt koppling till någon av de särskilt framtagna myndighetsåtgärderna. Detta är en lucka i åtgärdsunderlaget som bör granskas, men den visar inte automatiskt att en ny rutin behövs för varje risk. Vissa frågor kan ligga utanför myndighetens mandat, andra kan hanteras genom kontroller som ännu inte klassificerats som myndighetsdrivna. Ett lämpligt nästa steg är att gå igenom de oadresserade riskerna utifrån deras kostnad, processläge och återkommande orsaker, så att fler risker kan hanteras med ett genomtänkt arbetssätt där det är möjligt. [REG, MYN]

De 17 åtgärderna i huvudscenariot har 133 riktade kopplingar till orsaker och åtta till konsekvenser i riskernas bow ties. Tyngdpunkten ligger därmed på att förebygga problem

genom vägledning, beredning, planering och beslutsarbete. Sambandskartan kan användas för att se när flera risker delar en orsak eller berörs av samma kontroll. En gemensam orsak är dock inte samma sak som ett uppmätt statistiskt beroende. För att använda sambandet i en ekonomisk totalberäkning behövs en tydligare beskrivning av vilka händelser och kostnader som faktiskt sammanfaller. [REG, MYN]

ANALYS AV RISKFÖRLOPPEN

07 Från oklart underlagsbehov till en användbar fullständighetsgranskning

Tydliga besked om underlaget påverkar både handläggningen och företagets möjligheter att planera arbetet.

Intervjukälla I03 beskriver ett ärende där företaget länge saknade besked om ansökan var komplett. Företaget hade fått en tidsuppgift som förutsatte fullständigt underlag, men uppfattade att tiden fram till denna bedömning låg utanför den praktiska prognosen. Berättelsen visar varför en tidsangivelse behöver ha en tydlig startpunkt och kompletteras med information om vad som återstår före denna punkt. Den angivna ärendehistoriken har inte kontrollerats mot en myndighetsakt i detta arbete. [I03]

> Myndigheten har satt upp en KPI för en del av sin process men det säger inte mig någonting om slutprodukten som kund.

Intervjukälla I03 · Intervjuanteckning, stycke 13 [I03-13]

I04 lägger större vikt vid kompletteringskravens relevans och omfattning än vid den formella tidsfristens start. Intervjuanteckningen beskriver hur bristande sakkunskap kan leda till fler frågor och hur företagets egen kompetens påverkar möjligheten att bedöma kraven. Detta ger en möjlig förklaring till att likartade processsteg kan upplevas mycket olika av olika företag. Det ger däremot inget mått på hur stor del av alla kompletteringar som är omotiverade. [I04]

I05 beskriver sent tillkommande inventeringar som behöver genomföras under en viss årstid. När tidsfönstret har passerat kan nästa möjliga undersökning ligga långt fram i tiden. Kostnaden ökar då i ett steg och kan omfatta både fortsatt kapitalbindning och omplanering av andra aktiviteter. En kontroll som identifierar ett säsongsberoende behov tidigt kan därför vara relevant även när själva undersökningskostnaden är begränsad. [I05]

Dessa mekanismer talar för att fullständighetsgranskning bör vara samlad, preciserad och spårbar. MPM-05 avser en sådan granskning och MPM-06 avser tidig identifiering av säsongsberoende underlag. Åtgärderna behöver samordnas med sökandens underlagskontroll, C-SHARED-underlagskontroll. En gemensam redovisning av fråga, rättslig relevans, ansvarig

och tidpunkt kan göra det lättare att skilja nya sakförhållanden från frågor som redan har behandlats. [MYN, REG]

Det finns samtidigt legitima skäl att komplettera ett underlag när ny information kommer fram eller projektet ändras. Uppföljningen bör därför skilja kompletteringar efter orsak. Ett mål om färre kompletteringar utan denna uppdelning kan ge fel drivkrafter, till exempel att ofullständiga underlag godtas för tidigt. Ett bättre underlag visar hur ofta tidigare kända behov identifieras sent och vilken merkostnad just detta medför.

För att arbetssättet ska fungera behöver granskningen resultera i ett besked som går att använda. Det bör framgå vilka frågor som återstår, hur de anknyter till prövningen, vilken precision som behövs och när underlaget kan tas fram. Ett sådant besked kan även göra det möjligt att planera vad myndigheten kan fortsätta med under tiden. Vid senare kompletteringskrav bör orsaken dokumenteras, exempelvis om projektet ändrats, nya förhållanden framkommit eller ett tidigare identifierbart behov missats. Då går det att följa om åtgärden faktiskt begränsar omarbete eller främst flyttar arbete mellan skeden. [MYN]

Den modellerade effekten av samlad fullständighetsgranskning, MPM-05, är positiv sammantaget för de sju av åtta kopplade risker som har användbara årsbelopp. Minskningen är omkring elva procent av dessa riskposters sammanlagda kostnadsunderlag när åtgärden införs ensam. En av de åtta riskerna får samtidigt ett negativt modellbidrag och en saknar jämförbar årskostnad. Den ekonomiska analysen ger därmed en anledning att undersöka åtgärden vidare, medan innehållet behöver utformas med hänsyn till hur kompletteringsarbetet faktiskt förändras. Denna avgränsning är särskilt viktig om myndigheten och sökanden har olika uppfattning om vad som redan är utrett. [RES, MYN]

ANALYS AV RISKFÖRLOPPEN

08 Kompetens och kontinuitet genom handläggningen

Tillgänglig kapacitet, sakkunskap och dokumentation påverkar olika delar av samma ärendeförlopp.

I02, I03 och I04 beskriver skillnader mellan regioner och handläggare. Skillnaderna gäller både tidsåtgång, framdrift och vilka frågor som ställs. I03 återger samtidigt ett annat ärende med tydligare återkoppling och en upplevelse av god kompetens. Det positiva exemplet är relevant eftersom det visar att respondenten skiljer mellan arbetssätt inom samma breda system. Underlaget ger anledning att undersöka variationens orsaker, men medger ingen fördelning av ansvar mellan bemanning, ärendekomplexitet och organisation. [I02, I03, I04]

I04 beskriver ett fall där handläggningen enligt intervjupersonen inte påbörjades förrän efter ett år på grund av personalbrist. En väl förberedd ansökan kan begränsa vissa omtag, medan väntan på tillgänglig handläggare kräver andra åtgärder. Det är därför viktigt att skilja kötid från aktiv handläggning och att ge båda delarna en tydlig plats i uppföljningen. [I04]

Vid byte av handläggare behöver tidigare ställningstaganden kunna förstås och prövas i sitt sammanhang. I05 beskriver hur frågor som verksamhetsutövaren uppfattat som avklarade kan aktualiseras igen efter ett ansvarsbyte. En dokumenterad överlämning bör därför omfatta avgränsningar, identifierade osäkerheter, underlagets version och skälen till tidigare bedömningar. Den bör också ange vilka frågor som fortfarande är öppna. [I05]

> Problematiken förstärks av att flera handläggare kan vara involverade i olika skeden av processen. När ansvaret övergår från en person till en annan finns en risk att tidigare diskussioner och bedömningar inte får fullt genomslag i den fortsatta prövningen. Frågor som verksamhetsutövaren uppfattat som avklarade kan därmed aktualiseras på nytt, samtidigt som nya utredningskrav tillkommer.

Intervjukälla I05 · Intervjuanteckning, stycke 24 [I05-24]

Intervjukälla I01 pekar på behovet att förena enhetlig handläggning med sakligt motiverade lokala skillnader. I02 understryker värdet av lokalkännedom. Dessa synpunkter ger ett viktigt villkor för nationell specialisering: den behöver ge handläggaren tillgång till både generell ämneskunskap och relevant platsinformation. Ett standardiserat underlag kan stödja denna kombination om det lämnar utrymme för att dokumentera de lokala förhållandena. [I01, I02]

Åtgärden för gemensam kapacitets- och specialistfördelning, MPM-08, bör bedömas tillsammans med aktiv planering och en spårbar ärendeakt. Kapacitetsfördelning kan göra det lättare att sätta in rätt kompetens när ett ärende behöver den, medan dokumentationen gör det möjligt för fler att bidra utan att förlora tidigare bedömningar. MPM-10 omfattar versionskontroll och spårbarhet i den egna ärendeakten. MPM-14 avser däremot överlämnandet efter överklagande och myndighetens roll i den fortsatta domstolsprocessen. Dessa olika uppgifter bör få egna tillämpningskrav och uppföljningsmått. [MYN]

Ett lämpligt uppföljningsunderlag skulle kunna visa hur länge ett ärende väntar på arbete, vilken kompetens som efterfrågas och hur ofta ett byte av ansvarig leder till att tidigare frågor behöver rekonstrueras. Med denna uppdelning blir det lättare att se om problemet främst gäller tillgängliga resurser, prioritering mellan ärenden eller dokumentationens användbarhet. Även positiva erfarenheter bör följas, så att organisationen kan identifiera vilka rutiner och former av dialog som bidrar till framdrift. Målet bör vara att göra det fungerande arbetssättet möjligt att använda i fler ärenden, med utrymme för deras olika sakförhållanden. [I02, I03, I04, I05]

ANALYS AV RISKFÖRLOPPEN

09 Parallella beslut och den faktiska möjligheten att starta

När flera beslut behövs avgör deras inbördes beroenden hur en försening påverkar projektet.

Processkartorna visar flera förlopp där miljöprövningen löper parallellt med planläggning, sektorsbeslut eller rättighetsfrågor. Om ett nödvändigt spår blir klart senare än de andra kan förberedda resurser och beslut få begränsat värde under väntetiden. Riskerna behöver därför följas genom hela beslutskedjan, med särskild uppmärksamhet på de steg som hindrar genomförande även när andra ärenden är avslutade. [REG]

I ett projekt där flera nödvändiga villkor ska vara uppfyllda blir det sist färdiga villkoret avgörande för den tidigaste möjliga starten. Denna enkla iakttagelse förklarar varför en förkortning av ett enskilt ärende ibland ger begränsad tidsvinst för projektet, medan en mindre

förändring i ett annat spår kan få stor betydelse. Det behövs därför en bild av vilka frågor som kan hanteras parallellt och vilka som förutsätter ett tidigare beslut. En sådan projektbild kan också visa när ett försenat beslut riskerar att påverka avtal, tilldelade resurser eller andra förutsättningar som gäller under en begränsad tid. [REG]

I03 beskriver kopplingar mellan tillståndens rättsliga status, tilldelning av eleffekt och villkor för investeringsstöd. Om processerna har olika tidslogik kan en försening i prövningen påverka förutsättningarna för finansiering eller anslutning. Rapporten behandlar detta som en beskriven riskmekanism i ett företags erfarenhet. Den fastställer varken ett visst stödutfall eller en generell regel om hur nätkapacitet fördelas. [I03]

I05 beskriver större projekt där flera prövningar och överklaganden behöver hanteras innan genomförandet kan fortsätta. En kostnadsbedömning bör här skilja mellan en gemensam försening och flera separata förseningar. Om två hinder löper samtidigt kan deras fulla tidskostnader överlappa. Om det ena hindret gör att ett säsongsfönster missas kan följden i stället bli större än summan av de ursprungliga handläggningstiderna. [I05, REG]

C-SHARED-tillstandsmatris avser att samordna en tillståndsmatris per åtgärd. MPM-04 avser överenskomna gränssnitt med andra beslutsorgan. Dessa kontroller kan ge en gemensam bild av vilka beslut som återstår, vilka underlag som delas och när olika ansvariga behöver agera. Deras nytta behöver bedömas mot konkreta projektförlopp, eftersom en dokumenterad matris ensam inte förkortar en rättsligt nödvändig prövning. [REG, MYN]

En fortsatt ekonomisk analys bör knyta kostnader till identifierade förseningsperioder och kostnadsslag. Därigenom kan kapitalbindning, omarbete och utebliven produktion redovisas utan att samma belopp kopieras mellan flera riskposter. Detta är en förutsättning för en meningsfull totalberäkning och för att senare kontrollscenarier ska kunna jämföras på samma grund.

I investeringsbedömningen bör gränssnittsåtgärder därför granskas tillsammans med den risk de avser att begränsa. MPM-04 ger i modellen en minskning på omkring 31 procent inom de tre kopplade riskernas kostnadsunderlag när åtgärden införs ensam. Det är ett starkare utslag än vad enbart antalet tre riskkopplingar skulle antyda. Samtidigt bygger nyttan på att informationen leder till faktiska förbättringar i planering eller hantering. En kontaktväg eller en tillståndsmatris behöver ha en ansvarig, hållas aktuell och användas när förutsättningarna förändras för att kunna påverka förloppet. [RES, MYN]

ANALYS AV RISKFÖRLOPPEN

10 Beslut, överklagande och vägen tillbaka efter återförvisning

Kvalitet i beslutets beredning och formella hantering kan få stor betydelse när projektet annars behöver genomgå ytterligare en prövningsomgång.

Överprövning hör till de förlopp som ger stora ekonomiska utslag i riskmätningen. En del av tidsåtgången följer av att beslut behöver kunna prövas självständigt och att motstående intressen ska kunna komma till tals. För förbättringsarbetet är det därför viktigt att precisera vilka delar av förloppet en åtgärd ska påverka. Brister i beredning, otydliga villkor eller fel i kungörelse och delgivning kan ge andra åtgärdsbehov än den tid som krävs för en materiell domstolsprövning. En kontroll bör kopplas till det förstnämnda när det är där myndigheten har möjlighet att förebygga ett onödigt omtag. [REG, RES, MYN]

Kontrollerad kungörelse, delgivning och överklagandeinformation, MPM-13, har åtta riskkopplingar och ett positivt modellbidrag för samtliga. När åtgärden införs ensam minskar summan av dessa åtta riskposters årskostnad med omkring 44 procent. Det är ett av de större ekonomiska bidragen bland de myndighetsdrivna förslagen. För att bedöma investeringen närmare behöver arbetssättet dock preciseras: vilka moment som ska kontrolleras, vem som gör kontrollen, vilken dokumentation som sparas och hur avvikelser rättas innan de får följder för beslutets fortsatta hantering. [REG, RES, MYN]

Riktad hantering efter återförvisning, MPM-16, når två risker och har en tydlig praktisk funktion. Åtgärden ska klarlägga vad som återstår efter återförvisningen, samla nödvändiga insatser och föra ärendet vidare med hänsyn till avgörandets innehåll. Dess ekonomiska placering är däremot känslig för riskvärderingen: det mycket stora medelvärdesbaserade bidraget minskar kraftigt när jämförelsen använder medianerna. En prioritering av denna åtgärd behöver därför också stödjas av faktiska återförvisningsärenden och möjligheten att påverka deras fortsatta handläggning. Tillämpningen bör dokumentera vilka frågor som ska hanteras på nytt och vilka tidigare underlag som fortfarande går att använda, så att omtaget blir begripligt för alla berörda. [REG, RES, MYN]

Juridisk och teknisk kvalitetssäkring av egna beslut, MPM-11, och entydiga tillståndsvillkor, MPM-12, verkar tidigare i samma kedja. De kan bidra till att beslutets förutsättningar, skäl och krav blir tydligare, vilket även har betydelse för verksamhetsutövarens planering och efterlevnad. Modellresultaten skiljer sig dock mellan åtgärderna och mellan risker. För MPM-12

är det samlade kostnadsutslaget litet i förhållande till de kopplade riskernas underlag, och två risker får ökade värden. Detta bör utredas som en fråga om bedömningens innehåll och åtgärdens avgränsning innan resultatet används som investeringsgrund. [REG, RES, MYN]

Denna del av prövningen motiverar också uppföljning som går längre än antalet överklaganden. Ett överklagande kan vara välgrundat och är inte i sig ett tecken på bristande kvalitet. Mer användbara uppgifter är vilka frågor som leder till ändring eller återförvisning, vilka formella brister som återkommer och hur mycket ytterligare arbete som uppstår. Genom att följa orsaker och följder kan kvalitetssäkringen riktas mot problem som faktiskt går att påverka, samtidigt som prövningens självständighet och de berördas rättigheter beaktas. [REG, RES, MYN]

ÅTGÄRDER OCH GENOMFÖRANDE

11 Motåtgärdernas potential och vad en investering behöver pröva

Mätningen gör det möjligt att jämföra föreslagna åtgärders bidrag. Ett investeringsbeslut behöver dessutom ta hänsyn till genomförandekostnad, täckning och osäkerhet.

Kontrollregistret omfattar 378 föreslagna motåtgärder. De har olika räckvidd och kan vara riktade mot en bakomliggande orsak, mot själva riskhändelsen eller mot dess konsekvenser. En kontroll kan beröra flera risker, och samma risk kan ha flera kontroller. Detta gör det möjligt att undersöka gemensamma arbetssätt som påverkar flera delar av processen, men innebär också att en ekonomisk bedömning behöver hantera kombinationer. Två åtgärder som berör samma risk kan inte jämföras genom att deras fristående besparingar utan vidare läggs samman. [RES, REG, MYN]


I mätningen finns 998 effektposter för 377 av kontrollerna. De beskriver bidrag till förändring av frekvens respektive kostnad per händelse, med utgångspunkt i bedömningar utan och med kontroller. Rapportens och webbplatsens jämförelser börjar utan införda åtgärder, i enlighet med underlagets aktuella genomförandestatus. För varje valt kontrollurval kombineras effekterna per risk, varefter förändringen av den medianbaserade årsindikatorn beräknas. Beräkningen återanvänder mätningen och innebär ingen ny mätning eller simulering. Den håller osäkerhetens bredd konstant och förutsätter att kontrollernas särskilda samspel inte ger ytterligare effekter utöver modellens kombination. Resultatet beskriver potential under dessa antaganden; ett genomförande har ännu inte prövats. [RES, REG, MYN]

Kontrollernas inbördes ordning behöver bedömas tillsammans med vilka risker som ger deras bidrag. När medelvärden används som ekonomiska vikter framträder riktad hantering efter återförvisning samt kungörelse och delgivning särskilt starkt. I en känslighetsjämförelse på samma riskurval får dessa åtgärder en betydligt lägre placering när beräkningen utgår från medianerna. Remiss och kommunicering, fullständighetsgranskning, beslutens kvalitetssäkring och aktiv tidsplanering får då större relativ betydelse. Huvudjämförelsen använder medianbaserade indikatorer för alla risker där ett sådant underlag är tillämpligt. Det innebär att ytterligare risker kan ingå jämfört med medelvärdesjämförelsen, vilket också behöver beaktas när resultat från olika urval jämförs. [RES, REG, MYN]

För fullständighetsgranskning, gränssnitt mellan beslutsorgan och ärendets dokumentation ger resultaten en mer sammansatt bild. Dessa åtgärder har stöd i de riskmekanismer som intervjuerna beskriver, men deras ekonomiska bidrag varierar och underlaget täcker inte alltid

alla kopplade risker. Det är särskilt viktigt vid jämförelser där en åtgärd når risker utan årsbelopp. Ett lågt redovisat bidrag kan då bero på att en betydelsefull del av nyttan ännu inte kan kostnadsberäknas. Tabellen och den digitala analysen visar därför både antal berörda risker och hur många som faktiskt ingår i beloppsjämförelsen. [RES, REG, MYN]

Figur 6. Fristående åtgärdseffekt inom respektive kostnadsunderlag

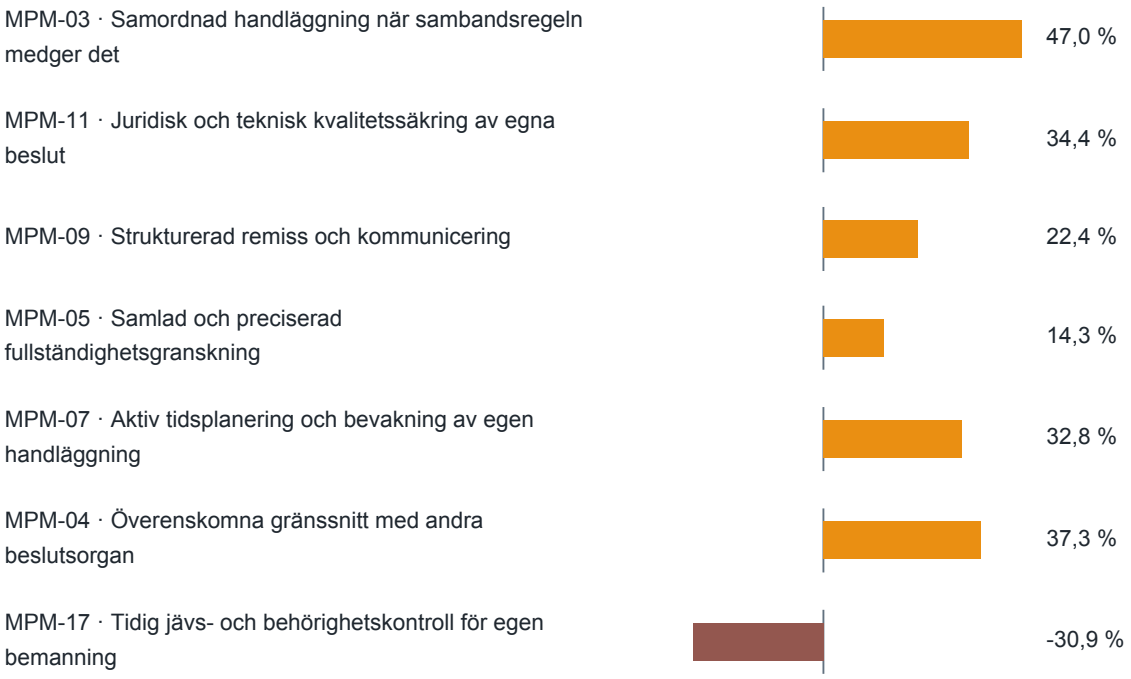

Noll i mitten. Höger: minskning. Vänster: ökning i modellen. Gemensam linjär skala.

Fristående procentuell minskning av medianbaserade årsindikatorer inom respektive åtgärds riskunderlag. Varje rad avser sina egna risker och sin redovisade täckning. Negativa värden innebär en ökning i modellen. Urvalet visar de största positiva bidragen och negativa resultat i huvudscenariot. · Källa: REG, RES

När de 17 åtgärderna i huvudscenariot kombineras omfattar det dokumenterade urvalet 78 risker, varav 75 har jämförbara indikatorer och effektunderlag. Summan av deras medianbaserade årsindikatorer minskar från cirka 81,2 till 52,4 miljarder kronor, motsvarande 35,5 procent. Detta är en jämförelse av samma riskposter före och efter åtgärdsurvalet. Samordnad handläggning, MPM-03, har ett stort fristående bidrag och behöver därför särskilt granskas mot de få risker som bär dess kalkyl. Även medianbaserade belopp kan domineras av enskilda höga värden. Genomförandekostnader och ekonomiska överlapp återstår att bedöma, och summan är varken en portföljmedian eller en uppskattning av nationell nettobesparing. För MPM-03 är risken R-B10-080-01 särskilt betydelsefull: dess mediankostnad är 4,83 miljarder kronor per händelse, samtidigt som riskbeskrivningen uppger att nationell statistik saknas. Beskrivningens exempel på en investering om 6,2 miljarder kronor kan inte användas som belägg för en lika stor förlust. Åtgärdens monetära förstaplats ger därför anledning att granska

just detta kostnadsunderlag och är inte tillräcklig grund för att välja den framför andra insatser. [RES, REG, MYN]

Modellen ger inte genomgående positiva effekter. Jävs- och behörighetskontroll för bemanningen, MPM-17, har ett negativt beräknat bidrag, och flera andra kontroller innehåller enstaka negativa riskbidrag. För MPM-14, som gäller överlämnande och myndighetens roll vid fortsatt prövning, byter det samlade resultatet tecken när de ekonomiska vikterna ändras från medelvärden till medianprodukter. Ett sådant resultat behöver förstås genom de enskilda riskerna och kan inte användas som ett allmänt omdöme om kontrollens lämplighet. Bedömningarnas riktning, kontrollens avgränsning och jämförbarheten mellan lägena utan och med åtgärder behöver granskas innan ett investeringsbeslut fattas. [RES, REG, MYN]

Figur 7. Huvudscenariots 17 myndighetsåtgärder tillsammans



Jämförelsen omfattar samma 75 riskposter med medianbaserad årsindikator i båda lägena. Index 100 är utgångsläget utan åtgärder. Tre ytterligare kopplade risker saknar jämförbart underlag. Åtgärdskostnader och ekonomiska överlapp ingår inte. · Källa: REG, RES

För en konkret investering bör jämförelsen därför föras vidare till genomförandet. Det behöver anges vilket arbetssätt som ska förändras, i vilka ärenden det ska användas, vem som ansvarar och vilka resurser som krävs. Kostnaden bör omfatta utveckling, utbildning, löpande arbete och eventuell ökad belastning hos sökanden. En åtgärd med mindre beräknad bruttonytta kan vara mer attraktiv om den är enklare att införa, har lägre kostnad eller ger ett mer robust resultat. Omvänt kan en omfattande systemförändring behöva prövas i mindre skala innan den modellerade nyttan används för att motivera en större investering. [RES, REG, MYN]

Den separata analysfliken för motåtgärder är utformad för denna jämförelse. Besökaren kan välja kontroller, se förändringen per risk och undersöka vad varje kontroll tillför när de andra i urvalet behålls. Valen ändrar endast analysen på skärmen. Genomförandestatus och källdata ligger fast. På så sätt kan underlaget användas för att diskutera alternativa insatser utan att ett utforskat scenario förväxlas med ett fattat beslut eller en redan genomförd förbättring. [RES, REG, MYN]

Tabell 2. Exempel på underlag för fortsatt investeringsbedömning

Åtgärd	Jämförbara risker	Minskning av indikator	Vad som behöver prövas
MPM-03 · Samordnad handläggning när sambandsregeln medger det	2 av 2 risker	47,0 %	Samordningens rättsliga utrymme och de två riskernas kostnadsnivåer.
MPM-11 · Juridisk och teknisk kvalitetssäkring av egna beslut	5 av 6 risker	34,4 %	Granskning före beslut, saknade riskvärden och faktisk resursåtgång.
MPM-09 · Strukturerad remiss och kommunicering	5 av 5 risker	22,4 %	Remissplan, kommunicering och följder av ändrad arbetsfördelning.
MPM-05 · Samlad och preciserad fullständighetsgranskning	7 av 8 risker	14,3 %	Samlad granskning, sena behov och förändrad arbetsinsats.
MPM-07 · Aktiv tidsplanering och bevakning av egen handläggning	3 av 3 risker	32,8 %	Tidplanens användning, uppföljning och hantering av beroenden.

ÅTGÄRDER OCH GENOMFÖRANDE


12 Åtgärdspaket inom myndighetens rådighet

Förslagen behöver föras över till arbetssätt som går att använda, bemanna och följa upp i konkreta ärenden.

Åtgärderna i huvudscenariot kan samlas i fem arbetsområden: vägledning och mottagning, underlag och ärendeakt, planering och samordning, beslut och delgivning samt fortsatt prövning och förutsättningar inför start. Indelningen följer kontrollernas innehåll och gör det lättare att se vilka funktioner som behöver samarbeta. Den ersätter inte bedömningen av varje åtgärd. Ett arbetsområde kan innehålla förslag med olika rättsliga förutsättningar, resursbehov och styrka i effektunderlaget, vilket behöver framgå när ett paket bereds. [MYN, REG, RES]

Figur 8. Vilka risker de fem arbetsområdena når

Grå: Kopplade risker. Orange: Därav i kostnadstopp 50.

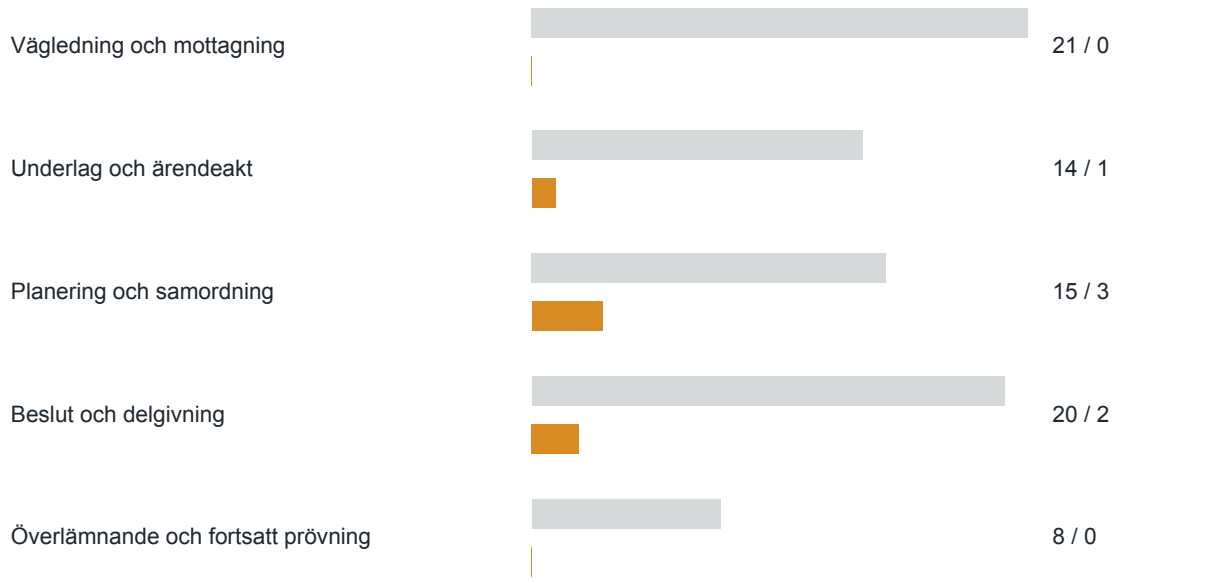

De 17 åtgärderna i huvudscenariot. En risk kan förekomma i fler än ett arbetsområde. Orange visar risker i kostnadstopp 50, grått samtliga kopplade risker. · Källa: REG, RES

Vägledning och mottagning omfattar framför allt MPM-01 och MPM-02. Här bör ett gemensamt arbetssätt göra det lättare att identifiera behörig prövning, hålla reda på vilken projektversion som diskuteras och dokumentera vilka besked som lämnats. En tydlig

avgränsning är särskilt viktig när den sökande ännu inte har bestämt alla tekniska detaljer. Arbetssättet behöver kunna hantera ändringar utan att tidigare information går förlorad eller uppfattas som mer bindande än den är. Nyttan bör följas genom färre sena omtag i vägval och en bättre förståelse för vad som återstår. [MYN, REG, RES]

Underlag och ärendeakt omfattar samlad fullständighetsgranskning, säsongsberoende behov och versionskontroll. MPM-05, MPM-06 och MPM-10 berör tillsammans 14 unika risker. Ett gemensamt genomförande bör göra det möjligt att följa en fråga från det första beskedet till det underlag som besvarar den, med uppgift om ansvarig, datum och eventuell förändring av kravet. Detta kan förbättra förutsättningarna både för handläggning och överlämning. Det bör dock följas om dokumentationsarbetet blir proportionerligt och om det faktiskt används, så att en ny rutin inte främst blir ytterligare en administrativ uppgift. [MYN, REG, RES]

Planering och samordning förenar MPM-03, MPM-04 och MPM-07–09. Förslagen berör dels sambandet mellan ärenden och beslutsorgan, dels planeringen av den egna handläggningen, tillgång till specialiststöd och remissarbetet. Tillsammans når de 15 unika risker. Genomförandet bör börja med en tydlig skillnad mellan det myndigheten själv kan planera och beroenden där andra behöver agera. En tidplan blir mer användbar om den visar varför en tidpunkt är osäker, vilka besked som kan ändra den och när planeringen ska uppdateras. Samma information kan hjälpa sökanden att samordna sina egna aktiviteter. [MYN, REG, RES]

Beslut och delgivning omfattar MPM-11–13 och når 20 unika risker. Här finns både möjligheter till sakkunnig granskning av beslutets innehåll och kontroll av den formella hanteringen. Ett lämpligt arbetssätt bör precisera när granskningen ska ske och hur upptäckta brister rättas. Om kontrollen läggs för sent kan den i sig skapa försening, medan en tydlig kontrollpunkt före expediering kan begränsa senare omtag. Den ekonomiska jämförelsen bör knytas till de fel som faktiskt återkommer i organisationens ärenden. Särskilt de riskposter som står för en stor del av ett beräknat bidrag behöver granskas, så att osäkra storleksordningar inte ensamma avgör vilken kontroll som införs först. [MYN, REG, RES]

Det sista arbetsområdet omfattar MPM-14–17 och når åtta unika risker. Det rör överlämnande, egna förstartsgodkännanden, återförvisning samt jävs- och behörighetskontroll. Förslagen har olika funktioner och deras ekonomiska resultat påverkas på olika sätt av vilka riskvärden som används. MPM-16:s stora medelvärdesbaserade bidrag är starkt svanskänsligt, medan MPM-14:s sammanvägda resultat byter tecken i känslighetsanalysen. För MPM-17 behöver det negativa bidragets innebörd granskas. Genomförandet bör därför utgå från varje kontrolls avsedda funktion och från vilka uppgifter myndigheten behöver säkra för att nästa del av processen ska fungera. [MYN, REG, RES]

Organisationsövergången, MPM-T01, bör hållas åtskild från den löpande verksamhetens förbättringsarbete. Åtgärden når nio risker, varav åtta har användbara medianbaserade indikatorer i den aktuella jämförelsen. Det modellerade bidraget behöver läsas tillsammans med den verksamhetsrisk som en bristfällig överföring av pågående ärenden kan medföra. En

praktisk beredning bör kontrollera ärendeakter, frister, ansvar, åtkomst och öppna frågor samt ordna en hantering av avvikelser. Förslagen om ett framtida bredare mandat, MPM-F01 och MPM-F02, behöver i sin tur behandlas som särskilda utvecklingsfrågor och inte räknas in i ett genomförande inom huvudscenariot. [MYN, REG, RES]

Figur 9. Arbetsområdenas kopplingar till delprocesserna

Åtgärdsområde	B10	B20	B30	B40	B50	B60	B70
Vägledning och mottagning	4	0	11	0	3	2	1
Underlag och ärendeakt	1	0	4	1	1	6	1
Planering och samordning	3	0	1	3	1	7	0
Beslut och delgivning	0	0	0	0	5	10	5
Överlämnande och fortsatt prövning	0	0	0	0	0	4	4

Antal unika risker inom varje kombination av arbetsområde och delprocess. Tabellen visar var den föreslagna verksamhetsutvecklingen möter processernas risker. · Källa: REG, RES

BEDÖMNING OCH REKOMMENDATIONER

13 Hur resultaten bör vägas samman

Prioriteringen blir mer användbar när belopp, riskförlopp, genomförbarhet och erfarenheter prövas tillsammans.

Riskmätningen och intervjuerna ger olika slags kunskap. Mätningen gör det möjligt att ordna risker och jämföra möjliga åtgärdseffekter på ett enhetligt sätt. Intervjuerna beskriver hur företag och andra berörda uppfattar konkreta förlopp, vilka frågor som blir svåra att planera och hur olika arbetssätt fungerar. När båda pekar mot samma mekanism finns ett bättre underlag för att formulera en förbättringsinsats. Samstämmigheten ska dock bedömas med hänsyn till att intervjuerna i vissa fall tog upp tidigare prioriterade risker och därför inte utgör en helt oberoende prövning av rangordningen. [REG, RES, MYN, I03, I04, I05]

Det mest genomgående sambandet gäller hur underlag och tidigare bedömningar följer med mellan processens steg. Otydliga besked kan ge merarbete hos sökanden, medan bristande dokumentation kan göra det svårt för en ny handläggare att förstå vad som redan har utretts. En åtgärd som förbättrar dokumentationen kan därför bidra till flera risker samtidigt. För att detta ska bli en faktisk förbättring behöver arbetssättet även ge utrymme för saklig omprövning när projektet eller omständigheterna ändras. Kontinuitet bör innebära att tidigare arbete kan förstås och användas, med tydliga skäl när en ny bedömning behövs. [REG, RES, MYN, I03, I04, I05]

En andra fråga gäller förhållandet mellan en myndighets prestation och företagets möjlighet att genomföra projektet. En kortare handläggningstid kan ha stort värde, men effekten beror på vilka andra beslut som återstår och när resurser behöver bindas. Intervjuerna beskriver hur tidsfrister som börjar efter en fullständighetsbedömning kan vara svåra att använda för den som inte vet när denna bedömning blir klar. Uppföljningen behöver därför omfatta både den egna handläggningen och relevanta väntetider före och efter den. Det ger en bättre grund för att förstå om en förbättring faktiskt förändrar projektets förutsättningar. [REG, RES, MYN, I03, I04, I05]

De stora modellerade kostnadsbeloppen kräver en särskild tolkning. En hög placering i en medelvärdesbaserad lista kan bero på hög bedömd frekvens, stor händelsekostnad eller mycket bred osäkerhet. Rapportens huvudjämförelse använder därför produkten av medianerna, medan medelvärdena finns kvar för fördjupning och känslighetsanalys. Det minskar de höga utfallens inflytande på prioriteringen utan att dessa källvärden tas bort. Även en medianbaserad indikator kan vara mycket stor eller bygga på en osäker population. Den måste fortfarande

granskas mot ärendevolym, kostnadsslag och tidsperiod; valet av medianer ger i sig ingen empirisk validering. [REG, RES, MYN, I03, I04, I05]

För kontrollerna tillkommer frågan om överlapp. Två åtgärder kan påverka samma risk, och två risker kan beskriva delar av samma ekonomiska förlust. Modellens kombination av kontrolleffekter hanterar det första på den valda logaritmiska skalan, men innehåller ingen skattning av alla praktiska samspel. Den ekonomiska överlappningen mellan riskposter är ännu inte avstämd. Summan av medianbaserade indikatorer används därför för att jämföra samma riskurval före och efter en åtgärd, med tydlig redovisning av täckningen. Den är varken en nationell kostnadsprognos eller en portföljmedian. En budget eller ett investeringsbeslut behöver ett mer avgränsat kostnadsunderlag och en beräkning av genomförandets resurser. [REG, RES, MYN, I03, I04, I05]

Rapportens rekommendationer bygger på denna samlade läsning. Fullständighet, remisshantering, beslutens kvalitet, planering och dokumentation bör prövas som avgränsade arbetssätt där processanalys, ekonomiska jämförelser och erfarenheter från ärenden kan mötas. Åtgärder mot återförvisning och andra sena omtag är också relevanta, men deras plats i genomförandet bör inte avgöras av ett enskilt högt medelvärde. Förslag med svagt eller motsägelsefullt effektunderlag behöver preciseras och granskas innan deras beräknade nytta används. På så sätt kan förbättringsarbetet komma vidare samtidigt som de viktigaste osäkerheterna får en konkret behandling. [REG, RES, MYN, I03, I04, I05]

BEDÖMNING OCH REKOMMENDATIONER

14 Inriktning för prioritering och beredning

Svenskt Näringsliv kan använda riskunderlaget för att driva avgränsade förbättringar och ställa tydligare frågor om deras kostnader och resultat.

Den första rekommendationen är att bereda ett avgränsat urval av åtgärder där processanalysen, intervjuerna och den ekonomiska känslighetsanalysen kan prövas tillsammans. Fullständighetsgranskning, remisshantering, beslutens kvalitetssäkring och tidsplanering är relevanta kandidater. Åtgärder efter återförvisning och för formell beslutshantering bör också undersökas, men deras mycket höga medelvärdesbaserade bidrag ger ännu inte ett tillräckligt stabilt skäl att prioritera dem framför övriga förslag. För varje kandidat bör ansvar, kontrollpunkter och resursåtgång anges, och ett urval av verkliga ärenden användas för att pröva om den beskrivna riskmekanismen går att påverka. [RES, MYN, REG]

Den andra rekommendationen är att utveckla fullständighetsgranskning och hantering av säsongsberoende underlag tillsammans med sökandens förberedelser. Ett gemensamt besked om återstående frågor bör kunna följas till svar, underlagsversion och ansvarig. Vid nya krav bör det framgå varför de tillkommit och vilken påverkan de har på planeringen. Insatsen bör prövas i ärenden där tidsfönster och kompletteringar har tydlig ekonomisk betydelse. Utvärderingen behöver även fånga om mer arbete läggs tidigt i processen, så att en kortare senare handläggning inte automatiskt räknas som en minskning av den totala belastningen. [RES, MYN, REG]

Den tredje rekommendationen gäller planering, kompetens och kontinuitet. En användbar ärendeakt, tydliga prioriteringar och tillgång till rätt specialiststöd bör behandlas som delar av det praktiska arbetet. Det bör gå att se vilka frågor som väntar på bedömning, vilken kompetens som behövs och vilka tidigare ställningstaganden nästa handläggare kan utgå från. Svenskt Näringsliv kan bidra med företagens erfarenheter av när besked blir användbara för planeringen och vilka väntetider som är svåra att förstå. Uppföljningen bör samtidigt ge utrymme för myndighetens förklaring av ärendets komplexitet och av varför ett underlag behöver kompletteras. [RES, MYN, REG]

Den fjärde rekommendationen är att följa projektens viktigaste beroenden fram till möjlig start. För ett avgränsat ärendeurval bör det dokumenteras vilka beslut och godkännanden som återstår, vilket organ som ansvarar och vad som hindrar nästa steg. Åtgärder för gränssnitt och tillståndsmatriser kan då bedömas utifrån om de förbättrar information, planering och faktisk hantering. Detta arbete bör även uppmärksamma risker utanför den nya myndighetens mandat, så att en förbättring inom ett spår inte döljer att projektet fortfarande väntar på ett annat. [RES, MYN, REG]

Den femte rekommendationen är att skilja den nya organisationens övergångsrisker från den långsiktiga effektbedömningen. Pågående ärenden behöver en mottagande ansvarig och en verifierad överföring av dokument, frister och öppna frågor. Åtta av övergångsåtgärdens nio kopplade risker kan ingå i den medianbaserade jämförelsen, men beräkningsunderlaget visar inte alla följder av en bristfällig överföring. Ett genomförande bör därför också motiveras med den konkreta verksamhetsrisk som behöver förebyggas och följas genom stickprov på faktisk användbarhet. Ett begränsat modellbidrag får inte ensamt avgöra betydelsen av att bevara kunskap och ansvar i pågående ärenden. [RES, MYN, REG]

Slutligen bör en särskild sakgranskning genomföras för de stora kostnadsdrivarna och för negativa eller teckenväxlande kontrolleffekter. Granskningen bör börja med händelseenhet och population, fortsätta med kostnadens innehåll och därefter jämföra vad medianer och medelvärden innebär för prioriteringen. För en kontroll bör det även kontrolleras att lägena utan och med åtgärden avser samma risk och jämförbara förutsättningar. Resultatet bör dokumenteras så att ändringar går att förklara och följa över tid. Därmed kan resursbeslut

grundas i flera relevanta delar av underlaget, samtidigt som de mest osäkra beloppens betydelse begränsas. [RES, MYN, REG]

BEDÖMNING OCH REKOMMENDATIONER

15 Uppföljning av genomförande, kostnader och resultat

Faktisk användning av åtgärderna behöver följas tillsammans med hur ärendena utvecklas.

För att bedöma en kontrolls effekt behövs först information om faktisk användning. Det bör framgå i vilka ärenden åtgärden tillämpas, när den börjar gälla och vad tillämpningen konkret innebär. En kontroll som endast finns i en rutinbeskrivning kan annars jämföras med ett referensläge utan att någon faktisk förändring har skett. Genomförandet behöver därför mätas tillsammans med utfallet.

Tabell 4. Föreslagna uppföljningsmått

Mått	Definition	Tolkning och kontroll
Tid till första samlade besked	Dagar från mottagen ansökan till dokumenterat besked om samlade underlagsbehov	Redovisa median och spridning per ärendetyp; kontrollera ändrad ärendemix
Sena tidigare kända behov	Kompletteringskrav efter första beskedet där behovet kunde identifieras vid granskningen	Skilj nya sakförhållanden och projektändringar från missade behov
Kontinuitet vid överlämning	Ärenden med verifierad överlämning av version, avgränsningar, frister och öppna frågor	Följ faktisk användbarhet genom stickprov
Kö och aktiv handläggning	Tid utan aktiv handläggning respektive tid i dokumenterat arbete	Redovisa definition och registreringsgrad
Tid till möjlig projektstart	Tid tills samtliga identifierade förstartsvillkor är uppfyllda	Håll isär tillståndsbeslut, laga kraft och andra nödvändiga villkor
Merkostnad	Dokumenterad omarbetning och förseningskostnad med orsak och period	Undvik samma kostnad i flera riskposter

Om ärenden före och efter införandet jämförs behöver grupperna vara tillräckligt lika. Bransch, ärendets omfattning, tidigare tillstånd, projektändringar och belastning hos handläggande organisation kan påverka utfallet. Där jämförelsen är möjlig bör dessa faktorer dokumenteras. Där jämförelsen är svag bör resultatet redovisas som en beskrivande förändring, med en tydlig begränsning av slutsatsen om orsak.

Kostnaden för en åtgärd bör delas upp i införande, löpande drift och eventuell kostnad hos sökanden. Ett gemensamt handläggarstöd kan exempelvis kräva tid för utveckling och utbildning men spara tid i senare ärenden. En bedömning av nettonytta behöver en uttrycklig tidsperiod och samma kostnadsbegrepp i referens- och åtgärdsscenario. Okända kostnader ska ligga kvar som okända tills ett användbart underlag finns.

När riskbedömningen uppdateras bör förändringar i underlag, antaganden och genomförandestatus redovisas var för sig. En risk kan byta plats därför att dess kostnad blivit bättre belagd, därför att ett problem blivit vanligare eller därför att andra risker har omvärderats. Rapportens text och figurer behöver därför avse samma bedömningstidpunkt. Med denna ordning kan uppföljningen visa vad som förändrats och varför, samtidigt som tidigare bedömningar finns kvar för jämförelse. [RES]

En gemensam monetär Monte Carlo-analys bör övervägas först när en konkret fråga om till exempel budgetrisk eller kostnadsspridning behöver besvaras och underlaget kan bära antagandena. Den kräver en konsekvent händelsemodell, hantering av gemensamma orsaker och överlapp samt kostnadsfördelningar med tydlig betydelse. Tills dess ger de enklare måtten ett mer granskbart beslutsunderlag.

BEDÖMNING OCH REKOMMENDATIONER

16 Slutsatser

Riskbilden ger skäl att prioritera både kvaliteten i enskilda beslut och kontinuiteten genom hela tillståndsprocessen.

Analysen pekar på ekonomiskt betydelsefulla riskförlopp i flera delar av tillståndsprocessen. Sektorsberoenden, vattenverksamhet, prövning och återstående förutsättningar inför start behöver förstås i relation till varandra, eftersom företagets möjligheter påverkas av när samtliga nödvändiga beslut och underlag är klara. Den exakta ordningen mellan riskerna är känslig för hur deras kostnader och osäkerhet sammanfattas. Rapportens huvudjämförelse använder medianbaserade indikatorer, medan medelvärdena visar ett alternativt perspektiv som ibland påverkas starkt av höga utfall. Förutsebarheten behöver även bedömas utifrån vilka krav som är kända, hur ändringar hanteras och när projektets samlade förutsättningar för genomförande kan vara uppfyllda. [REG, RES, MYN]

Myndighetsåtgärderna ger ett konkret underlag för fortsatt arbete. De 17 förslagen i huvudscenariot når 78 risker och har en positiv samlad modellpotential i den del som kan jämföras ekonomiskt. Den inbördes åtgärdsordningen är däremot känslig för riskernas ekonomiska vikter och för vilka risker som har användbara värden. Fullständighetsgranskning, tidig hantering av säsongsbehov, remissarbete, planering och dokumentation har dessutom tydliga samband med de problem som beskrivs i intervjuerna och processkartorna. Förslagen bör därför föras vidare till preciserade arbetssätt och kostnadsbedömningar med flera belägg som grund, snarare än med ett enskilt modellbelopp som avgörande kriterium. [REG, RES, MYN]

Alla risker och kontroller har behållits i underlaget, även där en årsindikator eller effekt inte kan fastställas. De odefinierade värdena och de negativa eller måttkänsliga modellbidragen anger var fortsatt granskning behövs. Stora medianbaserade indikatorer bör också följas tillbaka till antaganden och avgränsningar innan de används i en investeringskalkyl. Genom att kombinera denna granskning med praktisk prövning av åtgärderna kan Svenskt Näringsliv bidra till ett förbättringsarbete där både genomförbarhet och resultat blir möjliga att följa. Den nya

myndighetens etablering ger ett tillfälle att ordna detta arbete tidigt, med tydlig ansvarsfördelning och bevarad kunskap från pågående ärenden. [REG, RES, MYN]

KÄLLOR

17 Referenser och källförteckning

Rapportens analys bygger på process- och riskunderlag, mätresultat, åtgärdsförslag och intervjuer.

Källorna nedan har olika funktion. Process- och riskregistret beskriver möjliga förlopp och deras kopplingar, medan mätningen ger modellbedömningar inom en angiven omfattning. Intervjukällorna används för att förstå erfarenheter och mekanismer och har inte behandlats som ett representativt statistiskt urval. Hänvisningar till offentliga dokument stödjer beskrivningen av den institutionella bakgrunden. Uppgifter som endast återfinns som uppskattningar i en riskbeskrivning redovisas som sådana och har inte uppgraderats till verifierad offentlig statistik.

[REG] Riskregister, processkartor och kontrollregister

Versionslåst underlag för denna utgåva: 342 risker, 378 motåtgärder, 500 unika risk–kontrollpar och 633 riktade kontrollkopplingar. Grundmaterialets rättsliga referenser finns kvar på varje risk och processnod. Baslinjen S0 är daterad 20 augusti 2026; reformscenarier redovisas separat.

[RES] Risk- och åtgärdsbedömning, oktober 2026

Avslutad bedömning av 341 registerrisker. Analysen använder läget utan införda kontroller och bevarar de separata bedömningarna med kontroller som jämförelseunderlag. Källresultat och omfattning är daterade och låsta till denna rapportutgåva.

[CODE] Beräkningsprinciper och reproducerbart analysunderlag

Dokumentation av riskmått, kontrolleffekter, källkontroller och rapportens beräkningar. Tekniska identiteter och kontrollsummor finns i webbplatsens dataunderlag.

https://nic-esp.github.io/miljotillstandsrisker/data/measurement.json

[MYN] Prioriterade myndighetsåtgärder, version 0.10

Tillhandahållna tabeller myndighetskontroller_riskkopplingar.csv och atgardsforslag_bedomning.csv med läsanvisning. Bedömningsdatum 30 september 2026. Innehåller 17 åtgärder i S1, en införandeåtgärd och två förslag som förutsätter framtida mandat. Klassningen beskriver förslagens tillämpning och ska inte likställas med verifierat genomförande.

[RIX] Riksdagen: Ny myndighet för miljöprövning, betänkande 2025/26:MJU24

Miljö- och jordbruksutskottets behandling av proposition 2025/26:238. Underlag för beskrivningen av reformens inriktning och avgränsning. Kontrollerad 22 oktober 2026.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/betankande/ny-myndighet-for-miljoprovning_hd01mju24/html/

[LST] Länsstyrelsen Västra Götaland: Ny myndighet för miljöprövning får kontor i Göteborg

Publicerad 19 augusti 2026. Bekräftar planerad myndighetsstart den 1 juli 2027 och kontor i Stockholm, Göteborg och Umeå. Kontrollerad 22 oktober 2026.

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---vastra-gotaland/2026-08-19-ny-myndighet-for-miljoprovning-far-kontor-i-goteborg.html

[NV24] Naturvårdsverket: Samlad statistik om miljöprövning för år 2024

Historiska antal och handläggningstider för vattenmål, s. 3 och 52. Uppgifterna avser avgjorda mål och mäter inte kostsamma förseningars frekvens eller ekonomiska förlust. Kontrollerad 22 oktober 2026.

https://www.naturvardsverket.se/49e4ea/globalassets/vagledning/miljobalken/miljoprovning/samlad-statistik-om-miljoprovning-for-ar-2024.pdf

Intervjukällor

[I01] Intervjukälla I01 · Offentlig förvaltning och organisationsförändring

[I02] Intervjukälla I02 · Erfarenhet från näringsliv och förvaltning

[I03] Intervjukälla I03 · Industriell projektutveckling

[I04] Intervjukälla I04 · Industri och logistik

[I05] Intervjukälla I05 · Infrastruktur och anläggning

BILAGOR

A Metod och måttens betydelse

Bilagan beskriver hur riskunderlaget har strukturerats, hur bedömningarna har omräknats och vilka slutsatser måtten medger.

Analysen börjar i ett register där varje risk har ett identifierat händelseförlopp och en direkt koppling till en processnod. Orsaker, händelse och konsekvenser redovisas som en bow tie. Kontrollerna kopplas till riskerna och, där underlaget anger detta, till särskilda orsaker eller konsekvenser. Strukturen används för att undersöka likheter, gemensamma åtgärder och processberoenden. En sådan koppling är ett dokumenterat samband i analysunderlaget och innebär inte i sig att ett orsakssamband är statistiskt verifierat. [REG, RES, CODE]

Mätningen bygger på jämförande bedömningar av riskerna och kalibrering mot absoluta referensnivåer. Bradley–Terry–Luce-modellen används för att anpassa en relativ skala till jämförelserna. Den relativa rangordningen anger hur risker förhåller sig till varandra inom bedömningen. För att kunna uttrycka resultaten som händelser per år eller kronor behövs dessutom jämförelser mot angivna frekvens- och kostnadsankare. Endast resultat som har en godkänd absolut kalibrering och en användbar skattning förs vidare till beloppsberäkningen. Kalibrering beskriver hur skalan kopplas till enheterna; den visar inte ensam att bedömningarna stämmer med observerade utfall. [REG, RES, CODE]

Den använda omfattningen avser händelser i svenska prövningsärenden och projekt under ett år. Konsekvensen gäller den enskilda händelsen i ett projekt. Analysen skiljer på bedömningar utan och med kontroller och använder läget utan kontroller som utgångspunkt, eftersom ingen av de föreslagna åtgärderna ännu är införd. Frekvens- och kostnadsbedömningarna är lognormala parameterfördelningar. Median och medelvärde har beräknats analytiskt från de sparade läges- och spridningsparametrarna för detta utgångsläge, vilket bevarar mätningens fördelningsantagande utan en ny simulering. [REG, RES, CODE]

I en lognormal fördelning är medianen $\exp(\mu)$ och medelvärdet $\exp(\mu + \sigma^2/2)$, där μ är läget och σ spridningen på den logaritmiska skalan. Sambandet förklarar varför ett stort medelvärde kan uppkomma även när medianen är betydligt lägre. Rapportens huvudmått är frekvensmedian × median för kostnad per händelse, benämnt medianbaserad årlig kostnadsindikator. Det sammanfattar de centrala nivåerna i två bedömda parametrar. Det är inte medianen av årets faktiska ekonomiska utfall, som också beror på hur många händelser som inträffar och hur kostnaderna varierar mellan händelserna. [REG, RES, CODE]

Som fördjupning bevaras årsmedelvärdet, beräknat som förväntat antal händelser per år × förväntad kostnad per händelse. Den beräkningen använder ett uttryckligt antagande om

oberoende mellan de två parameterbedömningarna. Om hög frekvens samvarierar med större eller mindre händelsekostnad kan produkten av separata medelvärden avvika från den gemensamma förväntan. Detta beroende är inte skattat ur empiriska projektdata. Både medelvärdesberäkningen och den medianbaserade indikatorn kräver en jämförbar händelseenhet, period och ekonomisk avgränsning. Ingen av dem ger ett automatiskt stöd för att summera överlappande risker till en nationell kostnad. [REG, RES, CODE]

Det tillgängliga underlaget innehåller även Monte Carlo-resultat för parameterosäkerhet. Dessa behålls som källresultat och kan användas för att kontrollera och fördjupa tolkningen av bedömningarna. Det finns däremot ingen användbar gemensam monetär årsförlustfördelning som motiverar en redovisning av portföljmedian eller övre förlustkvantiler. Rapporten visar därför inte något sådant diagram. Fler simulerade utfall skulle i sig inte lösa frågor om händelseenhet, ekonomisk dubbelräkning eller osäkerhet i grundbedömningarna. [REG, RES, CODE]

Riskernas årsindikatorer kan summeras för att beskriva ett visst urval, men summan är varken en portföljmedian eller en förväntad nationell kostnad. Två processhinder kan löpa samtidigt och båda beskriva kostnaden för samma förseningsperiod. Ett statistiskt beroende mellan händelserna är en annan fråga än denna ekonomiska dubbelräkning. Rapportens summeringar används därför för att jämföra samma riskposter före och efter ett kontrollurval, med redovisad täckning och beräkningsgrund. En nationell kostnadsbedömning kräver ett projektbaserat underlag där kostnaderna fördelas mellan händelser och perioder. [REG, RES, CODE]

Vid en konflikt mellan modellerad frekvens och historiska antal prövas först om källorna avser samma händelse, ärendetyp, geografi och tidsperiod. Jämförbara dokumenterade händelseantal väger då tyngst vid bedömningen av skala; modellen ska inte åsidosätta dem utan en saklig förklaring. Antal inkomna, avgjorda och pågående ärenden är olika mått, liksom antalet rättsliga avgöranden och antalet projekt som berörs. Om en skillnad beror på ändrad exponering eller population behöver den förändringen beläggas. Uppskattningar i riskbeskrivningar hålls samtidigt åtskilda från observerad historik. De återges med sin egen avgränsning och används som stöd för granskning, utan att en oangiven median eller ett medelvärde skapas. [REG, RES, CODE]

BILAGOR

B Värdegranskning och återvunna beskrivningsuppgifter

Kalibrerade värden används som huvudregel. Ett utelämnat årsbelopp ska kunna förklaras med ett konkret problem i underlaget.

Granskningen omfattar källornas identitet, mätningens omfattning, enheter, kalibrering och kopplingar mellan risker och kontroller. En stor skillnad mellan medelvärde och median innebär inte att risken tas bort. Huvudjämförelsen använder de medianer som kan tillämpas på riskens definierade population och händelsekostnad, medan medelvärdenas kvalitet bedöms separat. En risk kan därför ha en medianbaserad årsindikator trots att dess årsmedelvärde lämnas odefinierat. Konkreta problem med population, exponering eller saknad kalibrering behöver däremot lösas innan någon jämförbar indikator kan användas. [RES, REG]

Granskningen skiljer mellan årsmedelvärden och medianbaserade indikatorer. För medelvärden används särskilda granskningsgränser vid mer än 10 000 händelser per år eller mer än 10 miljarder kronor per händelse. En sådan gräns är ett skäl att granska stöd och exponering, inte ett bevis för att varje värde under gränsen är korrekt. Årsmedelvärde bevaras för 307 risker. Den medianbaserade huvudjämförelsen omfattar 325 risker; för 17 saknas en användbar indikator, varav en ligger utanför mätningen. Skillnaden i täckning beror på att en användbar median kan finnas även när ett medelvärde är alltför extremt för att publiceras. Saknad kalibrering, konkreta populationskonflikter och även mycket höga centralvärden kan däremot hindra huvudmåttet. [RES, REG]

De individuella problemen omfattar bland annat en beskrivning där omprövning av vattenkraft används som numerisk referens för en annan riskpopulation, en beskrivning som blandar prejudikat med antalet berörda projekt samt en frekvens för försenade delegationsärenden som överstiger beskrivningens totala ärendevolym. Den förnyade granskningen identifierade också skillnader mellan medianfrekvens och beskrivning för nya överprövningskedjor, underdimensionerade vattenanmälningar och försenade 12:6-samråd. Exempelvis ger modellen cirka 2 726 nya överprövningskedjor per år där beskrivningen anger cirka 300–500 för samma förlopp. Någon mittpunkt i detta intervall har inte valts som ersättning. Population och skala behöver förenas innan en jämförbar indikator används. För fyra höga kostnadsmedianer kvarstår dessutom en särskilt redovisad skillnad mot beskrivningarnas typiska kostnadsramar; den ska beaktas vid sakgranskning och prioritering. [RES, REG]

De 196 tidigare granskningsmarkerade riskerna har gåtts igenom och kompletterats med två som aktualiserades när utgångsläget ändrades till utan införda kontroller. För 57 av de 198 innehöll mätningens sparade beskrivning ett mer utförligt numeriskt referensavsnitt än webbplatsens grundtext. Genomgången identifierade 40 jämförbara intervall för 32 risker och sju ytterligare intervall som endast ger kontext. Uppgifterna används för att bedöma rimlighet, population och händelseenhet samt för att ge läsaren kompletterande storleksordningar. Ingen beskrivning har gett ett tillräckligt definierat ersättningsmedel för att ett nytt årsmedelvärde ska kunna beräknas från den. Inte heller har någon intervallmittpunkt införts som en påstådd median. [RES, REG]

Figur B1. Resultat av genomgången av 198 riskbeskrivningar



32 risker innehåller jämförbara numeriska intervall. För 166 finns ingen sådan uppgift. Modellvärden kan fortfarande användas där de är kalibrerade och saknar ett särskilt granskningshinder. · Källa: REG, RES

För varje återvunnet intervall dokumenteras den exakta källtexten, enheten, den berörda populationen och en bedömning av hur uppgiften kan användas. Orden typisk kostnad och storleksordning innebär inte att intervallets mittpunkt är ett medelvärde eller en median. Tidsuppgifter, investeringsbelopp och exempel från ett särskilt projekt har heller inte gjorts om till en generell förseningskostnad. Uppgifterna visas som beskrivningsskattningar och deras källreferenser har inte verifierats på nytt som del av denna intervallgenomgång. [RES, REG]

Alla ursprungliga värden finns kvar i källunderlaget. Genomgången skiljer på vad som kan användas som central parameterbedömning, vad som kan användas som medelvärde och vad en beskrivning endast belägger som ett intervall. Om en uppgift senare ändras bör skälet, den nya källan och påverkan på rangordningen dokumenteras tillsammans. Detta gör det möjligt att förbättra analysen utan att en beskrivningsskattning förväxlas med en ny mätning eller med ett observerat utfall. Känslighetsjämförelser bör hålla riskurvalet fast när syftet är att undersöka betydelsen av just måttvalet. [RES, REG]

Källornas ställning i denna granskning beror på vad de faktiskt belägger. Dokumenterade historiska antal för en jämförbar händelsepopulation används som främsta kontroll av frekvensens skala. Därefter prövas om ärendevolym, exponering och period kan förklara en avvikelse. En numerisk uppskattning i en riskbeskrivning har lägre bevisvärde än verifierad statistik men kan ändå påvisa en konflikt som behöver lösas. De återvunna beskrivningsintervallen har inte kontrollerats mot samtliga bakomliggande externa källor. När jämförbarhet eller källstöd fortfarande saknas lämnas indikatorn odefinierad i stället för att

välja ett praktiskt mittvärde. Denna ordning gäller även när ett modellvärde har en godkänd absolut kalibrering. [REG, RES, CODE]

BILAGOR

C Intervjumetod och analysmatris

Intervjuerna används för att förstå förlopp och pröva förbättringsförslag, med öppna begränsningar i urval och återgivning.

Underlaget består av fem dokument och omfattar sex medverkande personer. De representerar offentlig förvaltning, erfarenhet från bransch och förvaltning, industriell projektutveckling, industri och logistik samt infrastruktur och anläggning. Ett dokument sammanfattar ett samtal med två personer. Rapporten räknar därför inte varje dokument som en statistiskt oberoende observation av samma fenomen. [I01, I02, I03, I04, I05]

Dokumenten har lästs i sin helhet och delats in med stabila styckehänvisningar. Analysen har först identifierat beskrivna händelser och förlopp, därefter kopplat dem till teman och slutligen jämfört dem med risk- och kontrollregistret. Skillnaden mellan respondentens uppgift och rapportens tolkning har bevarats. Företagsspecifika uppgifter om tid och handläggning har inte gjorts om till absoluta frekvenser eller kostnader.

Tabell C1. Tematisk analysmatris

Tema	Källstöd	Praktisk tolkning och begränsning
Fullständighet och återkoppling	I03 stycke 8 och 13; I04 stycke 14–15	Tidsprognos behöver omfatta vägen till komplett ansökan. Ärendehistorikerna är inte aktgranskade.
Sena krav och säsongsfönster	I05 stycke 16–17	Tidpunkt för identifiering kan få stor betydelse. Omfattning i hela populationen är okänd.
Kompetens och variation	I02 stycke 9–11; I03 stycke 10; I04 stycke 19–23	Möjligt gemensamt förbättringsområde. Ärendekomplexitet och bemanning kan inte separeras kvantitativt.
Överlämning och kontinuitet	I05 stycke 24 och 62; I01 stycke 9–11	Dokumenterad avgränsning och projektversion bör följa ärendet. Implementerad effekt har inte uppmätts.
Företagets egen förmåga	I04 stycke 21 och 32; I05 stycke 37–40	Förberedelser kan minska omtag men löser inte alla myndighetsberoenden.
Samband med finansiering och start	I03 stycke 35–36; I05 stycke 44–51	Projektets samlade tidplan behövs. Uppgifterna ger ingen generell nät- eller stödregel.
Motexempel och variation	I03 stycke 10 och 22; I04 stycke 13 och 49	Positiva erfarenheter och begränsad förekomst ska påverka tolkningen.

C.1 Frågeställningens påverkan

I04 och I05 presenterar tre tidigare högt rankade risker innan intervjupersonerna kommenterar dem. Detta skapar en risk för styrning av uppmärksamheten. Analysen har därför inte räknat instämmande som en oberoende validering av rangordningen. Särskild vikt har lagts vid nyanseringar, ytterligare förlopp och exempel som avviker från den presenterade listan. [I04, I05]

C.2 Återgivning och citat

De publicerade utdragen är kontrollerade mot dokumentens text och försedda med styckehänvisning. Den redaktionella granskningen innebär inte att anteckningarnas alla sakuppgifter är externt verifierade eller att intervjupersonerna har godkänt rapportens samlade slutsatser. Där en anteckning beskriver ett konkret ärende anges uppgiften som en erfarenhet i materialet. Den används för att förklara ett möjligt förlopp och inte för att tillskriva en namngiven handläggare ansvar.

C.3 Fortsatt datainsamling

Ett nästa steg är att komplettera med ett avgränsat urval av ärendeakter och intervjuer från fler perspektiv, inklusive handläggare och verksamhetsutövare med olika storlek och erfarenhet. Samma händelseförlopp bör då följas från båda sidor och tidsuppgifterna stämmas av mot dokument. Detta skulle göra det möjligt att pröva om beskrivna mönster återkommer och vilka delar som beror på särskilda ärendeförhållanden.

BILAGOR

D Beräkning av kontrollernas bidrag

Kontrolljämförelsen använder samma risker och kostnadsunderlag före och efter ett valt åtgärdsurval.

Kontrollernas effektposter bygger på skillnaden mellan bedömda lägen utan och med kontroller, fördelad mellan de kontroller som är kopplade till risken. Fördelningen görs separat för frekvens och kostnad per händelse. Endast identifierade effekter med rätt risk- och kontrollkoppling används. En saknad effektpost är odefinierad och behandlas inte som noll. Även negativa bidrag bevaras, eftersom de är relevanta för granskning av bedömningens riktning och innehåll. [REG, RES, CODE]

Effekterna är angivna på logaritmisk skala. För ett valt kontrollurval summeras skiftet inom varje risk och dimension, varefter frekvens och händelsekostnad multipliceras med exp(−skiftet). Osäkerhetens bredd hålls konstant. Huvudjämförelsen beräknar sedan förändringen av samma risks medianbaserade årsindikator från utgångsläget utan kontroller. Modellen antar därmed additiva skift på logaritmisk skala och multiplicativa förändringar på ursprunglig skala. Enskilda procenttal eller fristående kronbidrag adderas aldrig direkt. I en separat känslighetsanalys kan samma effektfaktorer tillämpas på medelvärdesbaserade årsbelopp, med oförändrat riskurval. [REG, RES, CODE]

Den kombinerade beräkningen förutsätter att särskilda samspel mellan åtgärder inte tillför ytterligare effekter. I praktiken kan en åtgärd göra en annan möjlig eller minska dess betydelse. Modellen ska därför läsas som en jämförelse under detta antagande, inte som en empiriskt skattad funktion för varje tänkbar kombination. På webbplatsen går det även att se vad en åtgärd tillför när övriga valda åtgärder behålls. Det är skillnaden mellan kombinationen med och utan just den åtgärden, och sådana bidrag ska inte summeras till en total. [REG, RES, CODE]

Kronjämförelsen omfattar endast risker med en användbar medianbaserad årsindikator och ett fullständigt effektunderlag för det valda urvalet. Samma riskmängd används i referens och åtgärdsläge, och täckningen visas bredvid resultatet. En positiv förändring beskriver en modellerad minskning av indikatorernas summa inom detta underlag. Genomförandekostnader saknas för samtliga föreslagna åtgärder, vilket innebär att nettonytta och avkastning lämnas odefinierade. Modellvärden på noll har inte använts som belägg för att en kontroll är kostnadsfri. Skillnader i ekonomisk vikt mellan riskerna kan påverka både kontrollernas ordning och tecknet på ett samlat bidrag. [REG, RES, CODE]

De 500 unika risk–kontrollparen och de 342 direkta processnodkopplingarna har stämts av mellan webbplatsens register och mätunderlaget. Kopplingarna till enskilda bow tie-element är inte helt identiska mellan källorna. Därför används webbplatsens ursprungliga målrelationer för den visuella beskrivningen och mätningens effekter på risk- och kontrollnivå för beräkningen. Resultatet fördelas inte på enskilda orsaker eller konsekvenser som om en sådan detaljeffekt vore uppmätt. En senare analys på den nivån behöver först stämma av målrelationerna. [REG, RES, CODE]

BILAGOR

E Underlag, avgränsning och möjlighet till granskning

Rapport, tabeller och figurer bygger på samma daterade underlag.

Risk- och processmaterialet omfattar 342 risker, sju delprocesser och 378 kontroller. Mätningen slutfördes den 22 oktober 2026 och omfattar 341 risker i ett fastställt urval. De fullständiga källresultaten har bevarats tillsammans med omfattning, indatareferenser och kopplingstabeller. Vid framställningen kontrolleras att varje värde och kontrolleffekt hör till rätt risk och bedömningsomfattning. Ingen ny mätning har startats för denna rapport. [REG, RES, CODE]

Webbplatsens publicerade data ger möjlighet att följa riskernas medelvärden och medianer, huvudrangordningen, beskrivningsuppgifterna och kontrollernas beräknade bidrag. I underlaget finns även de granskade värden som inte används för årsbelopp. Tekniska identiteter och kontrollsummor hålls i datafilerna för reproducerbarhet, medan rapporten använder läsbara källhänvisningar. Mätresultaten från lägena utan och med kontroller hålls åtskilda, så att ett föreslaget scenario inte kan förväxlas med faktiskt genomförande. [REG, RES, CODE]

Intervjumaterialets publicerade utdrag är kopplade till dokument och styckepositioner. De privata originalen och personuppgifter som inte ingår i den godkända publiceringen finns inte i rapportens data. Webbversionen och PDF-utgåvan framställs från samma manus och samma låsta mätunderlag. När någon av dessa delar ändras behöver rapporten byggas och granskas på nytt, så att en senare mätning inte tyst ändrar innebörden av en redan skriven slutsats. [REG, RES, CODE]

REGISTERBILAGOR

F Kostnadstopp 50

Rangordningen utgår från frekvensmedian × kostnadsmedian utan införda kontroller.

Beloppen nedan anges i miljoner kronor per år och beräknas som frekvensmedian × median för kostnad per händelse. De beskriver centrala nivåer i modellens bedömningar av svenska prövningsärenden och används som en kostnadsindikator för prioritering. De är varken observerade årskostnader eller medianer för årets faktiska förlust. En risk utan jämförbar indikator kan vara betydande även om den inte ingår i tabellen. Riskkortens fördjupning visar medelvärden, skillnaden mellan måtten och eventuella granskningshinder. Beloppen ska inte summeras till en nationell kostnad utan att ekonomiska överlapp först har granskats. [REG, RES]

Tabell F1. Rangordning efter medianbaserad årlig kostnadsindikator

Rang och risk	Riskhändelse	Indikator, mnkr/år
1. R-B40-P120-01	Handläggningstiden i vattenmål påverkar projektets tidplan	65 621,3
2. R-B10-080-01	Samordningsmöjligheten missas och prövningarna körs isolerat med motstridiga utfall	41 879,0
3. R-B70-G090-03	Sektorsbeslutet har ännu inte fått laga kraft eller kan inte tas i anspråk	32 117,8
4. R-B50-G900-01	AND-gatens sista spår blir projektets kritiska linje	24 266,6
5. R-B10-060-03	Sektorsspelregler identifieras inte i klassificeringen	15 828,5
6. R-B10-020-03	Försvars- och totalförsvarsintressen stoppar lokaliseringen på politisk nivå	11 817,1
7. R-B50-E040-01	Koncessionsbeslutet överklagas – lång överprövning hos regering eller domstol	10 419,3
8. R-B50-P040-01	Lovansökan krockar med icke lagakraftvunnen plan eller kvarstående överklaganderisker	9 745,7
9. R-B60-090-01	Motstridiga myndighetsyttranden låser beredningen	8 734,2
10. R-B50-T030-01	Vatten-, Natura- och artskyddsbeslut ligger efter planen och blockerar etapper	8 700,3
11. R-B60-250-02	Överprövningens handläggningstid påverkar projektet	8 239,2
12. R-B30-070-01	MKB:n täcker inte den prövning som faktiskt krävs	7 096,3
13. R-B50-E050-01	Ledningsrätt eller markupplåtelseavtal blir inte klart i tid – byggstart blockeras trots koncession	6 948,6
14. R-B50-GN040-01	Kvarstående vetenskapligt tvivel leder till avslag	6 337,1
15. R-B60-G040-01	Kompletteringskraven blir en ändlös pingisrunda	5 813,3

Rang och risk	Riskhändelse	Indikator, mnkr/år
16. R-B50-E010-01	Korridorvalet kolliderar med riksintressen, rennäring eller Natura 2000	5 704,4
17. R-B20-G010-02	Sektorsspår och Natura-kollisioner fångas inte i vägvalet	5 212,9
18. R-B50-T020-02	Planöverklagande och separat byggstartsbeslut skapar två regeringsanknutna steg	5 136,9
19. R-B50-X030-02	Omprojektering för att undvika förbudet urholkar projektets funktion eller ekonomi	4 912,9
20. R-B40-010-02	Tillfälliga arbeten och grundvattenbortledning faller utanför avgränsningen	4 488,7
21. R-B50-P030-03	Planens laga kraft avvaktar inte miljöprövningens – beroendekrock mellan spåren	4 310,9
22. R-B50-GN040-02	Instanserna landar i olika bedömningar av samma bevisning	3 875,1
23. R-B50-P010-02	Felbedömt planbehov: projektet bedöms inte kräva plan – och tvingas ändå till det sent	3 853,6
24. R-B40-060-03	Muddermassor, dumpning och sektorstillstånd staplas i fel ordning	3 747,5
25. R-B50-START-01	Osynliga spår blockerar byggstart trots färdigt huvudtillstånd	3 550,1
26. R-B20-020-02	Lokal opinion mobiliserar och hårdnar under samrådet	3 347,5
27. R-B60-260-01	Uteblivet prövningstillstånd lämnar MMD:s avgörande stående utan sakprövning i MÖD	3 238,3
28. R-B40-START-01	Vattenpåverkan upptäcks för sent i genomförandekonceptet	3 026,4
29. R-B40-G070-01	Fel spår väljs: undantag trots att tillståndsplikt föreligger	2 854,5
30. R-B50-T020-03	Överklaganden av planbeslutet från samebyar, markägare och organisationer	2 694,4
31. R-B40-G020-01	Felklassificering av tillfällig grundvattenbortledning	2 559,3

Rang och risk	Riskhändelse	Indikator, mnkr/år
32. R-B60-070-01	Utebliven eller slarvig tidsplan urholkar handläggningstempot	2 448,5
33. R-B50-X040-01	Dispens- och skyddsbeslut överklagas och gaten skjuts upp	2 388,8
34. R-B50-P020-01	Lokal opinion och samrådsmotstånd förlänger eller omkullkastar planarbetet	2 384,4
35. R-B70-G050-03	Tillståndshavarens ekonomiska svikt underminerar säkerhets- och garantistrukturen	2 329,1
36. R-B50-G010-01	Ofullständig tillämpbarhetsmatris lämnar obligatoriska spår utanför	2 319,1
37. R-B50-E020-01	Ansökan bedöms som ofullständig och måste kompletteras innan sakprövningen går vidare	2 307,5
38. R-B60-170-01	MKB:n godkänns inte – återförvisning eller avslag i stället för villkor	2 306,5
39. R-B50-P050-01	Överklagandekedjan länsstyrelse–MMD–MÖD stoppar byggstart	2 198,4
40. R-B70-END-01	Byggberedskapen urholkas av att tillståndet aldrig tas i anspråk innan fristens utgång	1 923,7
41. R-B20-010-02	Säsongsberoende basdata hinner inte samlas in	1 866,3
42. R-B50-P050-03	Kompetens- och kapacitetsbrist i byggnadsnämnd förlänger tio-veckorsfristen	1 845,6
43. R-B60-180-01	Natura 2000- eller artskyddskraven kan inte uppfyllas	1 831,1
44. R-B50-P010-01	Kommunens planmonopol: ovilja eller köstopp stoppar projektet i förhand	1 699,8
45. R-B60-180-03	Säkerhets- och efterbehandlingsfrågor underblåser oenighet om vem som bär risken	1 639,1
46. R-B50-M030-02	Koncessionsbeslut angrips genom överklagande eller rättsprövning	1 603,6

Rang och risk	Riskhändelse	Indikator, mnkr/år
47. R-B70-100-01	Återöppnat B50-spår fastnar i kommunens eller sektorsmyndighetens handläggningskö	1 555,6
48. R-B50-P030-01	Antagen detaljplan överklagas och laga kraft skjuts upp	1 527,1
49. R-B40-P100-01	B20:s miljöunderlag är föråldrat eller fel avgränsat för vattenfrågorna	1 522,2
50. R-B40-030-01	Hydrologiskt och hydrogeologiskt underlag håller inte domstolsmått	1 493,2

REGISTERBILAGOR

G Myndighetsåtgärder och ekonomiskt jämförelseunderlag

Alla åtgärder är förslag. Täckning och beräknat bidrag behöver läsas tillsammans med mandat och genomförandekostnad.

Tabellen visar den fristående procentuella minskningen av medianbaserade årsindikatorer inom respektive åtgärds jämförbara riskunderlag. Olika rader avser olika risker och kan därför inte jämföras som om de hade samma ekonomiska bas. Huvudscenario, organisationsövergång och framtida mandat redovisas separat i kontrollregistret. Genomförandekostnader saknas och ingen nettonytta har beräknats. Åtgärdernas detaljsidor innehåller tillämpning, ansvar och de risker som ligger bakom resultatet. Ett stort bidrag behöver granskas mot vilka enskilda riskposter som står för det. [MYN, RES]

Tabell G1. Myndighetsåtgärder, täckning och fristående effekt

Åtgärd	Jämförbara risker / alla	Indikatorminskning	I topp 50
MPM-01 · Dokumenterad och avgränsad processvägledning	11 / 11	13,4 %	0
MPM-02 · Tidig kontroll av behörighet och prövningsram	10 / 10	46,2 %	0
MPM-03 · Samordnad handläggning när sambandsregeln medger det	2 / 2	47,0 %	1
MPM-04 · Överenskomna gränssnitt med andra beslutsorgan	3 / 3	37,3 %	0
MPM-05 · Samlad och preciserad fullständighetsgranskning	7 / 8	14,3 %	1
MPM-06 · Tidig identifiering av säsongsberoende underlagsbehov	1 / 1	33,1 %	0
MPM-07 · Aktiv tidsplanering och bevakning av egen handläggning	3 / 3	32,8 %	1
MPM-08 · Gemensam kapacitets- och specialistfördelning	2 / 3	3,6 %	1
MPM-09 · Strukturerad remiss och kommunicering	5 / 5	22,4 %	1
MPM-10 · Spårbar ärendeakt och versionskontroll	6 / 6	0,5 %	1

Åtgärd	Jämförbara risker / alla	Indikatorminskning	I topp 50
MPM-11 · Juridisk och teknisk kvalitetssäkring av egna beslut	5 / 6	34,4 %	2
MPM-12 · Entydiga och inbördes förenliga tillståndsvillkor	6 / 6	28,7 %	0
MPM-13 · Kontrollerad kungörelse, delgivning och överklagandeinformation	8 / 8	12,6 %	0
MPM-14 · Komplett överlämnande och kompetent myndighetsmotpart	2 / 2	51,8 %	0
MPM-15 · Samlad prövning av säkerhet och andra egna förstartsgodkännanden	3 / 3	11,8 %	0
MPM-16 · Riktad hantering efter återförvisning	2 / 2	32,8 %	0
MPM-17 · Tidig jävs- och behörighetskontroll för egen bemanning	1 / 1	-30,9 %	0
MPM-F01 · Samlad myndighetsledning av BMP och MKB-avgränsning	4 / 4	1,8 %	0
MPM-F02 · Gemensam kontaktpunkt för flera tillståndsspår	2 / 2	1,3 %	0
MPM-T01 · Verifierad överföring vid myndighetsstart	8 / 9	2,5 %	0

REGISTERBILAGOR

H Risker utan jämförbar årlig kostnadsindikator

Listan visar vad som återstår för att en medianbaserad årsindikator ska kunna redovisas.

De 17 riskerna nedan saknar en jämförbar medianbaserad årsindikator. Sexton finns i mätningen, medan en ligger utanför dess riskurval. Orsakerna omfattar saknad användbar kalibrering, mycket höga medianer och dokumenterade problem med population eller exponering. Tillgängliga delmått och uttryckliga intervall från beskrivningarna kan fortfarande ge relevant information och finns på riskkorten. Inga saknade belopp har ersatts med noll. Årsmedelvärden har en separat granskning och täckning: 35 registerrisker saknar sådant årsbelopp, vilket inte ska förväxlas med listan över de 17 riskerna utan huvudindikator. [REG, RES]

Tabell H1. Risker utan jämförbar medianbaserad årsindikator

Risk	Händelse	Vad som saknas
R-B10-090-02	Företagsspecifik data smyger in i det generiska typfallet	Kalibrerad kostnadsfördelning saknas eller har endast ett gränsvärde.
R-B30-G110-03	Miljöprövningsdelegationens handläggningstid överskrider projektplanen	Modellens över 1 300 försenade MPD-ärenden per år överstiger beskrivningens totala ärendevolym på cirka 260–330. Jämförbar population och skillnaden mellan inflöde, avgjorda och pågående ärenden behöver klargöras.
R-B30-O100-02	Reformdriven omprövningsplikt träffar äldre tillstånd	Beskrivningens numeriska underlag avser vattenkraftens omprövning. Risken gäller reformdriven omprövningsplikt för miljöfarlig verksamhet, för vilken beskrivningen inte anger en tillämplig bindande ordning. Jämförbar händelsefrekvens saknas för denna riskpopulation.
R-B40-GE120-02	12:6-samrådet kan pågå längre än sexveckorsspärren	Modellens median är cirka 3 553 försenade 12:6-samråd per år, medan den frysta riskbeskrivningen anger storleksordningen hundratals sådana förseningshändelser. Detta är en skillnad i storleksordning som behöver klarläggas, inte ett statistiskt bevis på ett visst sant årsantal. Kostnadsindikatorn hålls odefinierad tills händelsepopulation och skala kan förenas. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.
R-B40-GN170-02	Underrättelse om 'ingen åtgärd' ger falsk trygghet	Risken ingår inte i körningens frysta urval. Kalibrerad kostnadsfördelning saknas eller har endast ett gränsvärde.

Risk	Händelse	Vad som saknas
R-B40-N110-01	Anmälningsunderlaget underdimensioneras i tron att 'det är bara en anmälan'	Modellens median är cirka 1 133 händelser per år, medan den frysta riskbeskrivningen bedömer 100–250 underdimensionerade vattenanmälningar som förskjuter starten per år. Samma händelse har därmed väsentligt olika frekvens i underlagen. Population och skala behöver klarläggas innan kostnadsindikatorn används; beskrivningsintervallet behålls utan vald mittpunkt. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.
R-B50-M020-02	Kompletteringsbehov fördröjer koncessionsärendets sakprövning	Medianen för bedömd händelsekostnad överstiger 10 miljarder kronor. Kostnadens omfattning och jämförbarhet behöver särskilt beläggas.
R-B50-M030-01	Hänskjutande till regeringen lägger till ett prövningsled med osäker tidsplan	Medianen för bedömd händelsekostnad överstiger 10 miljarder kronor. Kostnadens omfattning och jämförbarhet behöver särskilt beläggas. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.
R-B50-M040-01	Koncessionen räcker inte – miljötillståndet blir den verkliga flaskhalsen	Medianen för bedömd händelsekostnad överstiger 10 miljarder kronor. Kostnadens omfattning och jämförbarhet behöver särskilt beläggas.
R-B50-N050-02	Undantagsvägen i 29 § är politisk och oförutsägbar	Medianen för bedömd händelsekostnad överstiger 10 miljarder kronor. Kostnadens omfattning och jämförbarhet behöver särskilt beläggas. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.
R-B60-030-01	MKB-brister stjälper fullständighetsbedömningen	Frekvensmedianen överstiger 10 000 händelser per år. Jämförbar ärendevolym och exponeringsskala behöver särskilt beläggas.
R-B60-160-01	Regeringsprövningen är ett separat beslutssteg utan lagstadgad handläggningsfrist	Medianen för bedömd händelsekostnad överstiger 10 miljarder kronor. Kostnadens omfattning och jämförbarhet behöver särskilt beläggas. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.

Risk	Händelse	Vad som saknas
R-B60-160-03	Rättsprövning skapar fortsatt processrisk utan automatisk inhibition	Medianen för bedömd händelsekostnad överstiger 10 miljarder kronor. Kostnadens omfattning och jämförbarhet behöver särskilt beläggas.
R-B60-270-02	Prejudicerande avgörande flyttar rättsläget för hela branschen	Källtexten blandar antalet prejudicerande avgöranden med antalet berörda projekt och anger 1–10 per år utan entydig population. Modellens över 450 händelser per år kan inte förenas med denna beskrivningsram innan händelseenheten klargörs.
R-B60-G150-01	Sent förbehåll från regeringen kastar om hela beslutskedjan	Medianen för bedömd händelsekostnad överstiger 10 miljarder kronor. Kostnadens omfattning och jämförbarhet behöver särskilt beläggas. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.
R-B60-G210-01	Ett överklagande startar en separat överprövningskedja	Modellens median är cirka 2 726 nya överprövningskedjor per år, medan den frysta riskbeskrivningen anger cirka 300–500 per år för samma händelse inom miljöbalken, PBL och sektorskoncessioner. Skillnaden i händelsepopulation och skala behöver klarläggas innan ett kostnadsbelopp används. Beskrivningens intervall behålls separat utan vald mittpunkt. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.
R-B60-G230-02	S1-reformen ändrar instanskartan mitt i processen	Absolut frekvens saknas eller har endast ett gränsvärde. Beskrivningen innehåller ett separat intervall.
